



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

20 ก.ย. 67

เลขที่ ก.ต.สค.(ปน) ๕๓๖๕ / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณพิศล
ชื่อผู้ส่ง นายวิโรจน์ เอกอำไพ

วันที่ ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(กต)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ศค.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ KV รองรับการจ่ายไฟให้กับ บริษัทพีริเซิร์ฟ บริเวณปากทางซอยพีริเซิร์ฟ ถึง บริษัท พีริเซิร์ฟ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMC๐๗	๒๒ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ KV รองรับการจ่ายไฟให้กับ บริษัทพีริเซิร์ฟ บริเวณปากทางซอยพีริเซิร์ฟ ถึง บริษัท พีริเซิร์ฟ	จุดปลตสายโดยวิธีฮอทไลน์ กระจายเข้าปากทางเข้าพีริเซิร์ฟ	EKA๐๘S-๑๑ กลางซอยพีริเซิร์ฟ	นายวันชัย ทรัพย์มาก โทร. ๐๙๘๑๔๖๔๕๕๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณตั้งแต่ปากทางซอยพีริเซิร์ฟถึงกลางซอยพีริเซิร์ฟ

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๒ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๙๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายวิโรจน์ เอกอำไพ)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.ศค.


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMC7 จาก DDE ชกทวช. หนึ่ง ถึง EKARS-11
ในวันที่ 22 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1365/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นางสาวนันทิยา พงษ์ศิริ ประธานงานการขอดับไฟกับ พจลวิวัฒน์ ขณนธอม


 (นางสาวนันทิยา พงษ์ศิริ)
 สก.๕ ทททช.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ สค.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจพ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



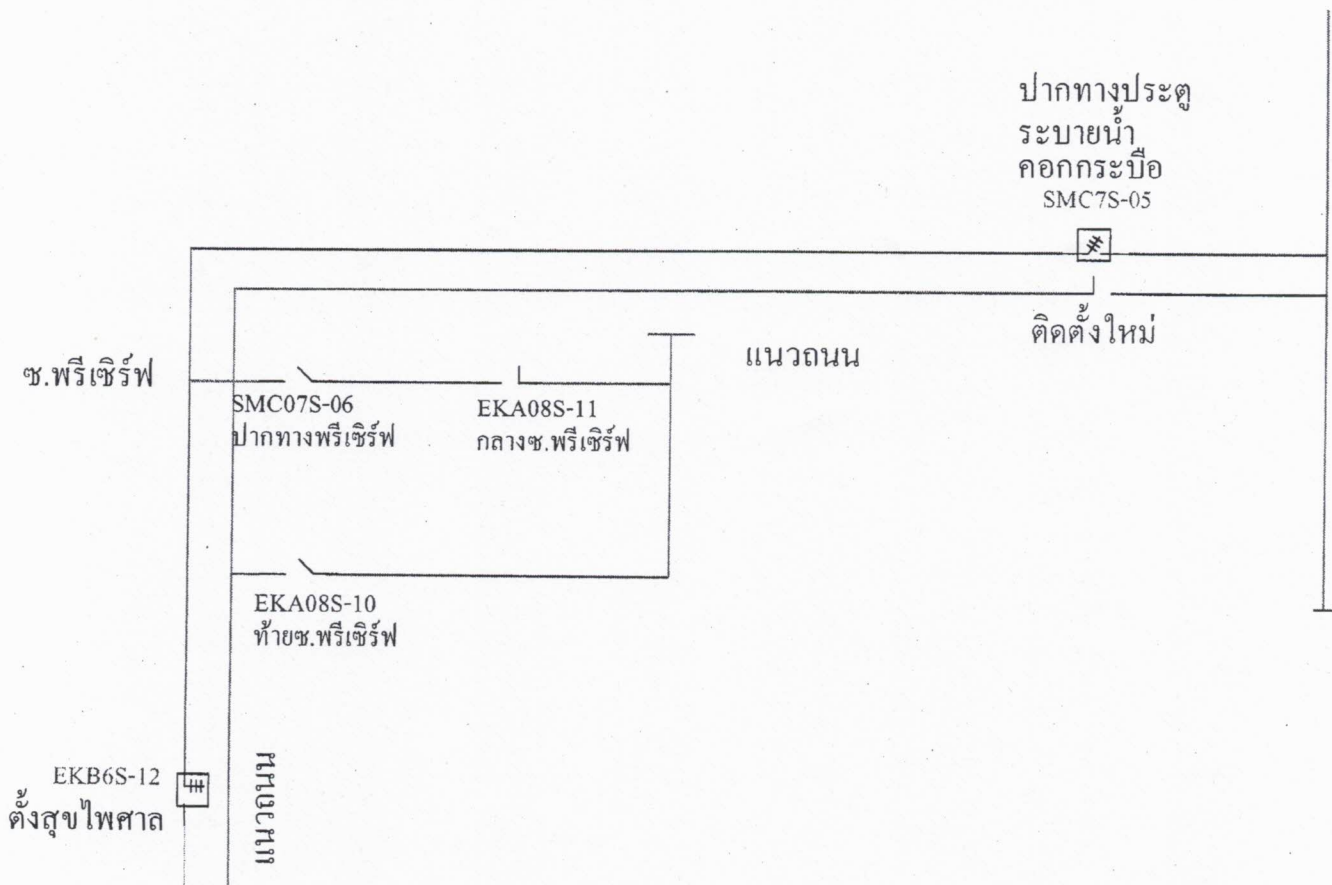
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ซอยบริษัทพีริเซิร์ฟ (SMC07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 67	เวลา	08.00 น.	ถึง เวลา	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สค.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1365/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ			วันที่	17 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมโนช 3. นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิริวัชร,นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		-
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
4	SMC07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		สค.		- ปากซอย บ.พีริเซิร์ฟ
5	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการปลดสายบริเวณปากทางเข้าบ.พีริเซิร์ฟ (ไม่มีโหดผู้ใช้ไฟ)						
6	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการปลดสายบริเวณปากทางเข้าบ.พีริเซิร์ฟแล้ว						
7	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.สค. รับทราบ						
8	แจ้งให้เทสไฟและช็อตกราวด์ 22kV จุด G1,G2 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
9	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
10	เมื่อ กฟส.สค. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
11	แจ้งให้ปลดช็อตกราวด์ G1,G2						
12	SMCBR-07	Normal	Nonreclosing		SMC		-
13	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
14	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อมสายบริเวณปากทางเข้าบ.พีริเซิร์ฟ						
15	เมื่อชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อมสายบริเวณปากทางเข้าบ.พีริเซิร์ฟแล้ว						
16	SMC07S-06	ปลด	สับ		สค.		- ปากซอย บ.พีริเซิร์ฟ
17	SMCBR-07	Nonreclosing	Normal		SMC		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

