



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .ก.๓.สข.(กป.) ๕๕๕/๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายพุดชงค์ ภาทลง

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย ทิศเตอร์ ๔
สถานีไฟฟ้า เต็มวงจร ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ทิศเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๔	๒๖ ส.ค., ๑๖.ย. ๒๕๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณ Dis บ้านดงโมก ถึง Dis ช.ค.หนองสังข์ทอง	Dis บ้านดง โมก ถึง Dis ช.ค. หนองสังข์ ทอง	Dis ช.ค. หนองสังข์ ทอง	นายรินทร์ คำภีภาค ๐๙๒-๒๕๕๔๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๖ เครื่อง ๑๔๓ เควีเอ ผู้ใช้ไฟประมาณ ๑๐๓ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ช.ก.ป. โทร ๐๘๖-๗๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

นายพุดชงค์ ภาทลง
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ทิศเตอร์ DBA๐๔ จาก Dis บ้านดงโมก ถึง Dis ช.ค. หนองสังข์
ในวันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1367/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ ทิศเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนรรักษ์ อรณพรมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทบ.เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

นายอนรรักษ์ อรณพรมย์
ตำแหน่ง พนักงานศูนย์ฯ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(ศคฟ.)
เรียน ผจก. กฟส.อ.๑๖, กฟส.๐๑.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	โลน DBA04 บริเวณ DIS.ชค.วัดหนองสังข์ทอง - DIS.ชค.อู๋เวีเชียร					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสาพาดสายแรงสูงใหม่		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1367/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	17 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	17 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายจณิต, นายมนโฆ				(กะ 1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ 2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ 3 16.00 น. - 24.00 น.)	


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
4	DBA04R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.	R	หนองสังข์ทอง
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
6	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	สะพานดำ
7	DOA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	หนองหลอด
8	- ย้ายโหลดวงจร DBA04 ไปรับไฟจาก DOA02						
9	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.	SF6	บ้านลาดสิงห์
10	DBA04S-30	ปลด	สับ		สช.	DIS	บ้านดงโบก
11	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	อู๋เวีเชียร
12	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.	SF6	บ้านลาดสิงห์
13	- ดับไฟเวลา 08.30 น.						
14	DIS ชค. DBA04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	วัดหนองสังข์ทอง
15	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.สามชุกรับทราบ						
15	แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G1						
15	แจ้งกฟส.สามชุกทำการ Test ไฟดับแล้ว Short Ground จุด G2						
18	แจ้งกฟส.สามชุกลง We Safe						
19	แจ้งกฟส.สามชุกปฏิบัติงานได้						
20	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
21	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สช.	R	บ้านลาดสิงห์
22	DBA04R-05	Nonreclosing	Normal		สช.	R	หนองสังข์ทอง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
23	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
24	DOA03R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
25	DOA07R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R หนองหลอด
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
26	หลังจากกฟส.สามชุกปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
27	แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
28	แจ้งกฟส.สามชุกทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
29	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตซ์						
30	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
31	DBA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R บ้านลาดสิงห์
32	DBA04R-05	Normal	Nonreclosing, ALT		สช.		R หนองสังข์ทอง
33	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
34	DOA03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R สะพานดำ
35	DOA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R หนองหลอด
36	- จ่ายไฟ						
37	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS วัดหนองสังข์ทอง
38	- ย้ายโหลด DBA04 กลับคืนจาก DOA2						
39	DBA03S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
40	DIS ชค. DBA04	ปลด	สับ		สช.		DIS อู๊วเขียว
41	DBA04S-30	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านดงโปก
42	DBA03S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สช.		SF6 บ้านลาดสิงห์
43	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
44	DBA03R-02	Nonreclosing	Normal		สช.		R บ้านลาดสิงห์
45	DBA04R-05	Nonreclosing	Normal		สช.		R หนองสังข์ทอง
46	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KCC		
47	DOA03R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R สะพานดำ
48	DOA07R-01	Nonreclosing	Normal		ดจ.		R หนองหลอด
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ปฏิบัติงานเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่ายวันที่ 26 สิงหาคม, 1 กันยายน 2565

ฟาร์มไก่

ช่าง ร.ร. หมองสังข์ทอง

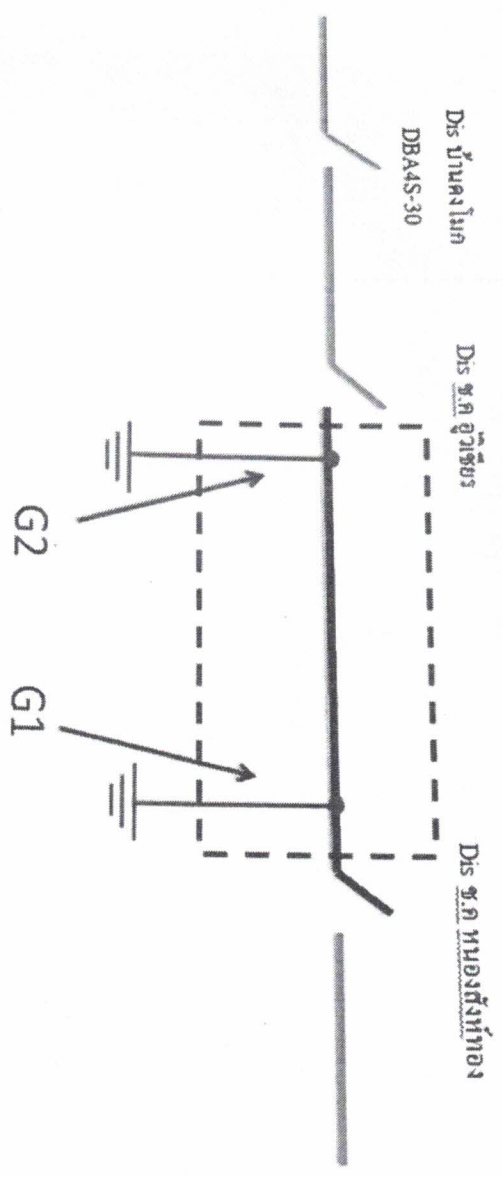

จุดปฏิบัติงาน

- G1 ข้อคกราวด์ โดยชุดแม่ไก่
- G2 ข้อคกราวด์ โดยชุดซ่อมย่อย
- นาย ธีรพงษ์ เข้มเพชร
- นาย กุณย์ ทิมหอม
- ควบคุมงาน
- ควบคุมงาน
