



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

26 ก.ย. 2567

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๙๑/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสุกี

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.ปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้า
ร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ) จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๗๑ สถานีไฟฟ้า กระทบแบน ๕ ตาม
แผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๒ KTE ๐๗	๒๙ ก.ย. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.ปบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ถนน สค. ๓๐๑๑ (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)	หน้าร้าน ขายของ เก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ)	อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTE๐๒S-๐๕ (วงจร KTE๐๗), เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสา สายส่ง SD-SA๒ หมายเลข ๒๗๑ (วงจร KTE๐๒)	นายกฤษณะ ชนะภัย พงษ.๖ ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร. ๐๙๘ - ๘๓๑๕๒๗๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านชาใจ) จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-
SA๒ หมายเลข ๒๗๑ มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๒๒ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายณพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ผ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๓๖๘๔๕, ๑๐๐.๒๒๔๔๗๐
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๓๔๑๙๔, ๑๐๐.๒๑๗๖๕๓

(นายมานิช วาสุกี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๑๘ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเดอร์ KTE ๒ จาก KTE๒S-06 ถึง DIS ซด ๗๕๗๖๗ ๗๕๐ บริเวณหน้า
ในวันที่ ๒๙ ก.ย. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1379/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | พิดเดอร์ KTE ๗ จาก DDE ๗๕๕๐๑๑ แก่ ถึง KTE๒S-05
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายณพพร ชาวไชยศรี
21 ก.ย. ๖๗

(นายมานิช วาสุกี)
๓๓.๗ ปฏิบัติงานแทน ผ.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพ.ร. นพ.ช.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น


ผจพ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ก.ย. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1379/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	21 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				1. นายพีรภัทร, น.ส.สุกัซชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
3	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
4	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
5	ย้ายโหลด KTE02 บางส่วนไปรับไฟจาก KTE03						
6	KTE02S-16	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 แสนร์กรีส์อร์ท
7	DIS. ชค. โลจน์ KTE02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชค. ตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
8	เมื่อพร้อมดับไฟ						
9	KTE02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS คริวสมัยเก่า (วงจรถ่วง)
10	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณ คริวสมัยเก่า (วงจรถวน) (ตามแผนผัง) ออก.						
11	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE วงจร KTE07 บริเวณ คริวสมัยเก่า (วงจรถวน) (ตามแผนผัง) ออก เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G3						
16	หลังจากผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
17	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
18	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
19	KTE07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
21	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
24	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
25	หลังจากทำการปลด Short Ground ออก ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
26	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
27	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
28	KTE07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนดับไฟ บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
ตั้งแต่ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านซำใจ) จนถึง ฝั่งตรงข้าม ตรอ.เจริญทรัพย์
เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภ.ส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ หน้าร้านขายของเก่าญี่ปุ่น (ร้านซำใจ)

จนถึง เสาต้น DDE ฝั่งตรงข้ามเสาสายส่ง SD-SA2 หมายเลข 271

วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 29 ก.ย. 2567 เวลา 8.30 – 17.00 น.

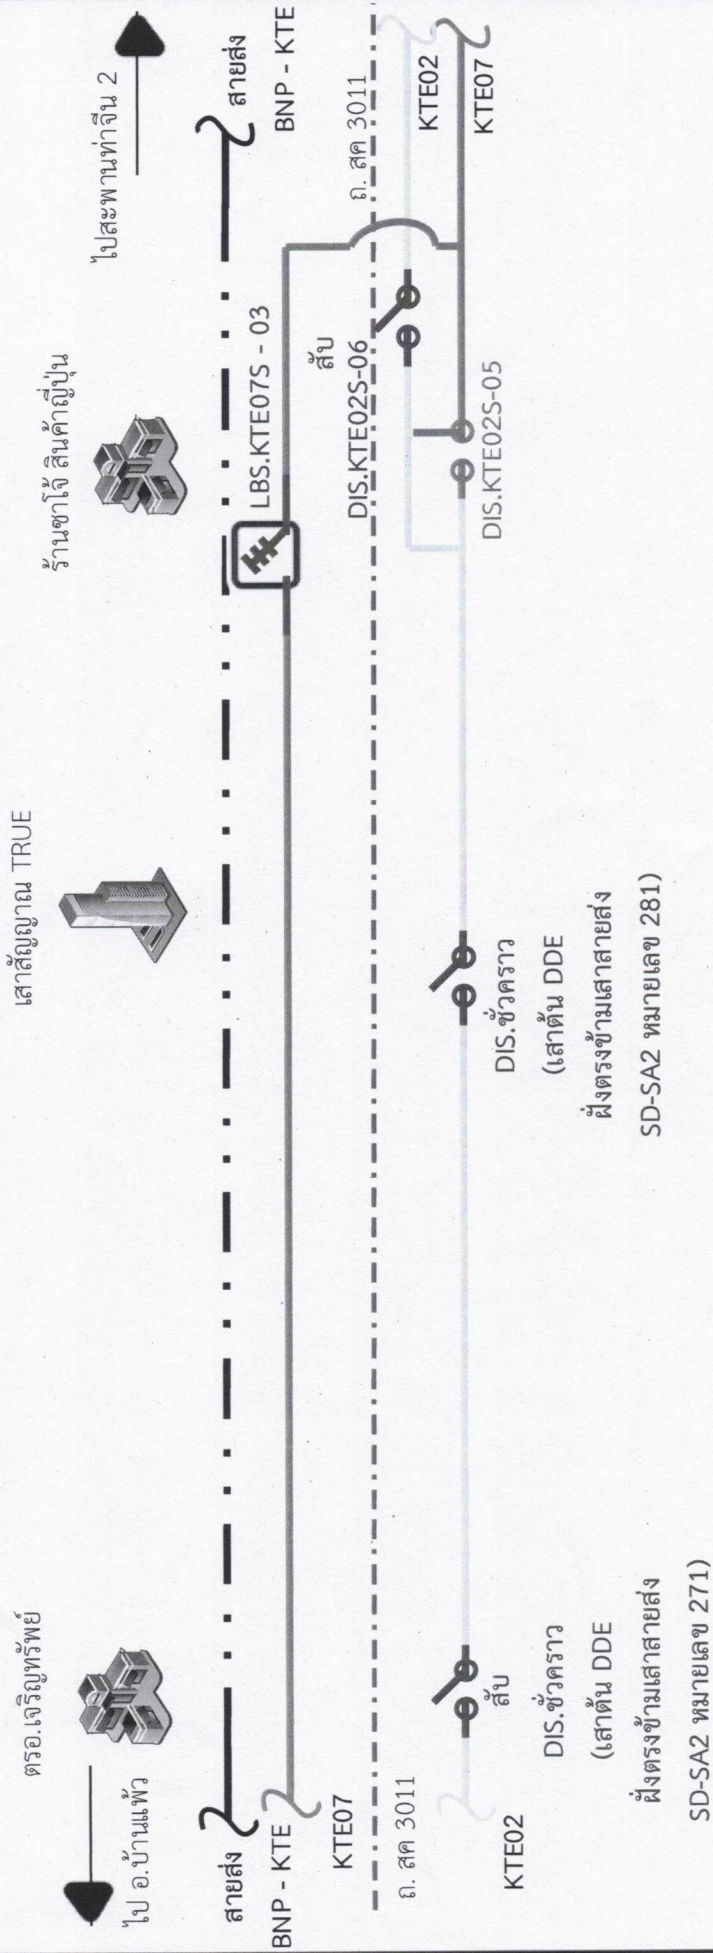

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการดับไฟ ประมาณ 22 ราย

