



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

22 ก.ย. 66

เลขที่ ก.ต.กบข.(ตน.) ๓๕๘๐ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง ที่สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 6 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115 kV	24 ก.ย. 2566	08.30 น.	16.30 น.	เปลี่ยนแฉลัมป์ยึดสาย 115kV Underground Cable ที่ชำรุดผุพัง	BPB 70412A	BPB 8YB-01	นายอดิศักดิ์ ทองโชนง ช.พ.บ.ก.บ.ส.
๒		25 ก.ย. 2566				BPB 1YB-01	BPB 1YS-05	
๓		26 ก.ย. 2566				BPB 3YB-01	BPB 3YS-04	
๔		27 ก.ย. 2566				BPB 5YB-01	BPB 5YS-04	
๕		28 ก.ย. 2566				BPB 7YB-01	NPV 4YB-01	
๖	1 ต.ค. 2566				BPB 70122A	BPB 2YB-01		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรพงษ์ ลิ้มเจริญ ตำแหน่ง ช.พ.ตบ.กบข.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย

(นายสมหมาย ชื่นด้วง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 พิดเตอร์ 115kV จาก BPB 5YB-01 ถึง BPB 5YS-04
ในวันที่ 27 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1381/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีเกียรติ

ประสานงานการขอตัดไฟกับ Le - อ.รพ.อช. ลิ้มเจริญ

อ.ก.บข.
(นายอดิศักดิ์ ทองโชนง)
๐๘๑-๑๕๔-๓๔๓๗

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. - อ.ก.บข.

อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ๕๓๐๒๐๒ (BPB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐8:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)




ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านโป่ง2 (UnderGround Cable BPB05YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ก.ย. 2566	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	แคล้มป์ยึดสาย UnderGround Cable		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1381/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	15 กันยายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	15 กันยายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่		
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนิช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		CB เบรกเกอร์ 115 kV
3	PTS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 kV
4	01BPC01-01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		01BPC01		CB เบรกเกอร์ 115 kV
5	แจ้งบริษัท เบิกไพรโครเจนเนอเรชั่น ทำการ OFF INTERTRIP และหยุดขนาน						
6	ตรวจสอบเบรกเกอร์ PTS01YB-01 จ่ายไฟปกติ (กฟต.1)						
7	ตรวจสอบใบมีด NOM01YS-01,02 อยู่สถานะ "สับ"						
8	เมื่อบริษัท เบิกไพรโครเจนเนอเรชั่น ทำการ OFF INTERTRIP และหยุดขนานเรียบร้อย						
9	ตรวจสอบสายส่ง 115kV BPB05YB-01 สถานะการจ่ายไฟอยู่ในสถานะปกติ						
10	ย้ายโหลด NOM ,TMV ,บริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ ,บริษัท เบิกไพรโครเจนเนอเรชั่น ไปรับไฟจาก PTS01YB-01						
11	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 kV
12	ตรวจสอบสถานะ Low Gas LBS115kV แยกไฟแดงเบิกไพร BPB05YS-04 อยู่สถานะ "ปกติ"						
13	BPB05YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		บปง.		LBS แยกไฟแดงเบิกไพร
14	ตรวจสอบ LBS115kV ตอนกระเบื้อง PTR03YS-06 อยู่สถานะ "ปลด+ล็อคกุญแจ"						
15	เมื่อพร้อมดับไฟ 08.00น.						
16	BPB05YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 kV
17	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 kV
18	BPB05YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมีด 115 kV
19	แจ้งพนักงานสถานี ตรวจสอบไฟย้อนที่ BPB05YB-01 หากไม่พบไฟย้อน						
20	BPB05YG-01	ปลด	สับ		BPB		- กราวด์ 115 kV
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กบข. รับทราบ						
22	แจ้งชุด กบข. Test ไฟย้อนในจุดที่จะปฏิบัติงาน หากไม่พบไฟย้อน ให้ดำเนินการลงข้อมูลใน Wesafe						
23	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้						
24	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 kV
25	PTS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 kV
26	01BPC01-01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		01BPC01		CB เบรกเกอร์ 115 kV
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
27	เมื่อกบข. ทำงานแล้วเสร็จ และยืนยันข้อมูลใน We Safe เรียบร้อย						
28	แจ้ง กบข. ทำการปลดช็อคกราวด์ออกทุกจุด						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อ กบข. ทำการปลดช้อตกราวด์ออกทุกจุด พร้อมย้ายโหลดกลับสภาพปกติ						
30	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 kV
31	PTS01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 kV
32	01BPC01-01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		01BPC01		CB เบรกเกอร์ 115 kV
33	BPB05YG-01	ปลด	ปลด		BPB		- กราวด์ 115 kV
34	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
35	BPB05YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 kV
36	BPB05YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 kV
37	BPB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 kV
38	ย้ายโหลด NOM ,TMV ,บริษัทแอดวานซ์ไฟเบอร์ ,บริษัท เบิกไพรโครเจนเนอเรชั่น กลับจาก PTS01YB-01						
39	BPB05YS-04	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		บปง.		LBS แยกไฟแดงเบิกไพร
40	NOM01YB-01	ปลด	ปลด		NOM		CB เบรกเกอร์ 115 kV
41	BPB05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		CB เบรกเกอร์ 115 kV
42	PTS01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTS		CB เบรกเกอร์ 115 kV
43	01BPC01-01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		01BPC01		CB เบรกเกอร์ 115 kV
44	แจ้งบริษัท เบิกไพรโครเจนเนอเรชั่น ทำการ ON INTERTRIP และทำการขนานไฟได้						
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

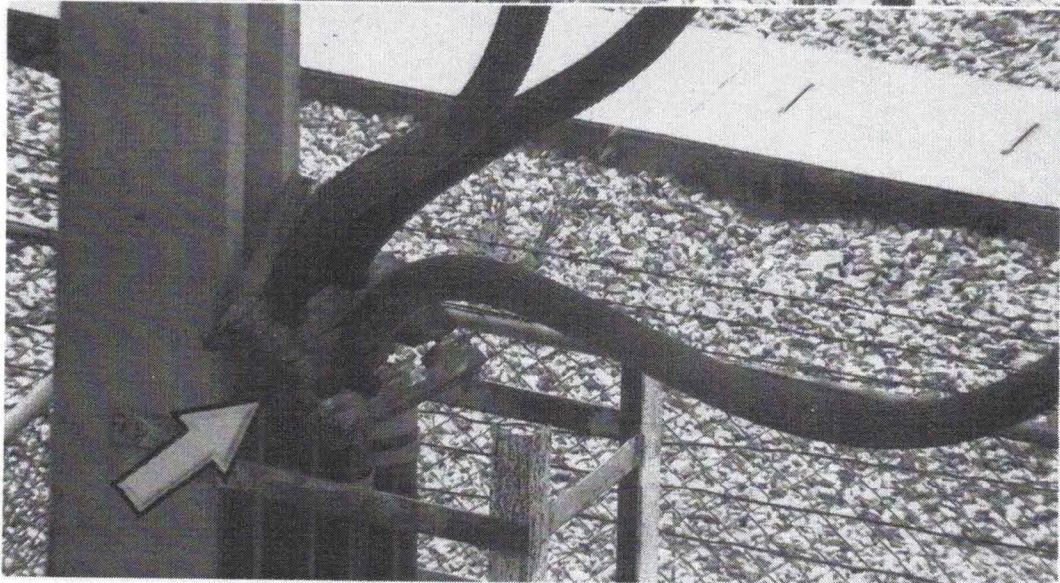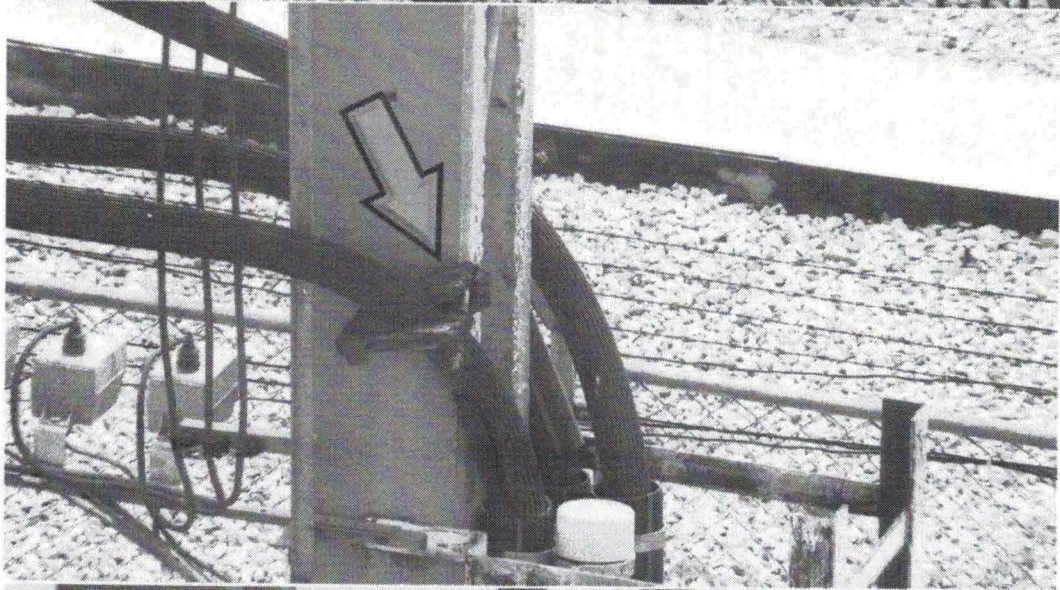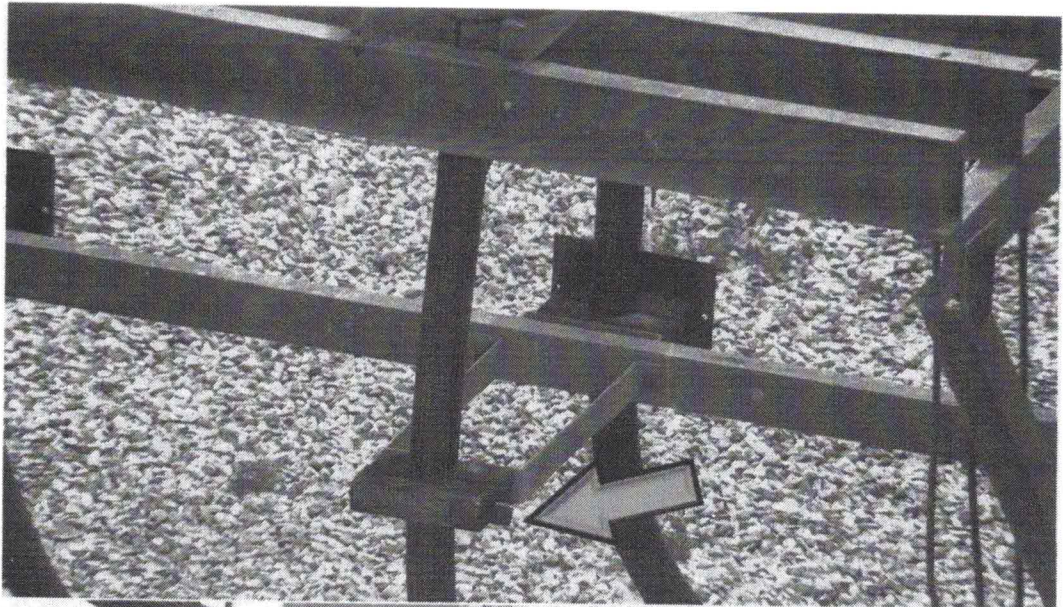



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

โทรสาร

เลขที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
ชื่อผู้รับ นายมนตรี ไชคินี
ชื่อผู้ส่ง นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์
จำนวนเอกสารแนบ - แผ่น

วันที่
ตำแหน่ง อก.สพ.
ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก3)

ด้วยศูนย์ฯ นครปฐม มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ระบบ 115 เควี ภายในสถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.) เพื่อให้ กบช.(ก3) เปลี่ยนแคล้มป์ยึดสาย Underground Cable 115 kV ภายใน สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB08YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70412 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70417 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.)

2. วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB01YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส 1BPU 1YB-01 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส 1BPU 1YS-01 และ 1BPU 1YS-02 บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด

3. วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB05YB-01 ถึง Load Break Switch 115 เควี รหัส BPB5YS-04 บริเวณแยกไฟแดงเบิกไพร โดยย้ายโหลดระบบ 115 เควี สถานีฯ หนองปลาหมอ, สถานีฯ ท่าม่วง 2 (ชั่วคราว) และผู้ใช้ไฟ 115 เควี บริษัท แอดวานซ์ไฟเบอร์ จำกัด ไปรับไฟจากสายส่ง 115 เควี ทางด้านสถานีฯ โพธาราม 1 (กฟต.1) โดยขนานผ่าน เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NOM01YB-01 ภายในสถานีฯ หนองปลาหมอ และขอให้ กฟผ. แจ้าง SPP 115 เควี บริษัท เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำกัด หยุดการขนาน Generator กับระบบ กฟภ. (สามารถเดินโหลดเป็นผู้ใช้ไฟได้)

4. วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. มีแผนงานดับไฟเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BPB02YB-01 และขอปลดเบรกเกอร์ รหัส BP2 70122 พร้อมใบมีดด้านออกไลน์ รหัส BP2 70127 สถานีฯ บ้านโป่ง 2 (กฟภ.)

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ ศสพ. ประสานงานแจ้ง กฟผ. โดยขอปลดเบรกเกอร์ และสวิตช์ใบมีด ตามรายละเอียดข้างต้นตามวันและเวลาดังกล่าวต่อไป

ผว.

ที่ ก3 กปบ.(คฟ)- /2566
เรียน อก.ปบ.(ต1), อก.ชช.(ก3), อก.ชฟ.

ผจก.กฟอ.บปง., กฟส.ทมมง.

- เพื่อโปรดทราบ

- กปบ.(ต1) เตรียมระบบรองรับการย้ายโหลดระบบ 115 เควี ที่สถานีฯ โพธาราม (กฟต.1)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ผคฟ. กปบ.(ก3) รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

โทร (33) 10511, 10529-30

ทพ./ชม.		
วศก.	นครินทร์ อังสนาวศิน	14 ก.ย. 66
