



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.สค.(ปน) ๕๕๕๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล

ชื่อผู้ส่ง นายสนชัย โตอัสมิ

วิญญูขอตัดไฟ

Switching Deadline

24 ก.ย. 67

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อภ.ปน.(กต)

ตำแหน่ง วศก.๑๑ ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพส.สค.

ด้วยการไฟฟ้า กพส.สค. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ KV บริเวณ แยกก้านวัลลภ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMB๑๓	๒๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๑๑๕ KV บริเวณ แยกก้านวัลลภ	จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี แยกก้านวัลลภ	SMB๑๓S-๕๐	นายสุนทร มากคล้าย โทร. ๐๘๗๓๖๓๓๒๗๘
๒	SMB๑๓	๒๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		จุดตัดเบรกโดยวิธีฮอทไลน์ กระเช้า ๒๒ เควี แยกก้านวัลลภ	SMB๐๓S-๑๐ ท้ายซอยบางกะเจ้า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิรวัดน์ บุญพร้อม ตำแหน่ง พชง.๖ โทร ๐๘๖-๓๘๓๒๐๘๐

พื้นที่ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายสนชัย โตอัสมิ)

ตำแหน่ง.....วศก.๑๑ ปฏิบัติงานแทน ผจก.ภพส.สค.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SMB13 จาก DDE แขวงกัมปงคอง ถึง SMB13S-50
ในวันที่ 25 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1386/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMB13 จาก DDE แขวงกัมปงคอง ถึง SMB3S-10
ในวันที่ 25 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฟาเงิน ประสานงานการขอดับไฟกับ ผยจิรวรวัฒน์ บุณย์พร้อม

รุ่งนภา
(ทนายสาวสุกัญญา วงศ์บุญธรรม)
จก. 5 แทนผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ลอด.



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. (.....) (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

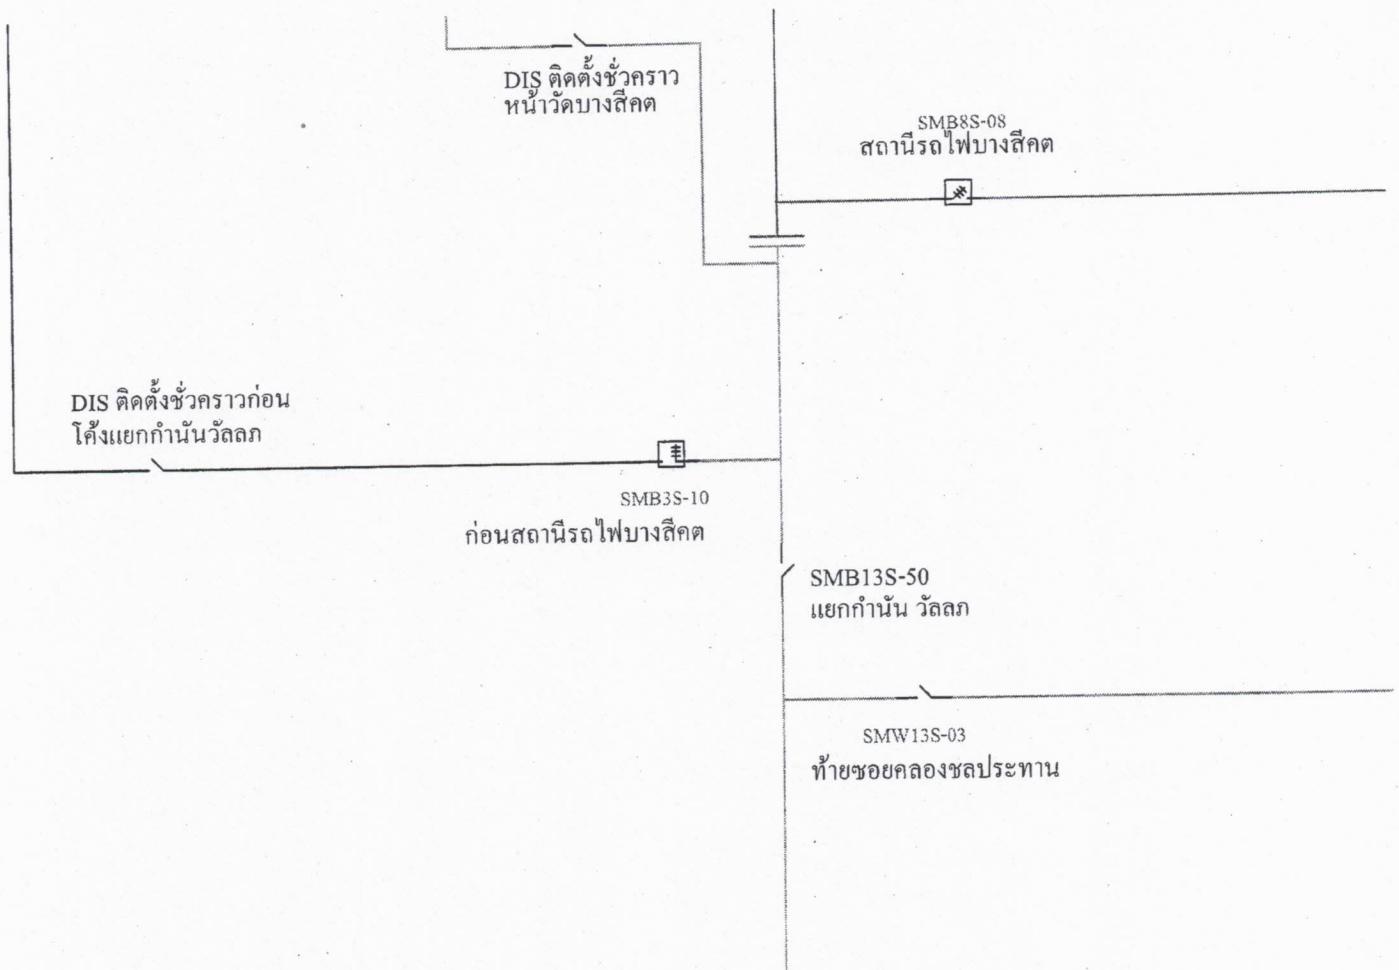
ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | | | |
|------------------------|---|----------|------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณ แยกก้านนำวัลลภ | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 25 ก.ย. 67 | เวลา | 08.00 น. | ถึง | 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟผ.สก. | งานที่ทำ | ปรับปรุงระบบ 115 KV แยกก้านนำวัลลภ | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1386/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายขุนทอง ฝาเงิน | | | วันที่ | 19 กันยายน 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 19 กันยายน 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 19 กันยายน 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายฉวีวัฒน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		LOAD=8.9 MW
4	SMK-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
5	SMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		LOAD=1.9 MW
6	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK		
7	ย้ายโหลด SMB13 บางส่วนไปรับไฟจาก SMK05						
8	SMB15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB		
9	SMK05S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สก.		SF6 ตรงข้าม บ.จกไทยเคมีคอล
10	SMB13S-50	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สก.		DIS แยกก้านนำวัลลภ
11	SMB15VB-01	สับ	ปลด		SMB		
12	แจ้งกฟผ.สก. ตรวจสอบ SF6 รหัส SMB03S-10 ก่อนสถานีรถไฟบางสิคต ให้อยู่ตำแหน่ง OFF LOCK คาน						
13	- เมื่อพร้อมดับไฟ SMB13VB-01 เวลา 08.00 น.						
14	แจ้งกฟผ.สก. HL. ทำการตัดเตส SMB13VB-01 บริเวณแยกก้านนำวัลลภ ออกทั้ง 3 (จุดตัดเตส-SMB13S-50, SMB03S-10 ไม่มีโหลด)						
15	หลังจากกฟผ.สก. ทำการตัดเตส SMB13VB-01 บริเวณแยกก้านนำวัลลภ ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟผ.สก. รับทราบ						
17	แจ้งกฟผ.สก. เทสไฟดับแล้วทำการช็อดกราวด์ จุด G1						
18	แจ้งกฟผ.สก. เทสไฟดับแล้วทำการช็อดกราวด์ จุด G2						
19	แจ้งกฟผ.สก. ลง WE SAFE ให้เรียบร้อย						
20	แจ้งกฟผ.สก. ปฏิบัติงานได้						
21	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
22	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB		
23	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK		
24	SMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
25	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
26	หลังจากกฟผ.คกข. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
27	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
28	SN2-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
29	SMB13VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
30	SMK-TP1	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
31	SMK05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
32	SMK10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMK			
33	แจ้งกฟส.ศค.ทำการปลดช็อคกราวด์ จุด G1 ออก							
34	แจ้งกฟส.ศค.ทำการปลดช็อคกราวด์ จุด G2 ออก							
35	แจ้งกฟส.ศค. HL.ทำการจัมเตส SMB13VB-01 บริเวณแยกก้านนำวัลลภเข้าทั้ง 3 เฟส จุดจัมเตส-SMB03S-10,SMB13S-50 ไม่มีโหลด							
36	หลังจากกฟส.ศค.ทำการจัมเตส SMB13VB-01 บริเวณแยกก้านนำวัลลภ เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย							
37	ย้ายโหลด SMB13 บางส่วนกลับจาก SMK05							
38	SMB15VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMB			
39	SMB13S-50	ปลด	สับ		ศค.		DIS	แยกก้านนำวัลลภ
40	SMK05S-04	สับ	ปลด		ศค.	SCADA	SF6	ตรงข้าม บ.จกไทยเคมีคอล
41	SMB15VB-01	สับ	ปลด		SMB			
42	SN2-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
43	SMB13VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMB			
44	SMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMK			
45	SMK05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK			
46	SMK10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMK			
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน



สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

