



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นญช. ๖๕๖ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอวิชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช. ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขสาย sac. หย่อนยานมิเตอร์แบ่งแดน กฟส.อ.ดอนเจดีย์ - กฟส.อ.หนองหญ้าไซ ผัง กฟส.อ.หนองหญ้าไซ รหัส DOA02S-06 วงจร DOA02 สถานีไฟฟ้า ดอนเจดีย์ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DOA02	๕ ส.ค. ๒๕๖๕ 5 ก.ย. 2565	๐๘.๓๐น.	๑๖.๓๐น.	ชุดขอทไลน์กระแสเข้าสุพรรณบุรี แก่ไขสาย sac. หย่อนยาน มิเตอร์แบ่งแดนผัง กฟส.อ. หนองหญ้าไซ รหัส DOA7S-09 วงจร DOA02 สถานี ไฟฟ้า ดอนเจดีย์	มิเตอร์แบ่งแดนผัง กฟส.อ.หนองหญ้าไซ รหัส DOA7S-09 วงจร DOA02	6F6 หน่วยหนองทราย DOA7S-10 วงจร DOA02	นายศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านดินแดน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง หน.กบ โทร ๐๘๐๒๖๔๓๐๑๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอวิชัย จันทร์เพ็ญ)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.นญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DOA2 จาก DOA7S-09 ถึง DOA 7S-10
ในวันที่ 5 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1388/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเดอร์... จาก... ถึง...
ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย พหิต ราชฤทธิ์ โฆษก... ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทช.สำโรง แก้วไว้อย.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟล.๓, กฟส. หนอง...

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายอวิชัย จันทร์เพ็ญ)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.นญช.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผ.จก. 1 (สถานี DAA, DOA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านดินแสน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.30	น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูง (SAC) หย่อน		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1388/2565		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชภูริเนียม				วันที่	22 สิงหาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	22 สิงหาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	22 สิงหาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA	-	-
4	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
5	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	-
6	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	L=3.2MW.
7	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA	-	L=3.6MW
8	DOA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	R	หนองหลอด
9	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.	AVR	สระกระโจม
10	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.	AVR	สระกระโจม
11	ย้ายโหลด DOA-TP1 ไปจ่ายจาก DOA-TP2						
12	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	ขนานบัส
13	DOA01BVB-01	สับ	ปลด		DOA	-	INCOMING 1
14	ย้ายโหลด DOA02 บางส่วนไปจ่ายจาก DAA02						
15	DAA06S-08	ปลด	สับ		ดช.	SCADA	SF6 ทัพตาแทน
16	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA	-	ขนานบัส
17	DAA02S-15	ปลด	สับ		นญช.	DIS	โรงเรียนมาบพยอม
18	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA	-	ขนานบัส
19	DAA06S-08	สับ	ปลด		ดช.	SCADA	SF6 ทัพตาแทน
20	DOA07S-10	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.	SF6	หน้าวัดหนองทราย
21	ย้ายโหลด DOA-TP1 กลับจาก DOA-TP2						
22	DOA01BVB-01	ปลด	สับ		DOA	-	INCOMING 1

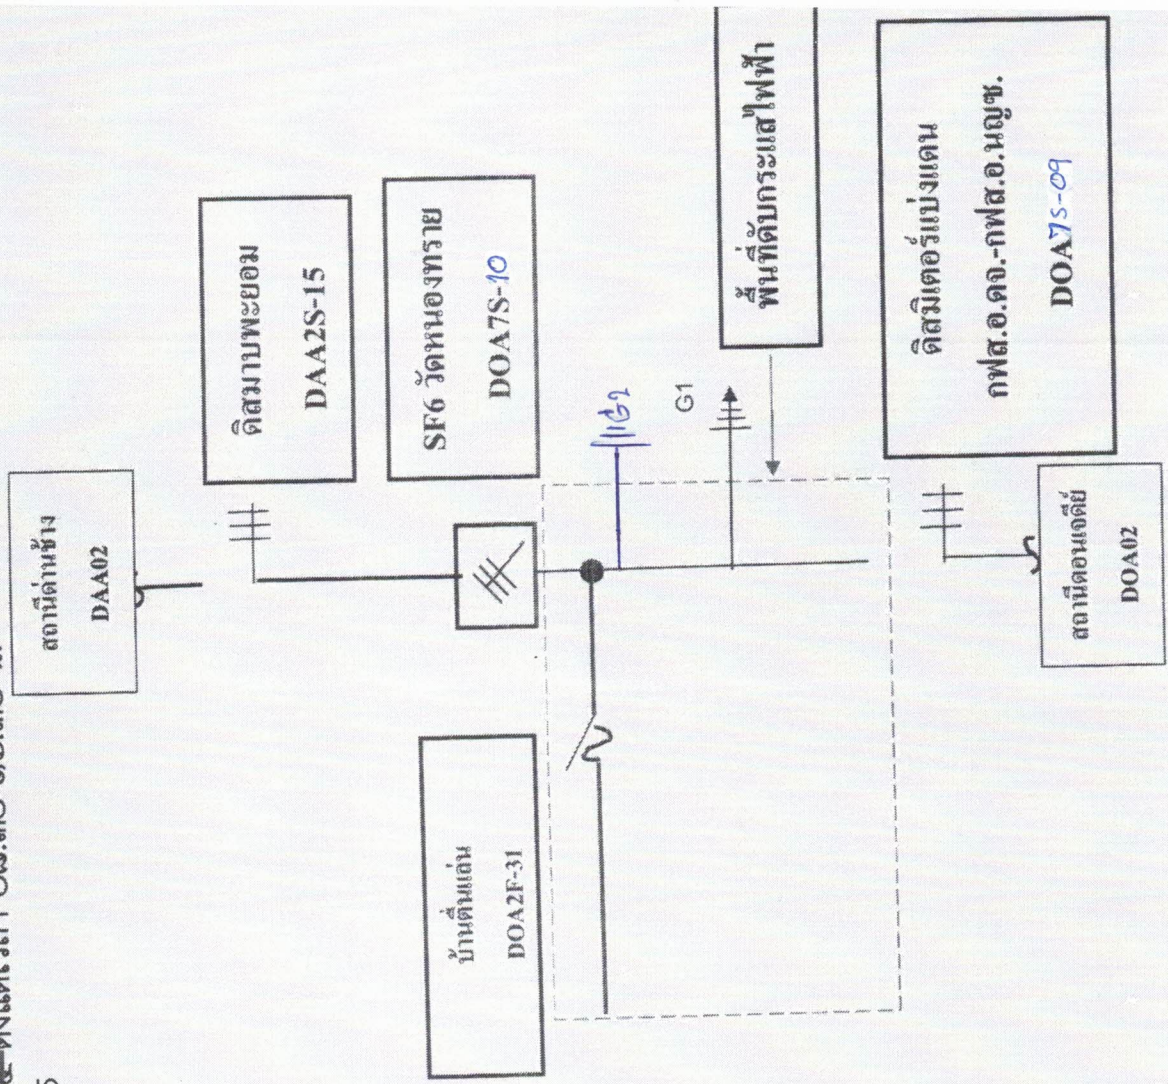
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
23	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		-	ขนานบัส
24	<u>เมื่อพร้อมดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน</u>							
25	DOA07S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS	บ้านทางขวาง
26	<u>แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ</u>							
27	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
28	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
29	<u>หลังจากชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>							
30	<u>แจ้งชุดปฏิบัติงานปฏิบัติงานได้</u>							
31	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
32	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-	-
33	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
34	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-	-
35	DAA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
36	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-	-
37	DOA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		R	หนองหลอด
38	DOA07R-02	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ดจ.		AVR	สระกระโจม
39	DOA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดจ.		AVR	สระกระโจม
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>								
40	<u>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ</u>							
41	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
42	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-	-
43	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
44	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-	-
45	DAA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
46	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-	-
47	DOA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		R	หนองหลอด
48	DOA07R-02	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ดจ.		AVR	สระกระโจม
49	DOA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดจ.		AVR	สระกระโจม
50	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1							
51	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2							
52	<u>ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว</u>							
53	DOA07S-09	ปลด	สับ		นญช.		DIS	บ้านทางขวาง

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อแก้ไขสาย SAC หย่อนยานมิเตอร์แบ่งแดนฝั่ง กฟส.อ.หนองหญ้าไซ

ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

5 ก.ย. 2565



หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหลกลับสภาพเดิม
บริเวณที่ขอดับไฟปฏิบัติงาน
