



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓ /๐๘๖๗
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโคทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

Switching Deadline
วันที่ 31 ส.ค. 65

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี 2

ตามแผนผังเชิงแผน จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	3/09/65	08.00	17.00	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง	Dis ชั่วคราว สถานีสุพรรณบุรี 2	DOE ร.ร. เทรน อินน์	โทร. ๐๙๐-๓๙๓๙๑๑๔ นายเปรี๊ยะ ทองระย้า
๒.	9 สท.	10/09/65	08.00	17.00	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง	DOE ร.ร. เทรน อินน์	SPA085-08 บ่อปลา	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง ทชช.๒ (สช.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศสกรส(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๓ มีโอกาสชำรุด ๓.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิกัด SPAA จาก Dis ๖๓.๖ นำ SPB ถึง DDE ร.ร. เทรน อินน์

ในวันที่ 3 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1394/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิกัด จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ นาย อวส โสภพพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมนกร สุวรรณประทีป
23 ส.ค. 65

นายพร สันติโกศลกิจ
(๐๙๖.๗ ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน

แผนผังแนบ 1 แผน

ผจก. (สถานี -)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณโรงแรมเทรอนอินน์ - หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1394/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	24 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนซ์				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		- โหลด 3.38 MW
3	SPA09R-01	Normal	Non-Reclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
4	ย้ายโหลด SPA09 (เปลี่ยนทางการจ่ายไฟ)						
5	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
6	DIS ชั่วคราว.	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หน้าสถานีฯสุพรรณบุรี 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.00 น.						
8	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออกทั้ง 3 เฟส (หม้อแปลง จำนวน 3 ลูก)						
9	แจ้งชุด Hot Line ทำการปลด DDE บริเวณหน้าโรงแรมเทรอนอินน์ ออกทั้ง 3 เฟส						
10	หลังจากชุด Hot Line ดำเนินการแล้วเสร็จ						
11	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงรูดจุด G1						
12	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการเทสไฟ, ข้อตกลงรูดจุด G2						
13	หลังจาก กฟจ.สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
14	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.สพ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
15	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
16	SPA09R-01	Non-Reclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อ กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
18	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
19	SPA09R-01	Normal	Non-Reclosing		สพ.		R บางปลาหมอ
20	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดข้อตกลงรูดจุด G1 ออก						
21	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดข้อตกลงรูดจุด G2 ออก						
22	หลังจาก กฟจ.สพ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
23	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
24	แจ้งชุด Hot Line ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าโรงแรมเทรอนอินน์ เข้าทั้ง 3 เฟส						
25	หลังจากชุด Hot Line ดำเนินการแล้วเสร็จ						
26	ย้ายโหลด SPA09 (กลับคืนสภาพปกติ)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	DIS ชั่วคราว.	ปลด	สับ		สพ.		DIS หน้าสถานีสุพรรณบุรี 2
28	SPA07S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
29	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		- -
30	SPA09R-01	Non-Reclosing	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
สิ้นสุด Switching							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จาก ผบ.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.


ถึง ผจก.กฟง.สพ.

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่ ๓...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDE รร.เทรนอินน์...เพื่อ...รื้อถอนและทาดสายแรงสูง ๑๘๕ ต.มม. ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเตอร์ ...๙...สถานี...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDEโรงเรียนกีฬา๒ - DDE รร.เทรนอินน์ กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้...นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณกร ตำแหน่ง ชุดก่อสร้างเขต เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๘๕-๒๙๐๔๐๔๑...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นายวรพล สุทธิโกร ตำแหน่ง ทม.กส.สพ. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แผนผังเชิงเส้น

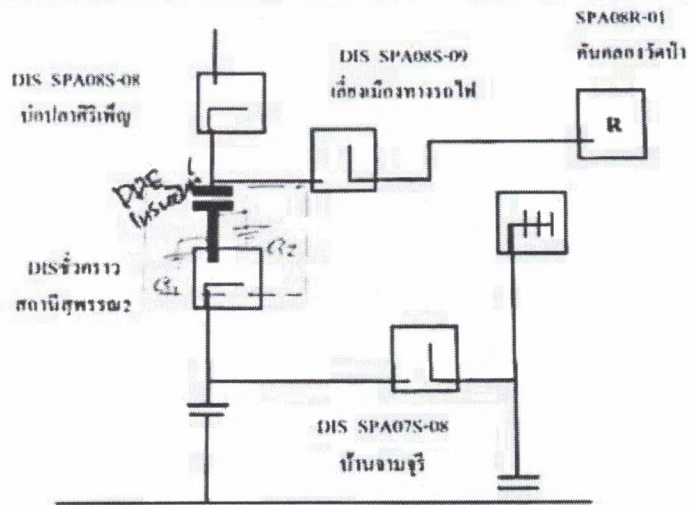

ดับไฟระบบจำหน่าย รื้อถอนและทาดสาย ๑๘๕ ต.มม. ๒๒เควี

๑. ย้ายโหลตพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลต ให้Hot Line สพ.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเขต ๑จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก่ไฟช็อคกราวด์จุด๑และจุด๒
๔. แจ้งชุดก่อสร้างเขตปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟง.สพ.

Ok

(นายอนากร สุวรรณประทีป)

พงง.๖(สข.) ผบ.กฟง.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๕๘๕๕, ๑๕๘๖๐
