



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

02/10/67

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปน) - ๑๙๔/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายมานูช วาสกรี่

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.ปน.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.ปน.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน
สค. ๓๐๑๑ (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว) สถานีไฟฟ้า กระทุ่มแบน ๕ ตามแผนผังแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTE ๐๒	๖ ต.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผ.ปน.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน สค. ๓๐๑๑ (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)	ก่อนถึงสามแยกบางยาง (หน้าบริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด)	สี่แยกสวนส้ม (อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTE๐๒S-๐๙)	นายนพพร ชาวไชยศรี ทพ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ก่อนถึงสามแยกบางยาง (หน้าบริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด) จนถึง สี่แยกสวนส้ม (อุปกรณ์ตัดตอน รหัส KTE๐๒S-๐๙) มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๑๘๗ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทพ.ปน. กฟส.กทบ. โทร. ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๓๓๓๑๕๑, ๑๐๐.๒๑๐๖๘๘๓
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๒๙๐๗๓, ๑๐๐.๑๙๘๘๑๒

(นายมานูช วาสกรี่)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อภ.ปน.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ KTE 2 จาก DDE ม.เทคโนโลยี ถึง KTE 28-09

ในวันที่ 6 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1396/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุทิน อิศรภอนิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จกค.นพพร ชาวไชยศรี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ) ม/ส.๑๑.๒(คพ), ม/ส.กทบ.

เรียน อภ.สฟ.(ก๓), อภ.วว.(ก๓), ผจก.

(นายอนุทิน อิศรภอนิ)
จกค.๗ กทบ. น.คพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปน.(ก๓)


หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ก่อนถึงสามแยกบางยาง (วงจร KTE02)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	6 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1396/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวศิน			วันที่	24 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	24 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	24 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- Load 0.5 MW
3	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		- Load 4.5 MW
4	ย้ายโหลดวงจร KTE02 บางส่วนไปจ่ายไฟจากวงจร KTE03						
5	KTE02S-16	ปลด	สับ		บพว.	SCADA	SF6 แส่นร์กรีสอร์ท
6	KTE02S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น.						
8	KTE02S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กทบ.		SF6 ก่อนป้อมตำรวจ
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ โหลดโหลดวงจร KTE02 บริเวณที่ทำงานออกทั้งหมด						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานให้ โหลดโหลดวงจร KTE02 บริเวณที่ทำงานออก แล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปลด DDE วงจร KTE02 บริเวณ บริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด ออกได้						
12	เมื่อผู้ควบคุมงานปลด DDE วงจร KTE02 บริเวณ บริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด แล้วเสร็จ						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
14	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
15	แจ้งพนักงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
16	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
17	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
18	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		-
19	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
20	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยันใน Wesafe						
21	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
22	KTE02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
23	KTE03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		-
24	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G1						
25	แจ้งพนักงาน ปลดซ็อตกราวด์ จุด G2						
26	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้จัม DDE วงจร KTE02 บริเวณ บริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด ได้						
28	เมื่อผู้ควบคุมงานจัม DDE วงจร KTE02 บริเวณ บริษัท เทคโนโลยีแอนด์เนเจอร์ จำกัด แล้วเสร็จ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงานให้นำโหลดวงจร KTE02 บริเวณที่ทำงานเข้าได้ทั้งหมด						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	เมื่อผู้ควบคุมงานนำโหนดวงจร KTE02 บริเวณที่ทำงานเข้า แล้วเสร็จ						
31	KTE02S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ก่อนป้อนตำรวจ
32	ย้ายโหนดวงจร KTE02 บางส่วนกลับจากวงจร KTE03						
33	KTE02S-09	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามร้านอาหารหม่อม
34	KTE02S-16	สับ	ปลด		บพว.	SCADA	SF6 แสนร์กรีสอร์ท
35	KTE02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
36	KTE03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังสถานะปัจจุบัน **ก่อนการตัดไฟ** บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ ก่อนถึงสามแยกบางยาง (หน้าบริษัท เทคโนโลยีแอนดรอยด์เนเจอร์ จำกัด) จนถึง สี่แยกสวนส้ม
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.ภพ.ส.ภทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

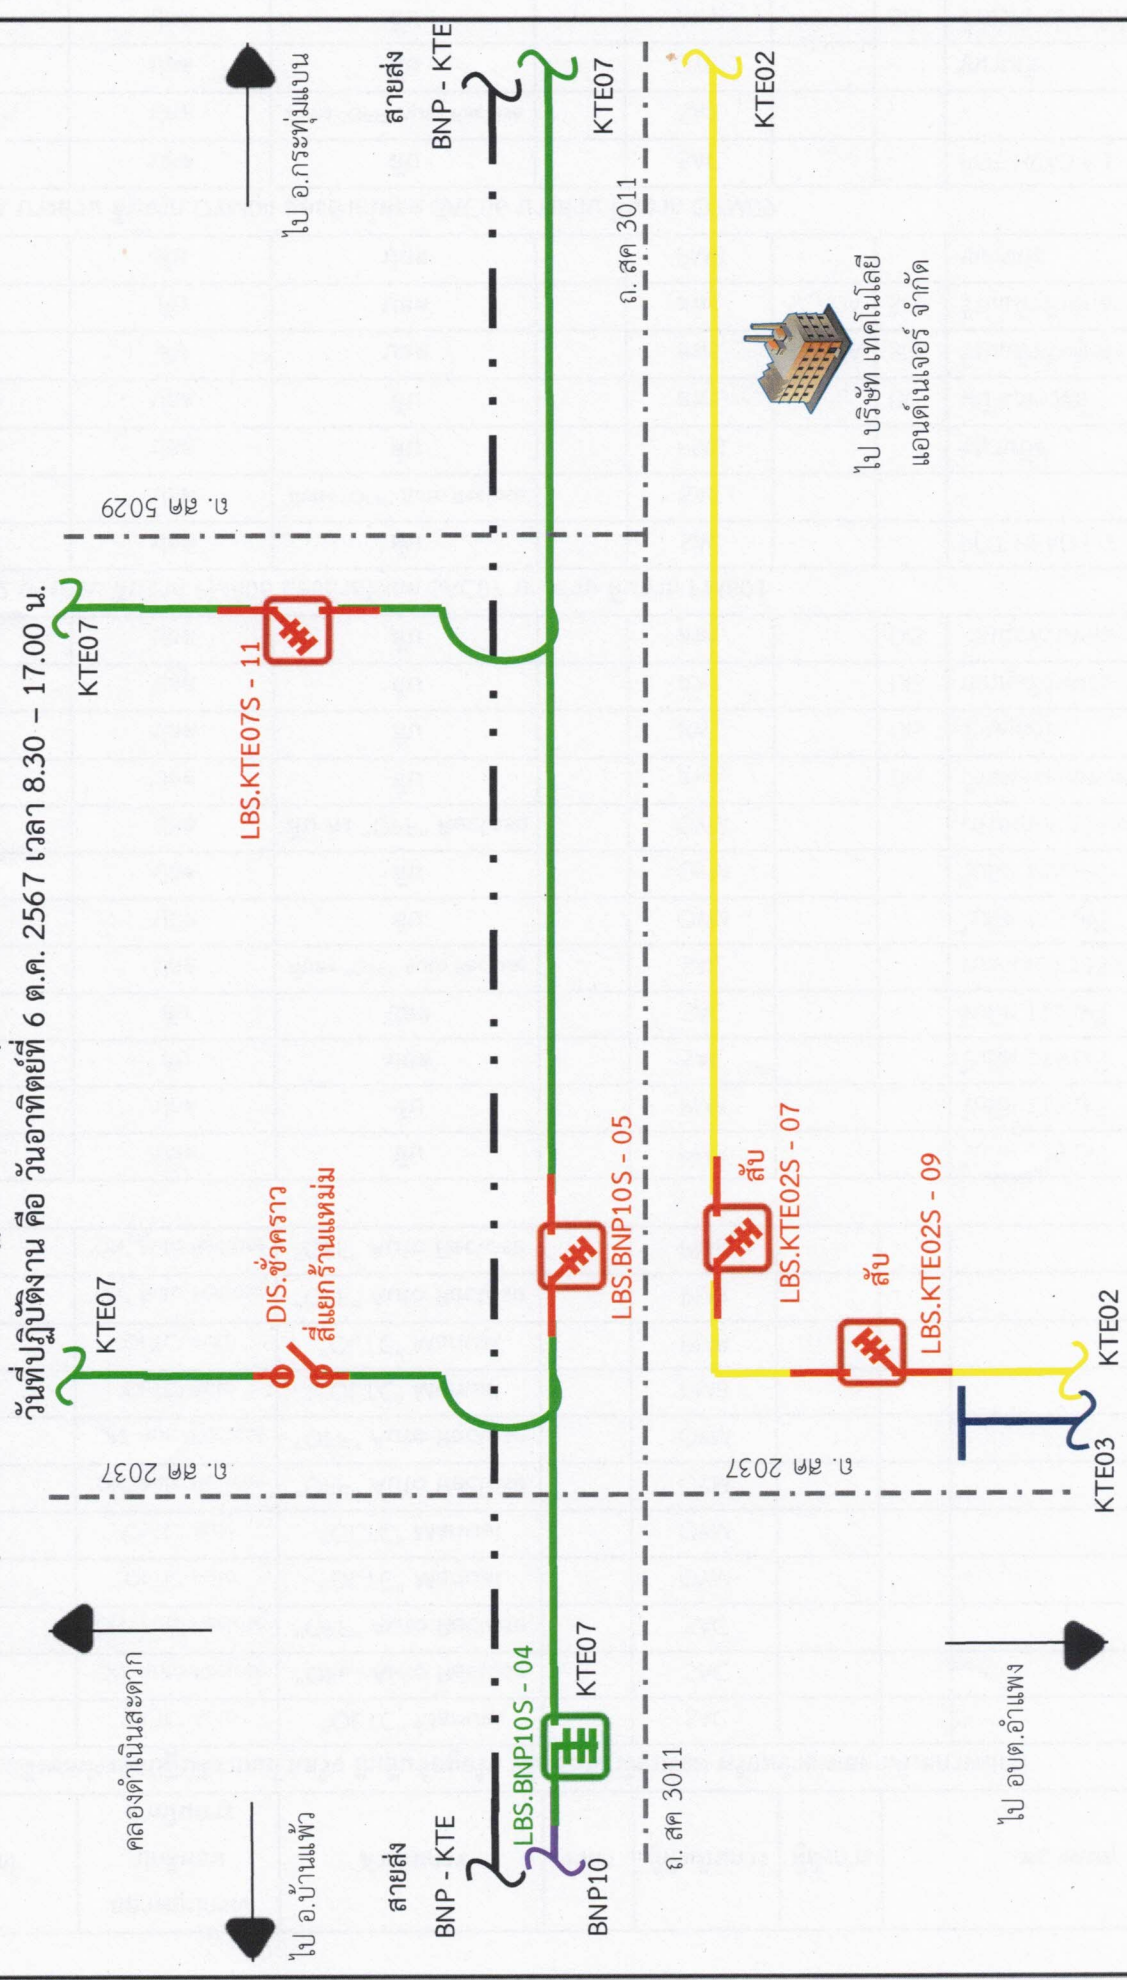

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 183 ราย

แผนผังสถานะปัจจุบัน **หลังการตัดไฟ** บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 ตั้งแต่ ก่อนถึงสามแยกบางยาง (หน้าบริษัท เทคโนโลยีแอนดรอยด์เนเจอร์ จำกัด) จนถึง สี่แยกสวนส้ม
 เพื่อให้ชุดงาน ผบ.กฟส.กทบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า บริเวณ ถนน สค. 3011 (ฝั่งไป อ.บ้านแพ้ว)
 วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 6 ต.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

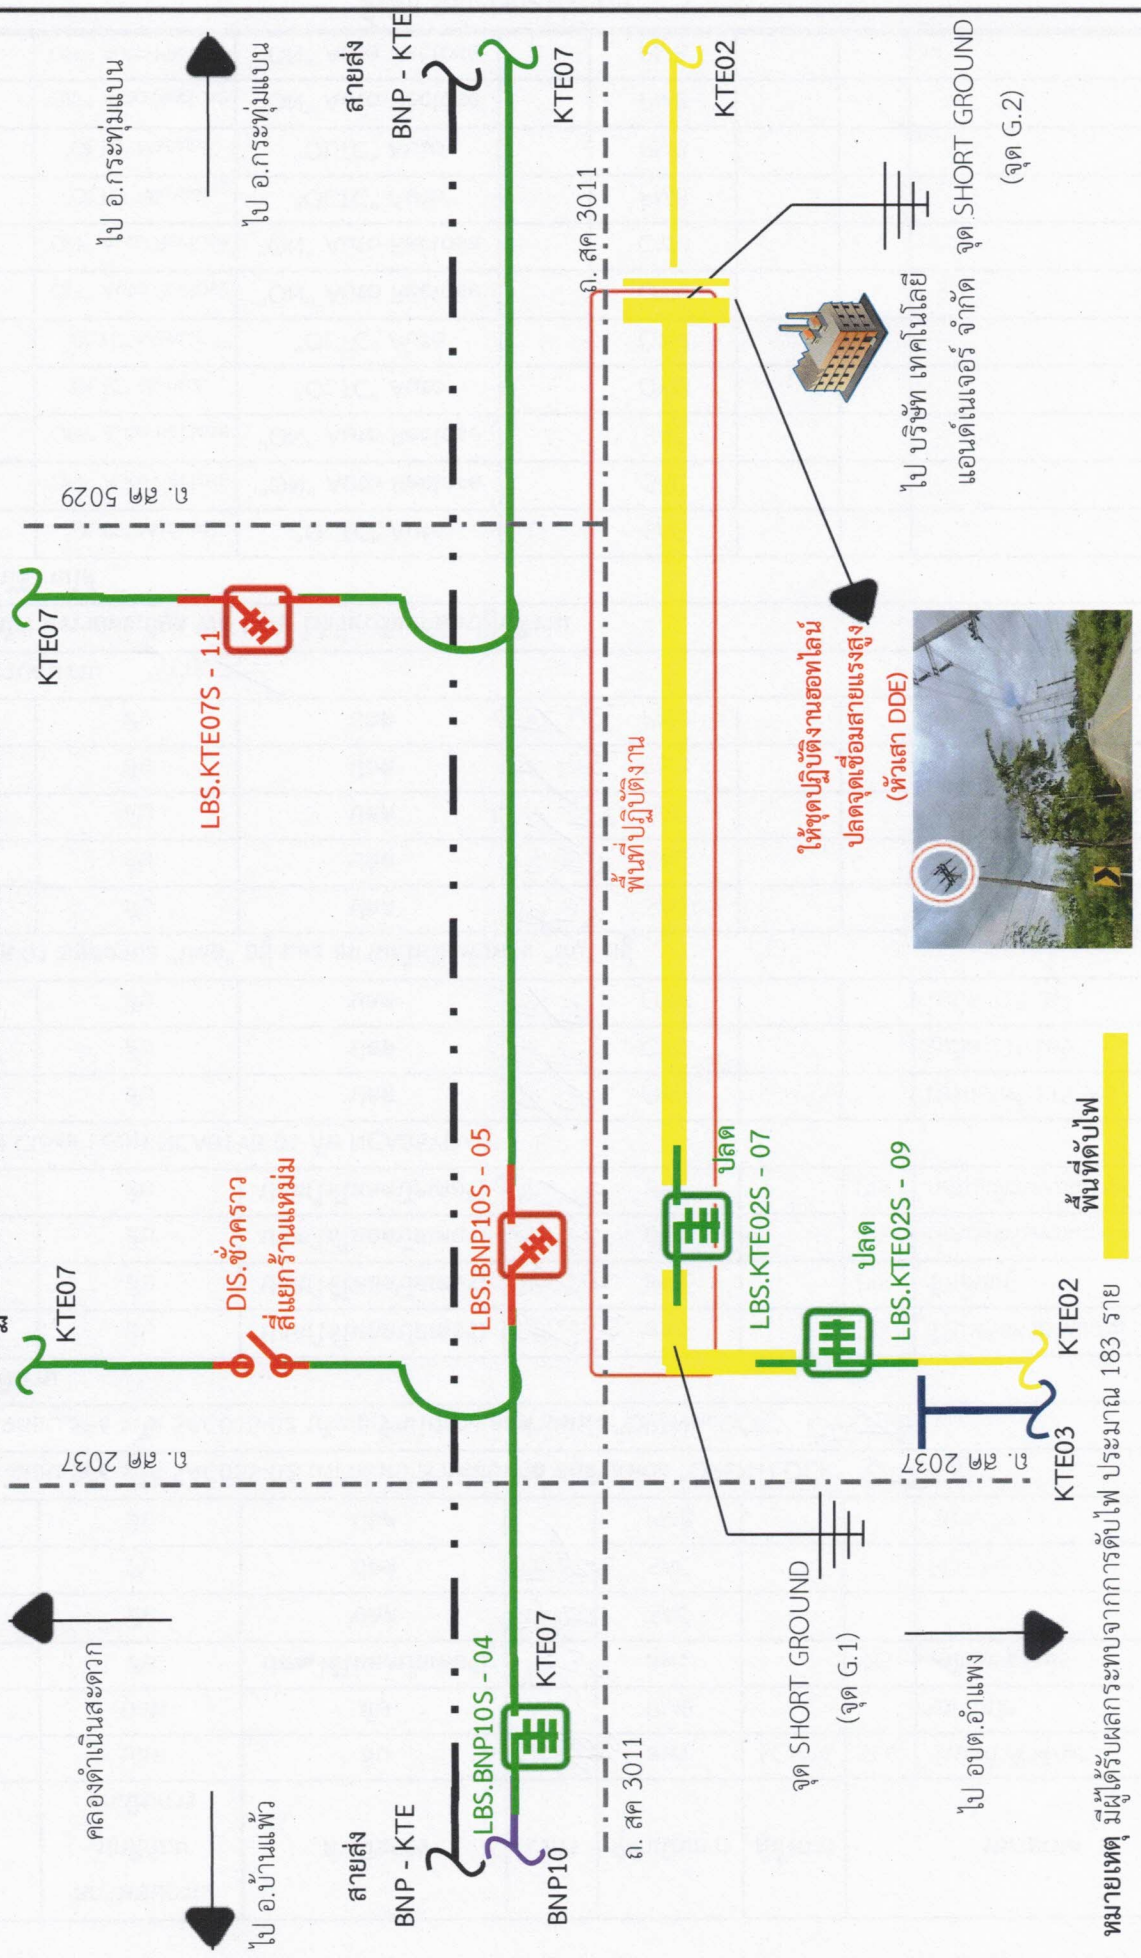

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 183 ราย
 พื้นที่ตัดไฟ
