



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วิทยุขอตัดไฟ

16/10/67

เลขที่ ก.๓.กฟส.กทบ.(ปบ) - ๑๙๕/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล
ชื่อผู้ส่ง นายมานิช วาสกรี

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. จะดำเนินการ.....ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.สค. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบ
จำหน่าย ๒๒ เควี. ตั้งแต่ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระท่อมแบน ๖ จนถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชยาคาร.....สถานีไฟฟ้า
กระท่อมแบน ๖ (ชั่วคราว) ตามแผนผังแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTU ๐๓ KTU ๐๕	๒๐ ต.ค. ๒๕๖๗	๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ให้ชุดปฏิบัติงาน ผกส.กฟส.สค. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี. ตั้งแต่ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระท่อมแบน ๖ จนถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตร พันธุ์พืชยาคาร	สี่แยกโรงเรียน บ้านแคราย เกษตรพันธุ์ พืชยาคาร	หน้า บริษัท เซียะ จ้อ เอ็นเตอร์ ไพรส์ จำกัด	นายสมพจน์ อาน้อย พงง.๖ ผกส. กฟส.สค. โทร. ๐๖๓ - ๘๖๙๘๓๓๓

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ตั้งแต่ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชยาคาร. จนถึง หน้า บริษัท เซียะ จ้อ เอ็น
เตอร์ไพรส์ จำกัด มีจำนวนผู้ได้รับผลกระทบ คือ ๑ ราย
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ท.พ.ปบ. กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗ - ๖๗๑๕๖๒๖

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ ๓.๑ เริ่มต้น Lat,Long : ๑๓.๖๔๖๔๘๗.๑๐๐.๓๒๔๘๘๘๘
๓.๒ สิ้นสุด Lat,Long : ๑๓.๖๓๖๑๑๘.๑๐๐.๓๒๓๗๔๘

(นายมานิช วาสกรี)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.
๒๐ กันยายน ๒๕๖๗

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)


ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1, 2 ฟีดเดอร์ KTU 05 จาก DIS ๑๓ KTU 3, 5 ถึง DDE 11กทบ.๓๓๓
ในวันที่ ๒๐ ต.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1397/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณผล ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๓๐ นายพร อภิไธยศรี
29 10- 67

(นายมานิช วาสกรี)
๓๐ นายพร อภิไธยศรี


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ กระทุ่มแบน 6 ถาวร				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20 ต.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1397/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	30 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	30 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุกัญชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTU		-
3	KTU03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
4	KTU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTU		-
5	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
6	KTB01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
7	KTB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		-
8	ย้ายโหลด KTU 3,5 บางส่วนไปจ่ายจาก KTB 1,5						
9	KTU02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTU		-
10	KTB05S-10	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ร้านที่วัสดุก่อสร้าง
11	KTB01S-07	ปลด	สับ		กทบ.		DIS ร้านเจ็ดตุ๊ก
12	DIS ชค.ไลน์ KTU03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชค.หม้อแปลงไฟทาง อบต.แคราย
13	DIS ชค.ไลน์ KTU05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ชค.หน้า บ.เขี้ยว จ้อ เอ็นเตอร์โพรส
14	KTU02VB-01	สับ	ปลด		KTU		-
15	ตรวจสอบ SF6 KTA5S-12 , KTA10S-14 ตรงข้ามโรงเรียนบ้านแคราย ให้สถานะ "OFF" และ "ล๊อคคาน"						
16	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
17	แจ้งหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกก่อนทำการปลด DDE						
18	หลังจากหน่วยงานทำการปลดโหลดหม้อแปลงในระบบทั้งหมด ออกเรียบร้อยแล้ว						
19	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE ไลน์ KTU 3,5 บริเวณ ตรงข้ามร้านที่วัสดุก่อสร้าง ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
20	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE ทั้ง 2 จุด เสร็จเรียบร้อยแล้ว						
21	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
22	แจ้งหน่วยงานทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G1						
23	แจ้งหน่วยงานทดสอบไฟ ช็อตกราวด์ จุด G2						
24	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการทดสอบไฟ และช็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
25	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
26	KTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTU		-
27	KTU03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTU		-

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนการตัดไฟ บริเวณ สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชวิทยาฯ จนถึง หน้า บริษัท เซียะ จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เพื่อให้ชุดงาน ผกส.กฟล.สค. ปฏิบัติงาน ก่อสร้าง - ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี. ตั้งแต่ หน้าพื้นที่ก่อสร้าง สฟฟ.กระทุ่มแบน 6

จนถึง สี่แยกโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พืชวิทยาฯ
วันที่ปฏิบัติงาน คือ วันอาทิตย์ที่ 20 ต.ค. 2567 เวลา 8.30 - 17.00 น.

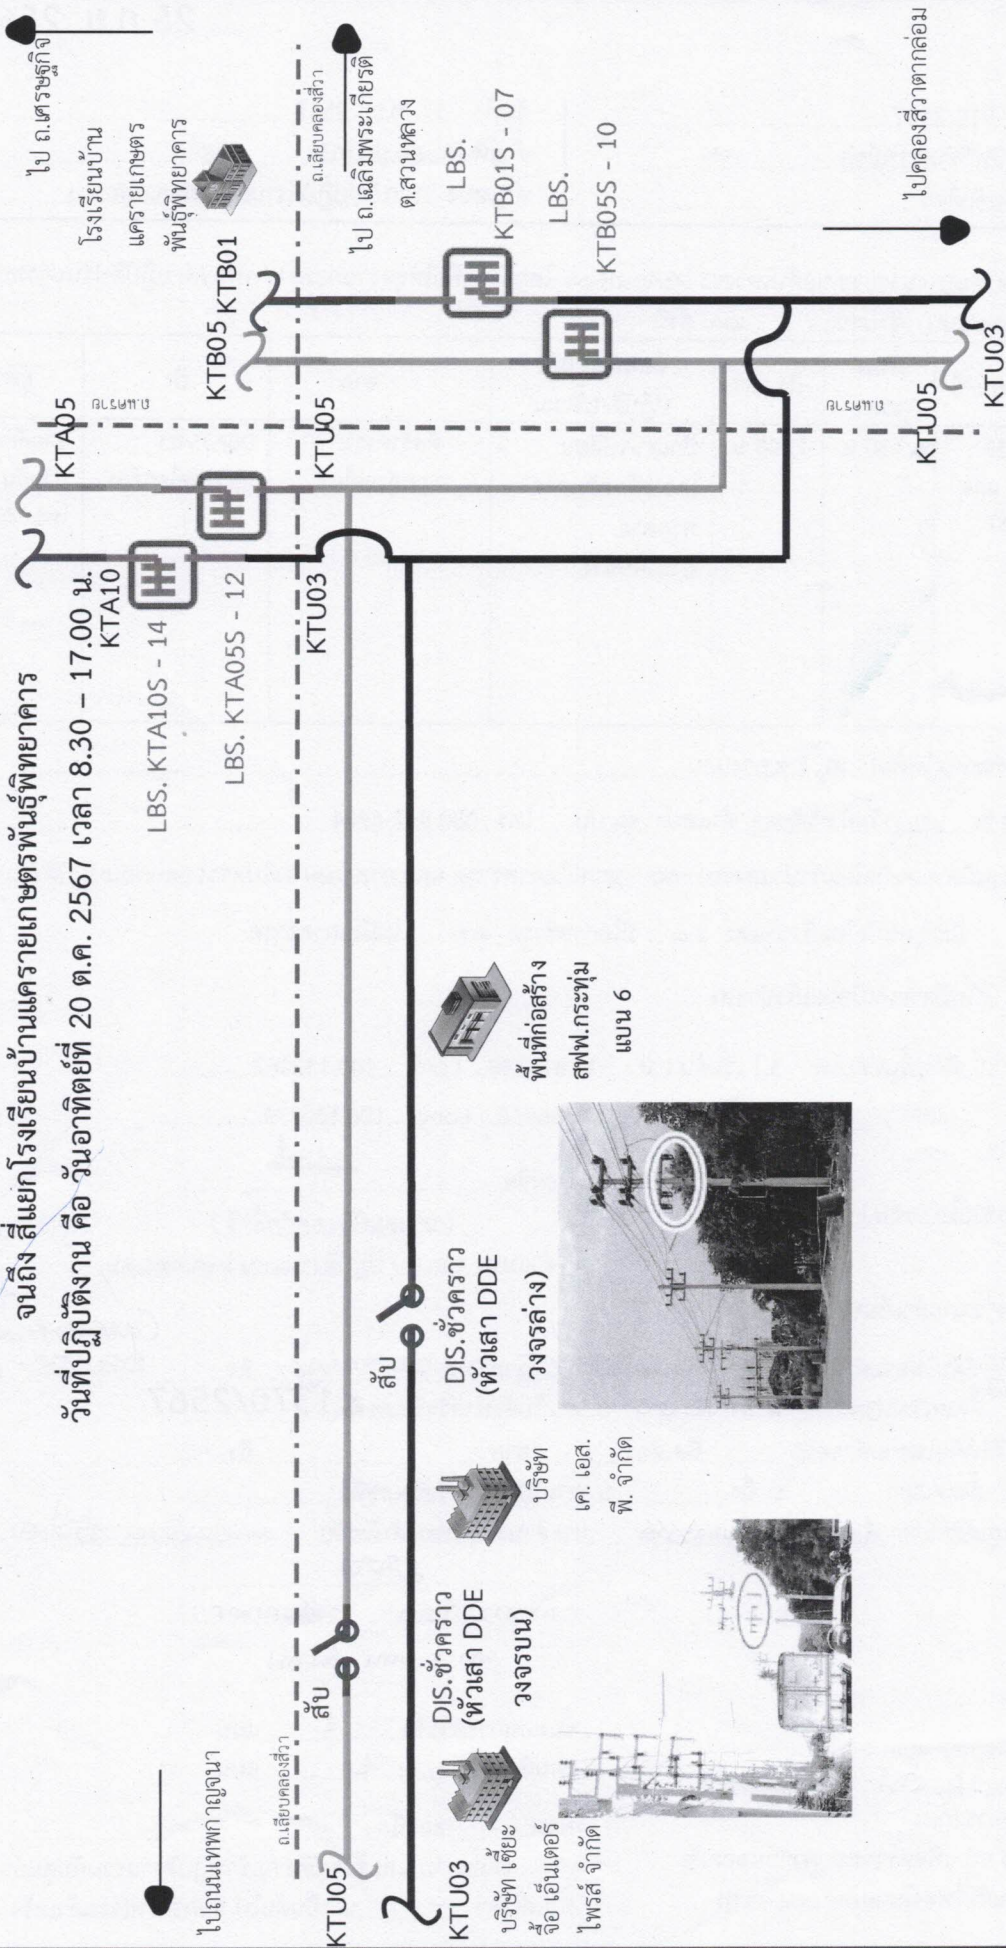

หมายเหตุ มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ ประมาณ 1 ราย

