

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ป.บ.) 03143

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ม.ร.น.ป.บ. เมล็ดนสายแรงสูงเป็น ๑๘๕SAC.ถ.บ.ร.มาขาออก ตั้งแต่
แยกเข้าโรงแม่ริชชอเทล - บีม.ป.ตท.(เงินพี) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SAC๐๑	๑๘ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูง ๑๘๕SAC ถ.บ.ร.มาขาออก แยก ชอเทล - ปากทางสาย๖	SAC๑S-๐๑	- SAC๑S-๐๒ - SAC๑S-๐๔ - Disชั่วคราวหน้า ร้านขายศาลพระ ภูมิ - Disชั่วคราวหน้า บ.อินธเร่า	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗๐๒๒๓๔
๒	SAC๐๖	๑	๑	๑	๑	Disชั่วคราว หน้า ป.ตท.(เงินพี)	- SF๖ ชั่วครา คลองสุต	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) แนว ถ.บ.ร.มาขาออก ตั้งแต่คลองสุต - บีม.ป.ตท.(เงินพี)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ท.ผ.บ. โทร. ๐๘๘-๘๘๑๘๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผ.จ.ก.ฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟท.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SAC1 จาก SACIS-01 ถึง SACIS-02

SACIS-02
SACIS-04
Dis ๖ ต. หน้าอินธเร่า

ในวันที่ 18 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1399/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SAC6 จาก Dis ๖ ต. หน้าอินธเร่า ถึง SF๖ ต. คลองสุต

ในวันที่ 18 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1399/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โมกขพันธ์..... ประสานงานการขอดับไฟกับ นายธีรวัช วงศ์อมร


อนุมัติ
 นายธีรวัช ธีรวัช
 ๖๕๓.๖ กทพ.๕๖๓.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กทบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. ๑๗๐.๕๗๕.
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิชชิง..... 3..... แผ่น
 แผ่นผังแนบ..... 1..... แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ.....(สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


 (นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนบรมราชชนนี (ขาออก) แยกศรีชอเทล - ปากทางสาย 6				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	เปลี่ยนสายแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1399/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	10 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
3	SAC01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
4	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
5	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
6	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
7	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
8	ย้ายโหลด SAC 1 ไปจ่ายจาก SAU 2						
9	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2
10	SAC01VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
11	SAC01S-01	สับ	ปลด		สพร.		- POT HEAD F.1
12	ย้ายโหลด SAC 6 ไปจ่ายจาก SAU 5						
13	SAC06S-05	ปลด	สับ		สพร.		SF6 โรงแรมศรีชอเทล
14	SF6 ชค. คลองสุคต	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 คลองสุคต
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.30 น						
16	DIS ชค. (SAC01)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า บ.อินทร์ (เก่า)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
17	DIS ชค. (SAC06)	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้า ปตท. (จีพี)
18	ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SAC1S-02 (ร้านไก่ย่าง) อยู่ตำแหน่ง "OPEN + LOCK คาน"						
19	ตรวจสอบสถานะ DIS ชั่วคราวหน้าร้านขายศาลพระภูมิ อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
20	ตรวจสอบสถานะ DIS รหัส SAC1S-04 (ไดโนเสาร์) อยู่ตำแหน่ง "OPEN"						
21	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจจุด G1						
22	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจจุด G2						
23	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจจุด G3						
24	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการทดสอบ, ข้อตรวจจุด G4						
25	หลังจาก กพอ.สพร. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
26	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กพอ.สพร. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
27	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
28	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
29	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
30	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
31	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
32	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
33	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
34	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
35	SAU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAU		- -
36	SAU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
37	SAU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAU		- -
38	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลดข้อตรวจจุด G1 ออก						
39	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลดข้อตรวจจุด G2 ออก						
40	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลดข้อตรวจจุด G3 ออก						
41	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลดข้อตรวจจุด G4 ออก						
42	หลังจาก กพอ.สพร. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
43	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
44	DIS ชค. (SAC01)	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้า บ.อินทร์ (เก่า)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
45	DIS ชค. (SAC06)	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้า ปตท. (จีพี)
46	ย้ายโหลด SAC 1 กลับจากจาก SAU 2						
47	SAC01S-01	ปลด	สับ		สพร.		- POT HEAD F.1
48	SAC01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
49	SAC01S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ซอยบางเตย 2
50	ย้ายโหลด SAC 6 กลับจาก SAU 5						
51	SF6 ชค. คลองสุคต	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 คลองสุคต
52	SAC06S-05	สับ	ปลด		สพร.		SF6 โรงแรมรีซอเทล
53	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
54	SAC01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
55	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
56	SAU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAU		- -
57	SAU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
58	SAU05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAU		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสายแรงสูงเป็น 185SAC

ถ.บรมฯขาออก ตั้งแต่แยกเข้ารัชชอเทล - ปตท.(จิบพี)

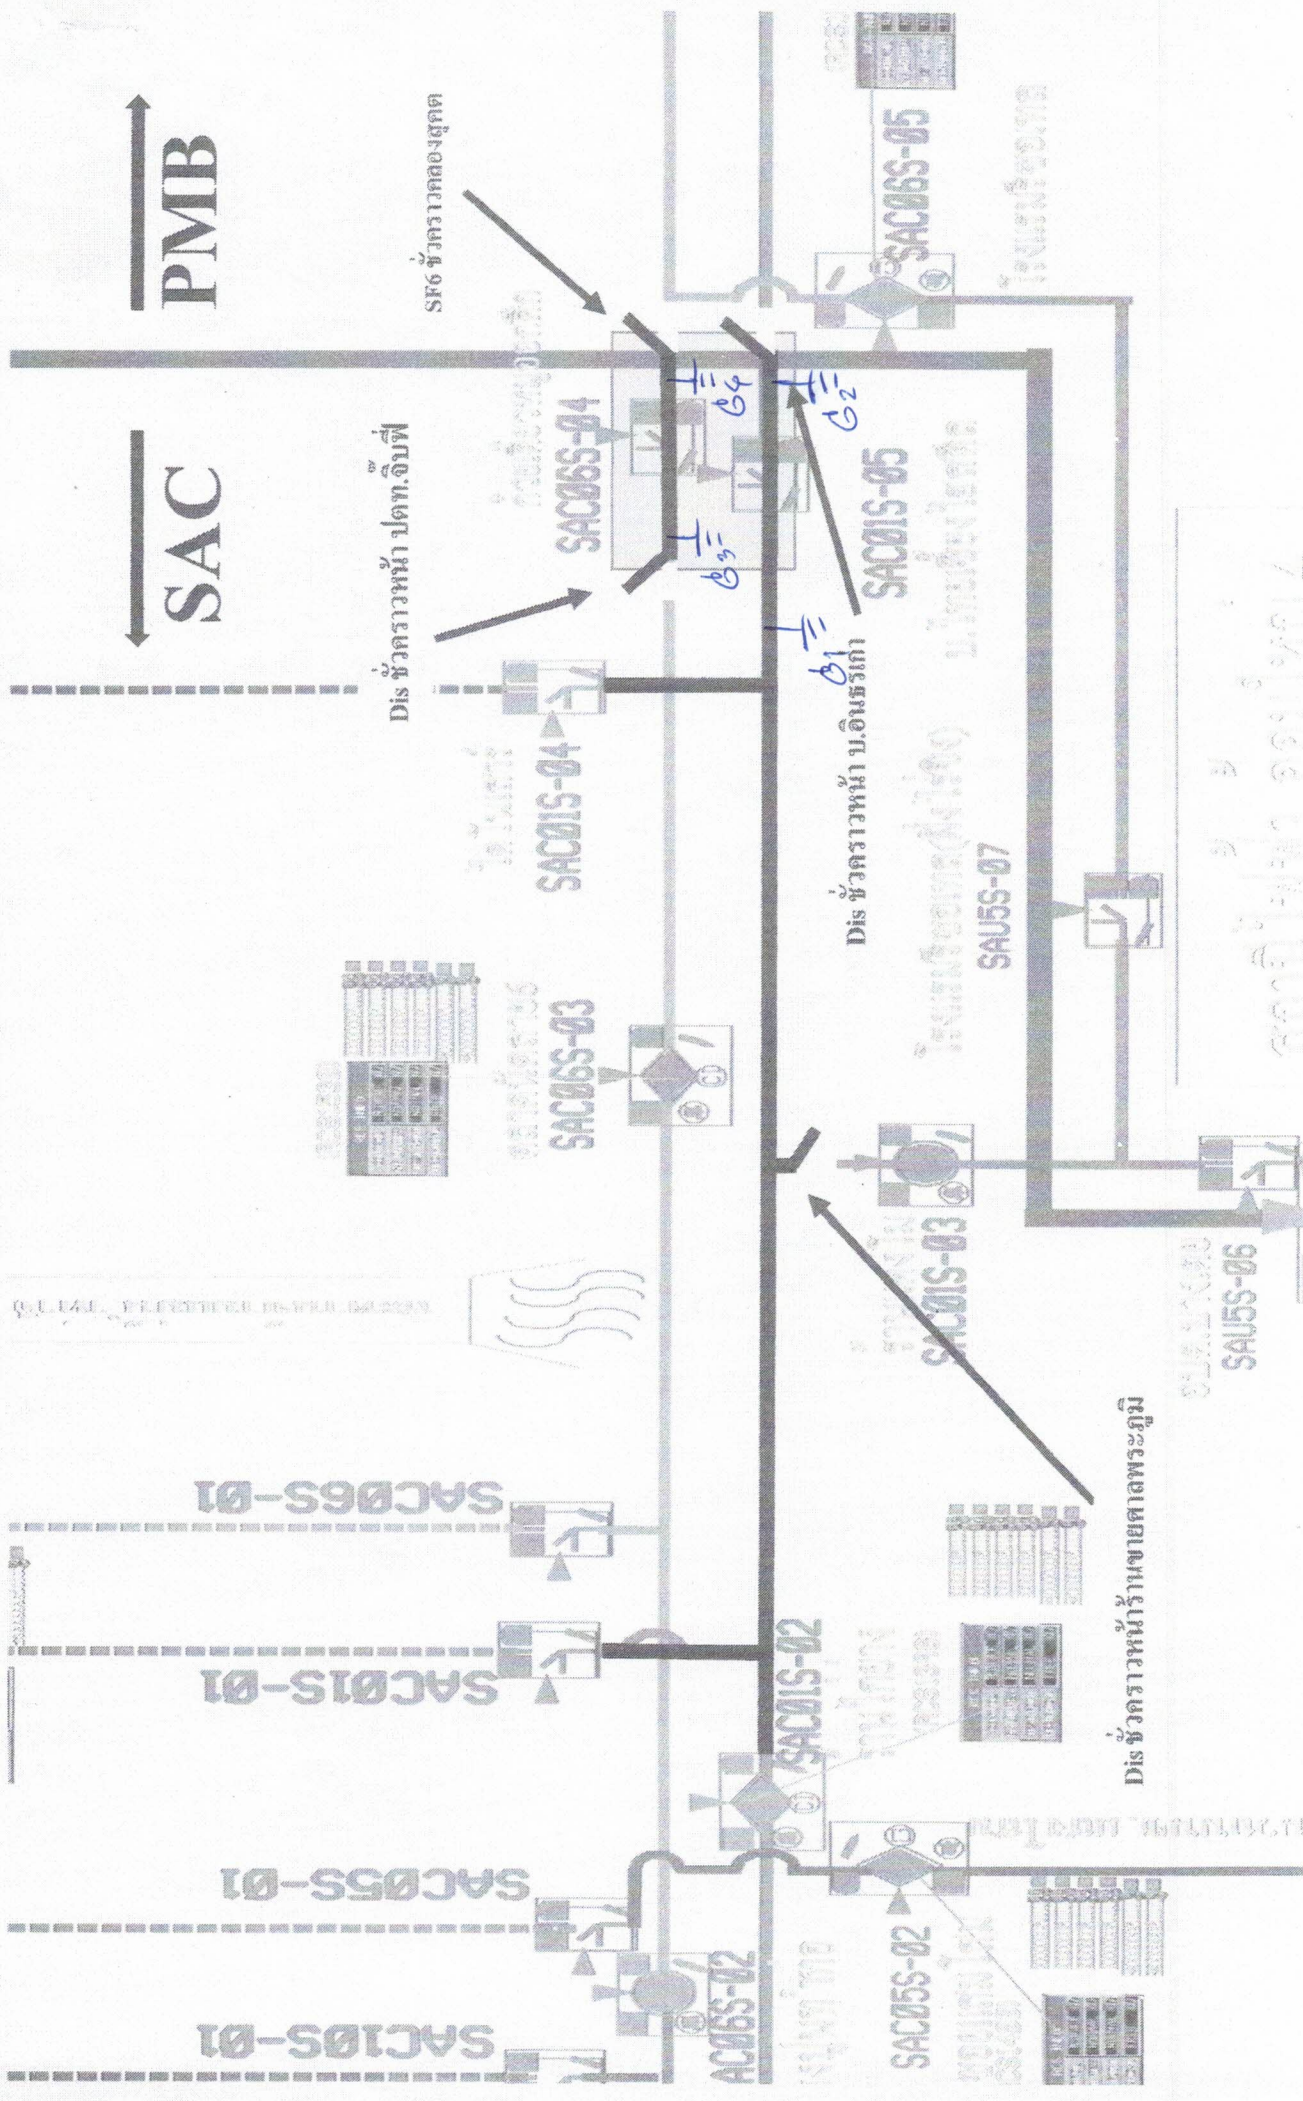

Dis ชั่วคราวหน้าบ้านเขยศาลพระภูมิ
