



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.อพ.(บพ.) ๖๐๔๔ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิสราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายนคร กว้างขวาง

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

ด้วยการไฟฟ้า กฟอ.อุททอง. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูงสถานีไฟฟ้า อุททอง ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๓ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	UTG06	๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณบ้านสะพาน	คิริบเอาท์ฟิวส์ รหัส UTG๐๖F-๒๐	SF๖ ชั่วคราว คันคลองดอนมะเกลือ	นายจกมล โพธิกุล ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง ๐๘๕-๒๖๖๘๔๑๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบไฟดับ ม.๑๖,๗,๑๐ ต.สะพาน อ.อุททอง จ.สุพรรณบุรี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจกมล โพธิกุล ตำแหน่ง ชม.ปบ.กฟอ.อุททอง โทร ๐๘๕-๒๖๖๘๔๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนคร กว้างขวาง)

ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.อุททอง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ UTG06 จาก D/F UTG 6F-20 ถึง UTG 6F-27

ในวันที่ 15 ธ.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1989/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจกมล โพธิกุล

(นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง
๒๓.๑.๖๕ โทร ๐๖.๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.อุท., กฟภ. สขข.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระพังลาน (UTG06)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ธ.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ. อทง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1989/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	14 ธันวาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	14 ธันวาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
3	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
4	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนไปรับไฟจาก SPO03 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	UTG06F-20	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อทง.	D/F	ไลน์บ้านสระพังลาน
6	UTG06F-27	สับ	ปลด		อทง.	D/F	กลางไลน์บ้านสระพังลาน
7	SF6 ไลน์ SPO03	ปลด	สับ		อทง.	SF6	ชั่วคราว คั่นคลองดอนมะเกลือ
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ. อุทอง ทราบ						
9	แจ้ง กฟอ. อุทอง ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
10	แจ้ง กฟอ. อุทอง ทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
11	หลังจาก กฟอ. อุทอง ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
13	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
14	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
15	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
16	แจ้ง กฟอ. อุทอง ทำการปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้ง กฟอ. อุทอง ทำการปลด Short Ground จุด G2						
18	หลังจาก กฟอ. อุทอง ทำการปลด Short Ground ออกครบทุกจุด พร้อมยืนยันใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
19	UTG06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG	-	-
20	SPO03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
21	ย้ายโหลด UTG06 บางส่วนกลับจาก SPO03 (ดับไฟย้ายโหลด)						
22	SF6 ไลน์ SPO03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อทง.	SF6	ชั่วคราว คั่นคลองดอนมะเกลือ
23	UTG06F-27	ปลด	สับ		อทง.	D/F	กลางไลน์บ้านสระพังลาน
24	UTG06F-20	ปลด	สับ		อทง.	D/F	ไลน์บ้านสระพังลาน
25	UTG06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG	-	-
26	SPO03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพน.	R	บ้านหัวสะพาน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							


สถานะจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

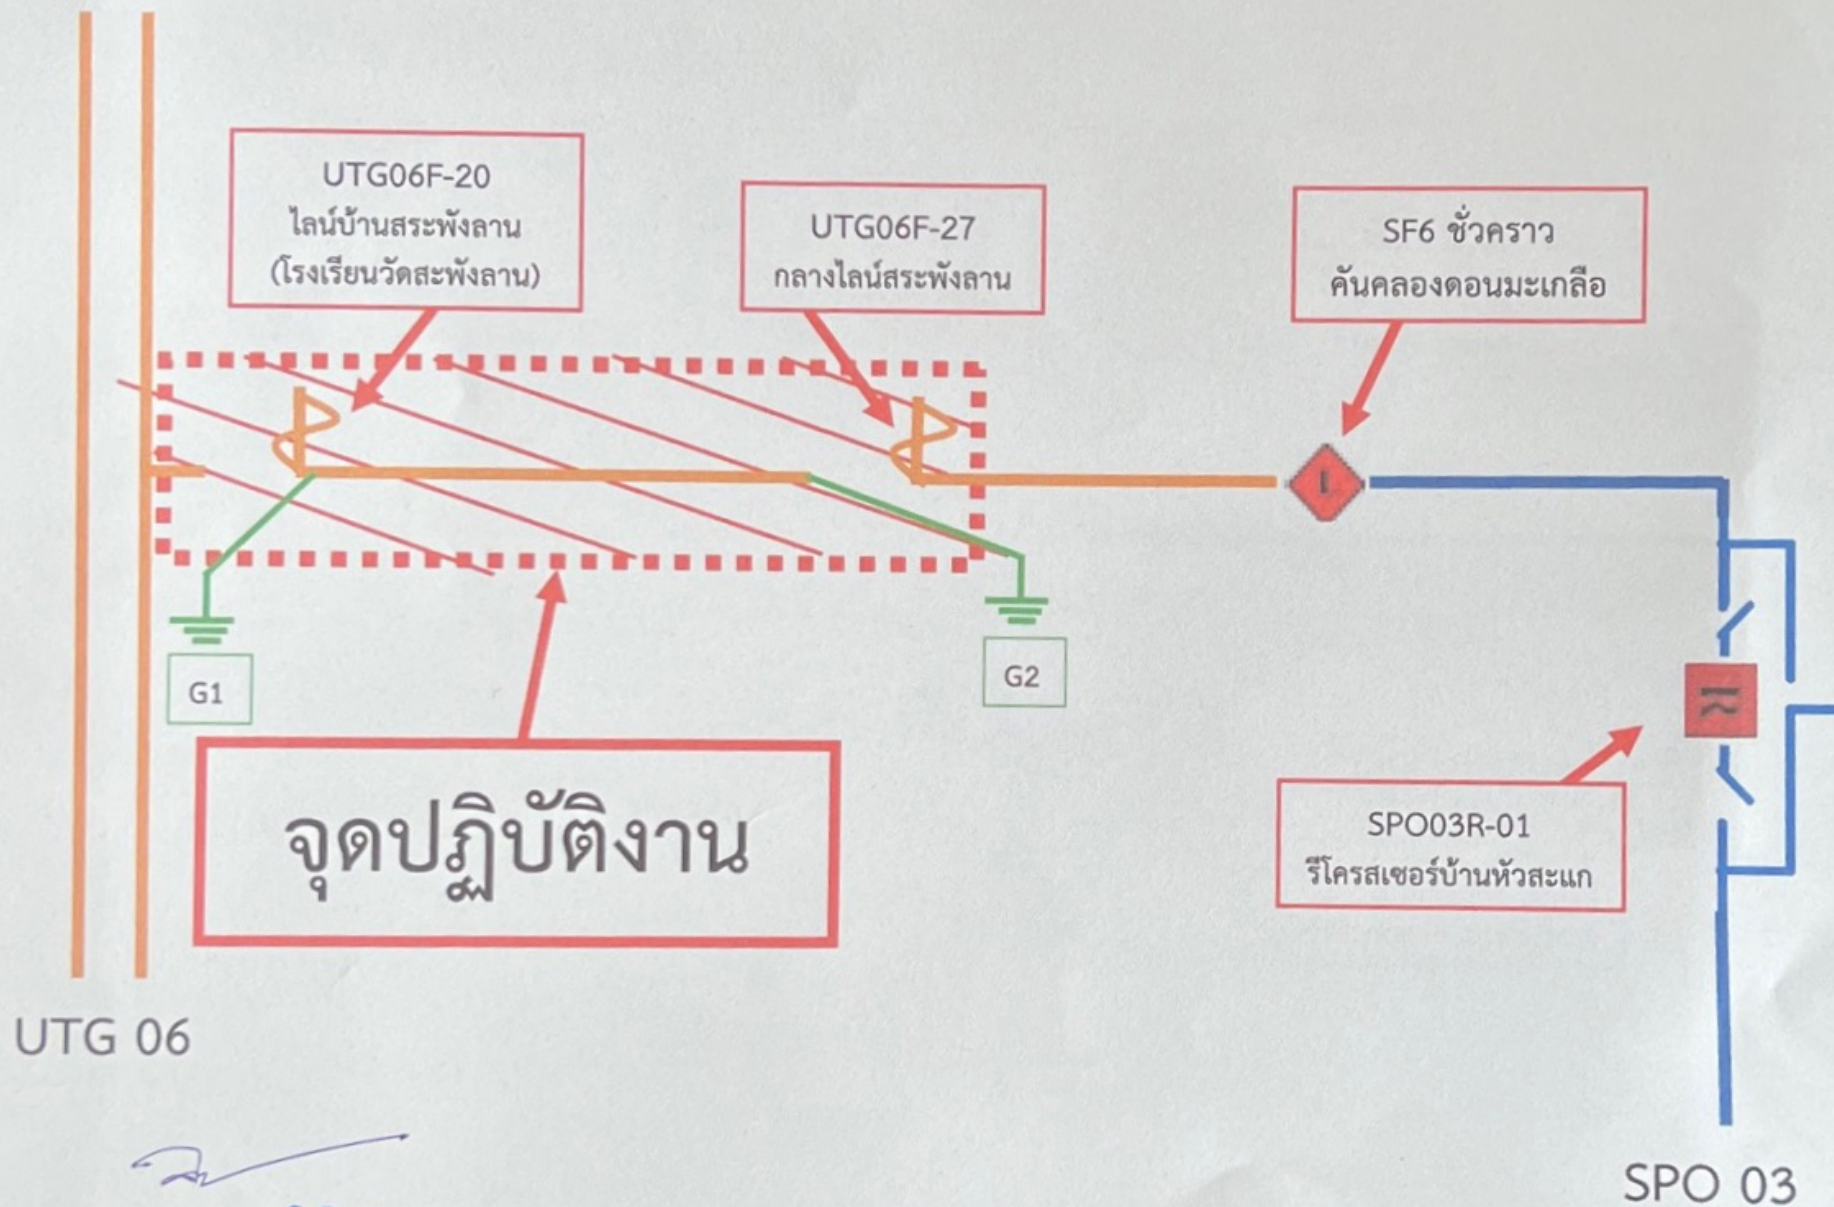


นายจกกล โทธิกุล
ชม.ปบ. กฟอ.อุ้มทอง

สถานะจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

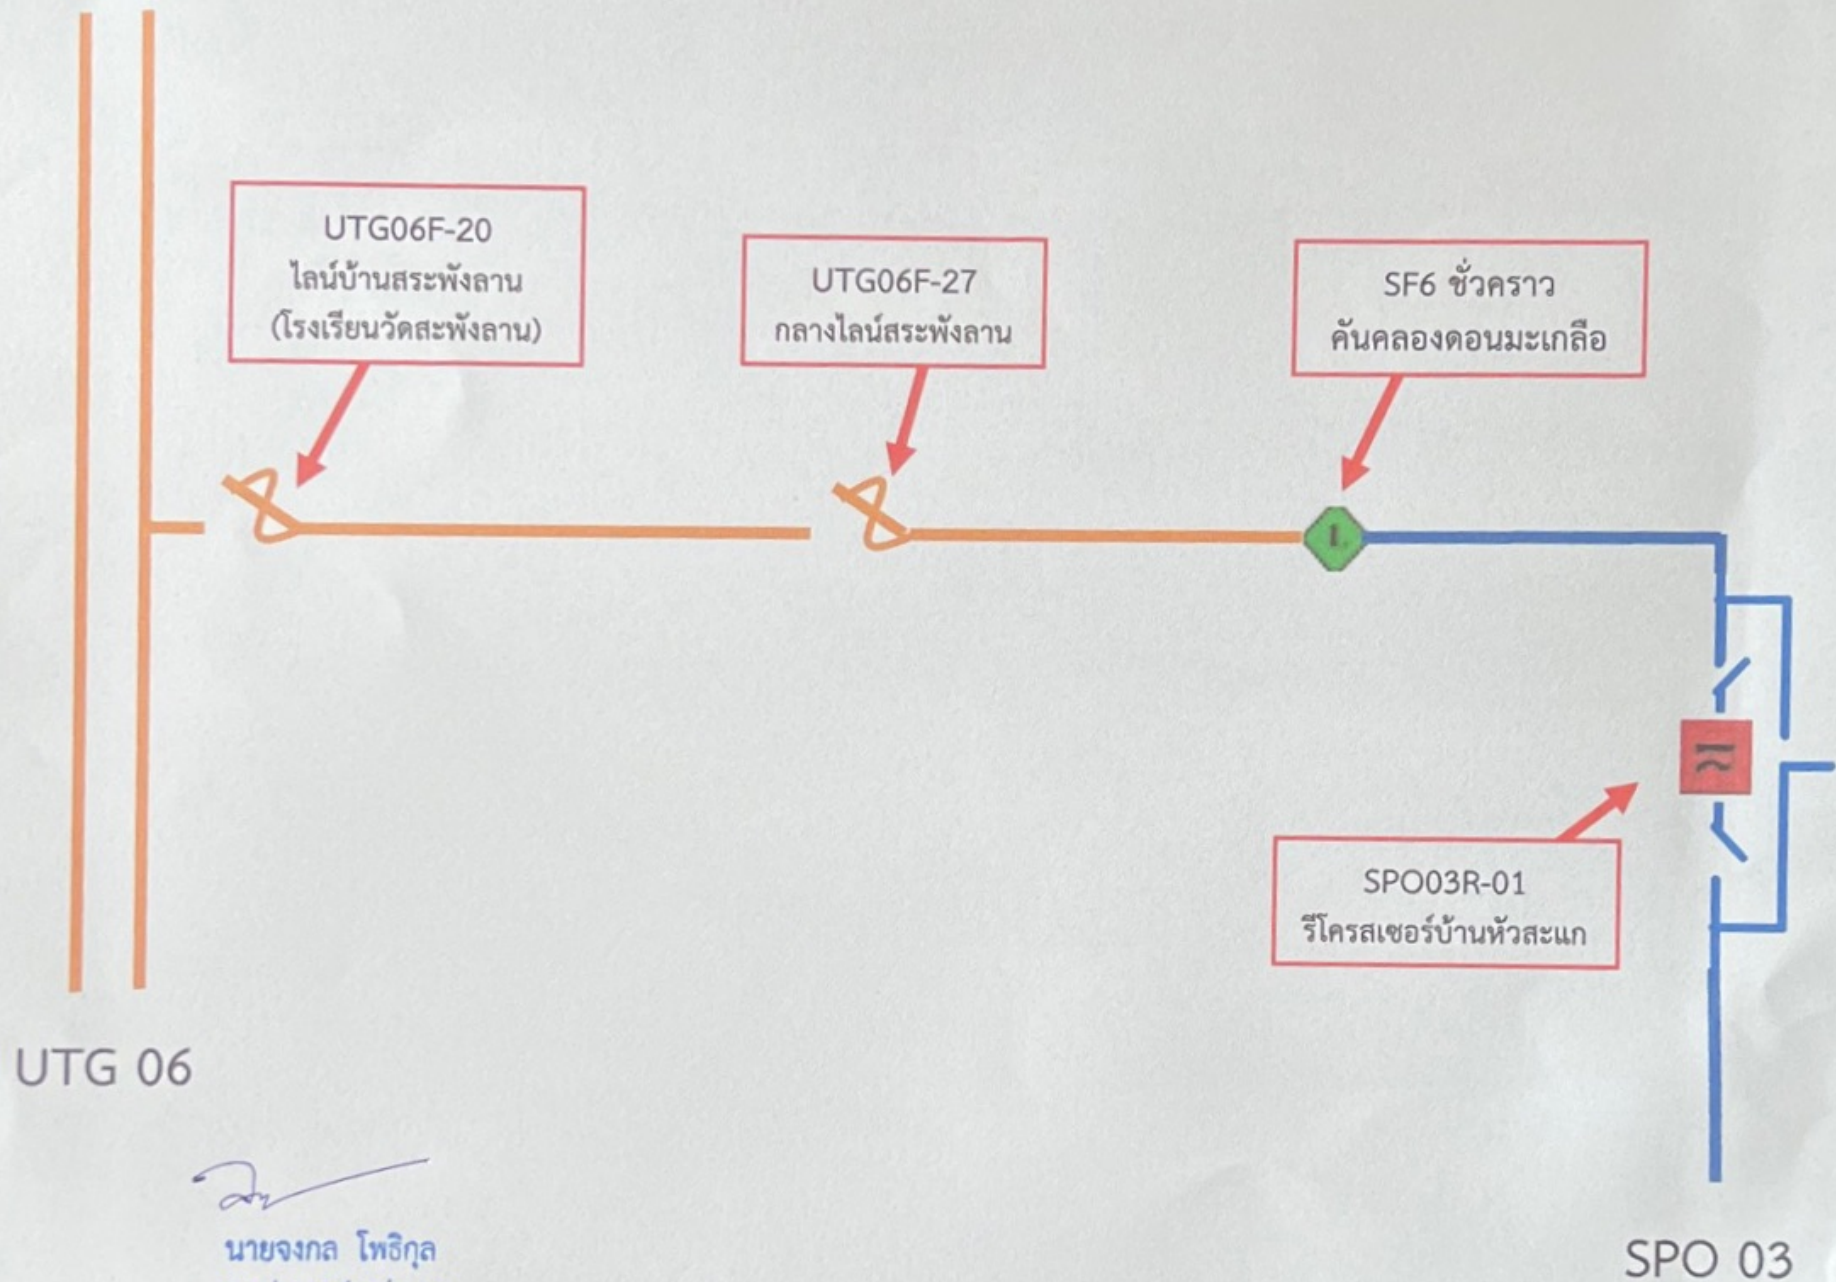


นายจกกล โทธิกุล
ชม.ปบ. กฟอ.อุ้มทอง



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แบบตรวจสอบหาจุดอันตรายในการปฏิบัติงาน
(Job Hazard Plan)

วัน/เดือน/ปี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

งานที่ปฏิบัติ ย้ายโหลดเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ บริเวณบ้านสระพังลาน

สถานที่ บริเวณบ้านสระพังลาน

ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัย

มี	ไม่มี		เพียงพอ	ไม่เพียงพอ	หมายเหตุ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Voltage Detector.....๒.....ตัว	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ชุดต่อสายลงดิน.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	กรวยยาง.....๔๐.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายกันทางเดือนอันตราย.....๒.....ชุด	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ป้ายแขวนห้ามสับสวิตช์.....๔.....อัน	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	อื่นๆ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

อันตรายที่ตรวจสอบ	วิธีควบคุม / ป้องกัน	หมายเหตุ
๑. จุดที่ปฏิบัติงานอยู่ติดกับถนนหลวง	- ก่อนเริ่มปฏิบัติงานให้มีการ ตั้งป้าย วางกรวยยางบริเวณรอบๆจุดปฏิบัติงาน	
๒. สายเคเบิลโทรศัพท์	- ใช้ความระมัดระวัง ในการขึ้นปฏิบัติงาน	
๓. อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE)	- ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ PPE ให้ครบถ้วน	
๔. ระบบไฟฟ้าแรงสูง ระบบ ๑๑๕ เควี และระบบ ๒๒ เควี	- ก่อนปฏิบัติงาน ให้ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ด้วย Voltage Detector - ให้ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงาน	

เรียน ผจก.กฟอ.อุทอง

เพื่อโปรดทราบและ

ดำเนินการต่อไป

นายจกกล โพธิกุล
(ผู้ควบคุมงาน)

แบบฟอร์มนี้ให้เก็บเข้าแฟ้มงาน
