



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
วันที่ 26 ส.ค.65

เลขที่ ก.๓.กฟส.อบ.บม.(กป.)- ๑๑๒๐ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ...สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพิพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.บางปลาม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อบ.บม.บางปลาม้า... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไข เสาแรงสูงชำรุด บริเวณแยกตลาดบ้านสุด ตามแผนผังสังเขปแนบ
จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	FO6 บางปลาม้า	๒๕ ส.ค.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	เปลี่ยนเสาแรงสูงชำรุด ต้น DDE บริเวณแยกไฟกองดิน	หน้าตลาด บ้านสุด DDE	บ้านบ่อสาย	นายวีระพงษ์ ละอ เอียด โทร 097- 2127429

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายประทุม พันธุ์เรือง...ตำแหน่ง... ผ.จก.กฟส.อ.บางปลาม้า...โทร...๐๘๙-๕๓๖-๘๗๗๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.คส.ภ.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพิพัฒน์ สุวรรณอักษรเขตฯ.)

ตำแหน่ง... ผ.จก.กฟส.อ.บางปลาม้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (สคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ 8AMB จาก DDE-ทวงเค็มพรอ ถึง ปอ.บ.บ.บ (บึงบ่อหลวง-ไฟทองดำ)
ในวันที่ ๒๕ ส.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1413/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อธิษฐ์ อธิษฐ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายประทีป พันธ์ 1500

นายปองทพร พงษ์ ๑๕๐๐.๑๖๖๖.๐๖๖

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟส.อบ.บม.
อ.ก.บ.บ.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน

ผ.จฟ. - (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไลน์ BAM06 บริเวณ DDE.ตลาดบ้านสุด - ปลายสาย(บ้านบ่อสวาย-ไม่กองดิน)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 29 ส.ค. 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บปม. งานที่ทำ เปลี่ยนเสาแรงสูงชำรุด ตามใบขอปฏิบัติงาน 1413/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 25 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 25 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
- นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	BAM06R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		รถบปม-	SCADA RE	บ้านองค์รักษ์
3	- ดับไฟไลน์ BAM06 เวลา 08.00 น.						
4	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.(โหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย,BAM06FS-01)						
5	หลังจากกฟส.บางปลาแม่น้ำทำการปลดโหลดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.(โหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย,BAM06FS-01)เสร็จ						
6	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BAM06 บริเวณตลาดบ้านสุดออกทั้งสามเฟส						
7	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการตัด DDE.ไลน์ BAM06 บริเวณตลาดบ้านสุดออกทั้งสามเฟสเรียบร้อย						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.บางปลาแม่น้ำรับทราบ						
9	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
10	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำ Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
13	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบปม-	SCADA RE	บ้านองค์รักษ์
	%%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%%%%						
14	หลังจากกฟส.บางปลาแม่น้ำปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
15	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
16	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
17	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
18	- จ่ายไฟไลน์ BAM06						
19	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BAM06 บริเวณตลาดบ้านสุดเข้าทั้งสามเฟส						
20	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัม DDE.ไลน์ BAM06 บริเวณตลาดบ้านสุดเข้าทั้งสามเฟสเรียบร้อย						
21	แจ้งกฟส.บางปลาแม่น้ำนำโหลดเข้าทั้งหมด(โหลดหม้อแปลงในระบบจำหน่าย,BAM06FS-01)เสร็จ						
22	BAM06R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		รถบปม-	SCADA RE	บ้านองค์รักษ์
	%%%%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%%%%						

แผนผังดับไฟวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

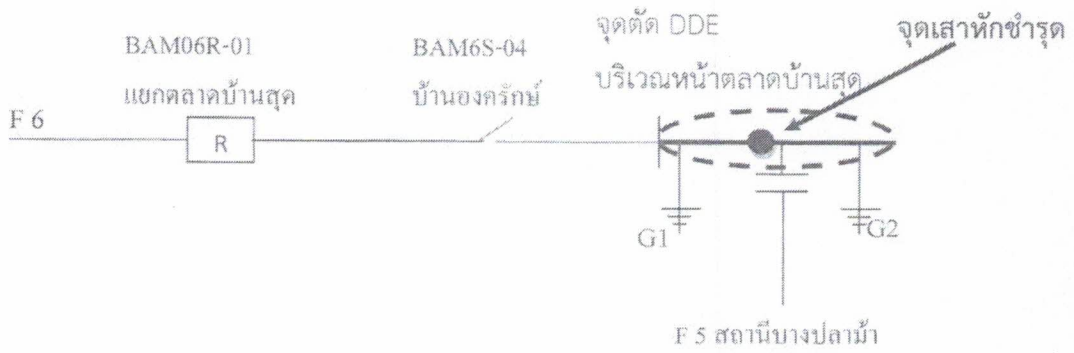

หมายเหตุ

- ปลด โหลดด้านหลังต้นเสาหักออกทั้งหมด
- ซอทไลน์กระเช้า สพ. ตัด DDE บริเวณหน้าตลาดบ้านสุด

คอเสาหักชำรุด

