



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟจ.สค.๒(บพ) ๐๔๐๑/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.สค.๒(บพว) จะขอตัดไฟระบบจำหน่าย ๒๒ kV วงจรที่ ๐๔ และ ๐๔ สถานีบ้านแพ้ว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าสถานีสามพราน ๕ (ชั่วคราว) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑๑ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BNP ๐๔	วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ ก.ย. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ kV บริเวณหน้า สฟพ.สามพราน ๕ (ชั่วคราว)	Dis รั้นศรีเรือน BNP๔S-๑๖	SF๖ ตรงข้ามฟุตส์สตาร์ BNP๔S-๑๗	นายภัทรวิทย์ ศิริภูพานันท์ พงษ์ ๗ ผจก.กคค.(ก๓) โทร ๐๘๑-๑๔๘๑๕๖๐๑
๒.	BNP ๐๔					จุดเปิด DDE ปากซอยสิงขร (ข้าง สฟพ. สามพราน ๕)	SF๖ ตรงข้ามฟุตส์สตาร์ BNP๔S-๐๘	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ริมถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน ต.ตลาดจินดา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอรรถนันท์ บัวสงค์ ตำแหน่ง ช.ผ.ป.บ. โทร ๐๘๖๖-๓๖๓๓๑๐๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.สค.๒(บพว)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

BNP 4

Dis BNP4S-16

SF6 BNP4S-17

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พิดเตอร์ BNP4 จาก จุด DDE ปากซอยสิงขร ถึง SF6 BNP4S-08

ในวันที่ 28 ก.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1414/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิศยา พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายอรรถนันท์ บัวสงค์

21 ก.ย. 66

(นางสาวพิศยา พงษ์ศิริ)  
ส.ก. 5 ท.ก.ช.ผ. ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(ค.พ.)

เรียน ผจก. กฟจ. สค. 2 (บพว)

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จ.บ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผน  
แผนผังแนบ 1 แผน


ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีฯ สามพราน5 (BNP5,BNP9)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ก.ย. 66	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สก2.(บพว.) งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1414/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชยา พงษ์ศิริ		วันที่ 23 กันยายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กันยายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กันยายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสวาทพร, นายจรัสวัฒน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโชน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
4	ตรวจสอบ DIS รัานครีเรือน รหัส BNP04S-16 อยู่สถานะ Open						
5	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP04S-17 อยู่สถานะ Open แล้วให้ทำการล๊อคคาน						
6	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP09S-08 อยู่สถานะ Open แล้วให้ทำการล๊อคคาน						
7	แจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการตัด DDE บริเวณปากขอยสิงขร (BNP09 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) แบบมีไฟ						
8	เมื่อชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการตัด DDE บริเวณปากขอยสิงขร (BNP09 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) แล้วเสร็จ						
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.สก2.(บพว.) ทราบ						
10	แจ้งให้ กฟจ.สก2.(บพว.) ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
11	แจ้งให้ กฟจ.สก2.(บพว.) ทำการช็อดกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
12	แจ้งให้ชุด กฟจ.สก2.(บพว.) ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
13	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	เมื่อ กฟจ.สก2.(บพว.) ทำงานเสร็จพร้อมจ่ายไฟคืน						
15	BNP09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BNP		
16	แจ้งให้ กฟจ.สก2.(บพว.) ทำการปลดช็อดกราวด์จุด G1,G2,G3,G4						
17	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP04S-17 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
18	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามฟูดสตาร์ รหัส BNP09S-08 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
19	แจ้งชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการเชื่อม DDE ปากขอยสิงขร แบบมีไฟ						
20	เมื่อชุดฮอทไลน์ 22kV ทำการเชื่อม DDE ปากขอยสิงขรแล้วเสร็จ						
21	BNP09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BNP		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Single Line Diagram แสดงพื้นที่ที่ไฟฟ้าพร้อมระบบจุด Short Ground หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

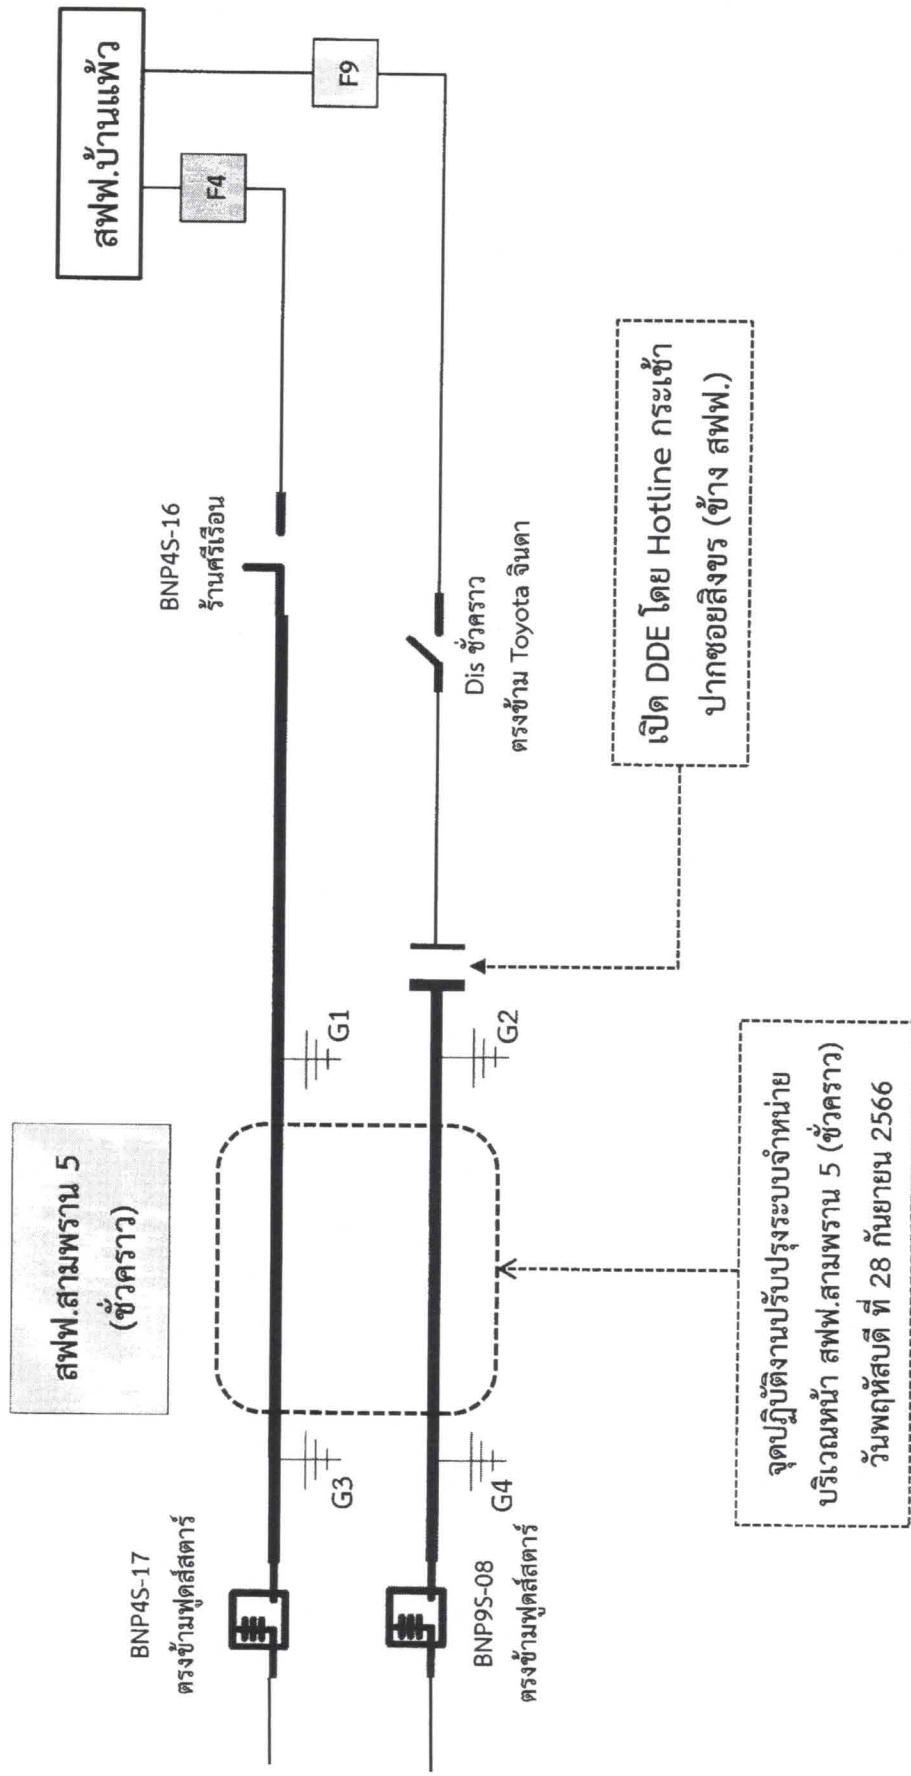

เส้นที่บแสดงพื้นที่ดับไฟ

ตำแหน่งจุด Short Ground
