



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายพฤษพงศ์ กาหลง

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเดอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า
เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
ก.	DBA2	๓ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟพาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสาย)	DIS ชั่วคราว บางแอก	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖
ข.	DBA2	๔ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ส่ง ๑๕๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๑	DIS ชั่วคราว บ้านทิง	DIS ชั่วคราว โรงปูนเส็งพานิช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๐๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ราย (วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗)
หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๓๖๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย (วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรเทัญ ตำแหน่ง ขณ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ดับไฟ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๘๔๗๘, ๑๐๐.๐๘๓๔๗๗

สิ้นสุด ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

สิ้นสุด ๑๔.๗๖๘๖๖๗, ๑๐๐.๐๙๒๔๙๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DBA2 จาก DIS ชั่ว คราว ถึง

ในวันที่ 3 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1415/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุริยชัย เข้มเพ็ชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทรเทัญ
29 ก.ย. 67

(นายพฤษพงศ์ กาหลง)
ผจก. กฟส.อ.สามชุก

นายพฤษพงศ์ กาหลง
ผจก.กฟส.อ.สามชุก
P.๑๖ ช.๒ บ้านทิง

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.-สว

อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง.....๔.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจฟ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บางแวก ถึง บ้านทิ่ง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สข.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1415/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีระวัชร เสมามิ่ง		วันที่ 27 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 27 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, น.ส.สุกษชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สข.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง. สามชุก
6	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	ชค. วัดบางแวก
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สข.	DIS	ชค. บ้านทิ่ง
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<u>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</u>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
23	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชค. บ้านทิ่ง
24	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก DBA03							
25	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชค. วัดบางแวก
26	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง. สามชุก
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
<u>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</u>								

ดับไฟพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)

บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย

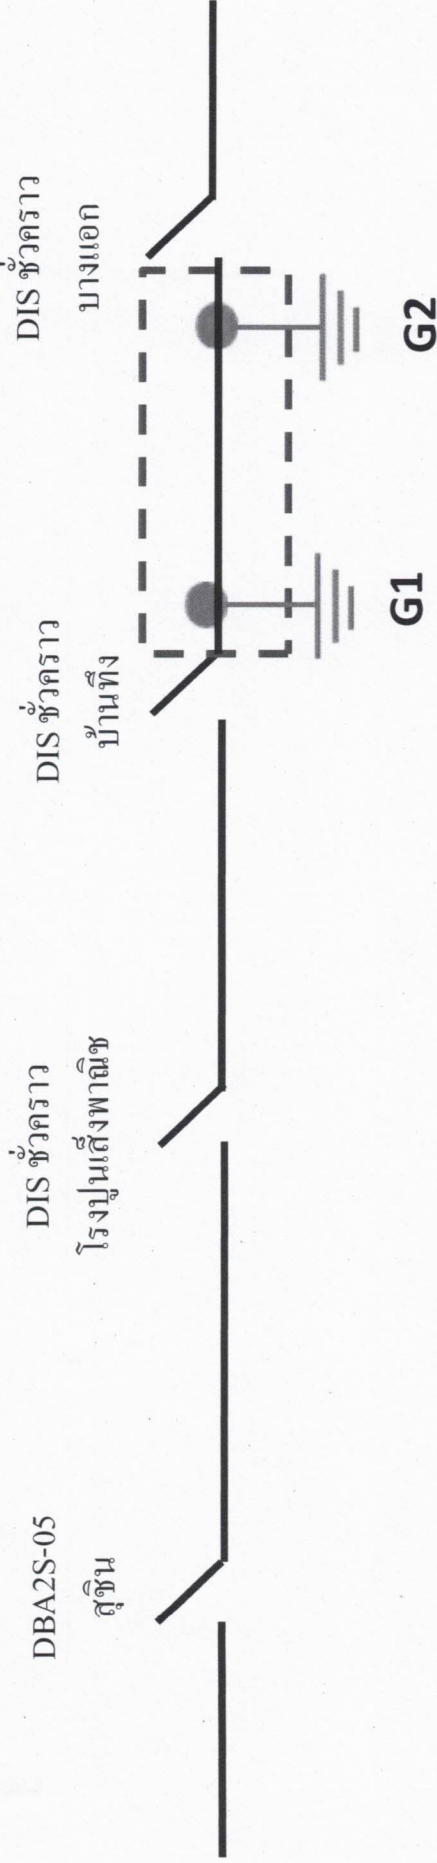
วันที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกป.กฟส.สามชุก

ผู้ขอตรวจจุด G2

นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผกป.กฟส.สามชุก



ไปศรีประจันต์



ไปเดิมบางนางบวช

ดับไฟพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)
บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย
ช่วงที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ขอตรวจวัดจุด G1
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกบ.กฟส.สามชุก
ผู้ขอตรวจวัดจุด G2
นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผกบ.กฟส.สามชุก

