



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ สข.(กป.) /๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
 ชื่อผู้ส่ง นายพฤษพงศ์ กาหลง ตำแหน่ง ผจก.กฟส.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สามชุก จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย ฟีดเตอร์ ๒ สถานีไฟฟ้า  
 เดิมบางฯ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
ก.	DBA2	๓ ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟขาดสายและตัดอุปกรณ์ งานก่อสร้างปรับปรุงระบบ จำหน่าย ๒๒ เควี (ใต้แนวสาย ส่ง ๑๑๕ เควี) บริเวณจุดแบ่ง แดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ ๑	DIS ชั่วคราว บางแอก	DIS ชั่วคราว บ้านตั้ง	นายณัฐพงษ์ เข้มเพชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖
ข.	DBA2	15 ต.ค. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.		DIS ชั่วคราว วัดบางแอก	DIS ชั่วคราว โรงปูนเสิงพานิช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑ เครื่อง ๑๐๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๕๐ ราย (วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗)  
 หม้อแปลง ๕ เครื่อง ๓๖๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๐๐ ราย (วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทร์เพ็ญ ตำแหน่ง ขณ.กป โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๐๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ วันที่ ๓ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๘๔๗๘, ๑๐๐.๐๙๓๙๗๗

สิ้นสุด ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๗

เริ่มต้น ๑๔.๗๘๓๑๕๙, ๑๐๐.๐๘๘๔๘๓

สิ้นสุด ๑๔.๗๖๘๖๖๗, ๑๐๐.๐๙๒๔๙๓

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ DBA02 จาก DIS ช.วัดบางแอก ถึง DIS ช.โรงปูนเสิงพานิช

ในวันที่ 4 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1416/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเตอร์... จาก... ถึง...

ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวีวัฒน์ อภิวัณนิก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย เทอดไทย จันทร์เพ็ญ

29 ก.ย. 67

(นาย จิรวีวัฒน์ อภิวัณนิก )

จตก.5 ๒๓๖ ขณ.คป.

นายพฤษพงศ์ กาหลง  
 ผจก.กฟส.อ.สามชุก  
 DIS ช.โรงปูนเสิงพานิช

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ. ลจ.

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจฟ. - (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานบางขวางฝั่งซ้าย ช่วงที่ 1 - จุดแบ่งแดน ดบ.-สช.					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	พาดสายและติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1416/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก			วันที่	28 กันยายน 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	28 กันยายน 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภักดิ์, น.ส.สุภัสษา, นายขุนทอง, นายศุภศิทธิ, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนัส 3. นายจิรวุฒิ, นายวิวัฒนา, นายพิชชา, นายวีระวัชร, นายอมร				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
3	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
4	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DBA03						
5	DBA02S-06	ปลด	สับ		สช.	SCADA	SF6 ตรงข้าม สนง. สามชุก
6	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. โรงบุนเสิ่งพาวนิชย์
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
8	DIS ชค. DBA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.	DIS	ชค. วัดบางแวก
9	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE						
13	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
14	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA	-	
15	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงแรก</b>							
17	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ลงข้อมูลใน WE SAFE เสร็จเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับ						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
19	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
20	DBA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
21	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA	-	
22	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
23	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.	DIS	ชค. วัดบางแวก

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	ย้ายโหลด DBA02 บางส่วน กลับจาก DBA03							
25	DIS ชค. DBA02	ปลด	สับ		สช.		DIS	ชค. โรงปูนเสิ่งพาณิชย์
26	DBA02S-06	สับ	ปลด		สช.	SCADA	SF6	ตรงข้าม สนง. สามชุก
27	DBA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
28	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-	
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>								

### ดับไฟพาดสายและติดตั้งอุปกรณ์


งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)  
บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย  
ช่วงที่ 1 วันที่ 3 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ขอตรวจจุด G1

นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกบ.กฟส.สามชุก

ผู้ขอตรวจจุด G2

นาย ปิณนัทธ์ เทพบุตร พง.5 ผกบ.กฟส.สามชุก

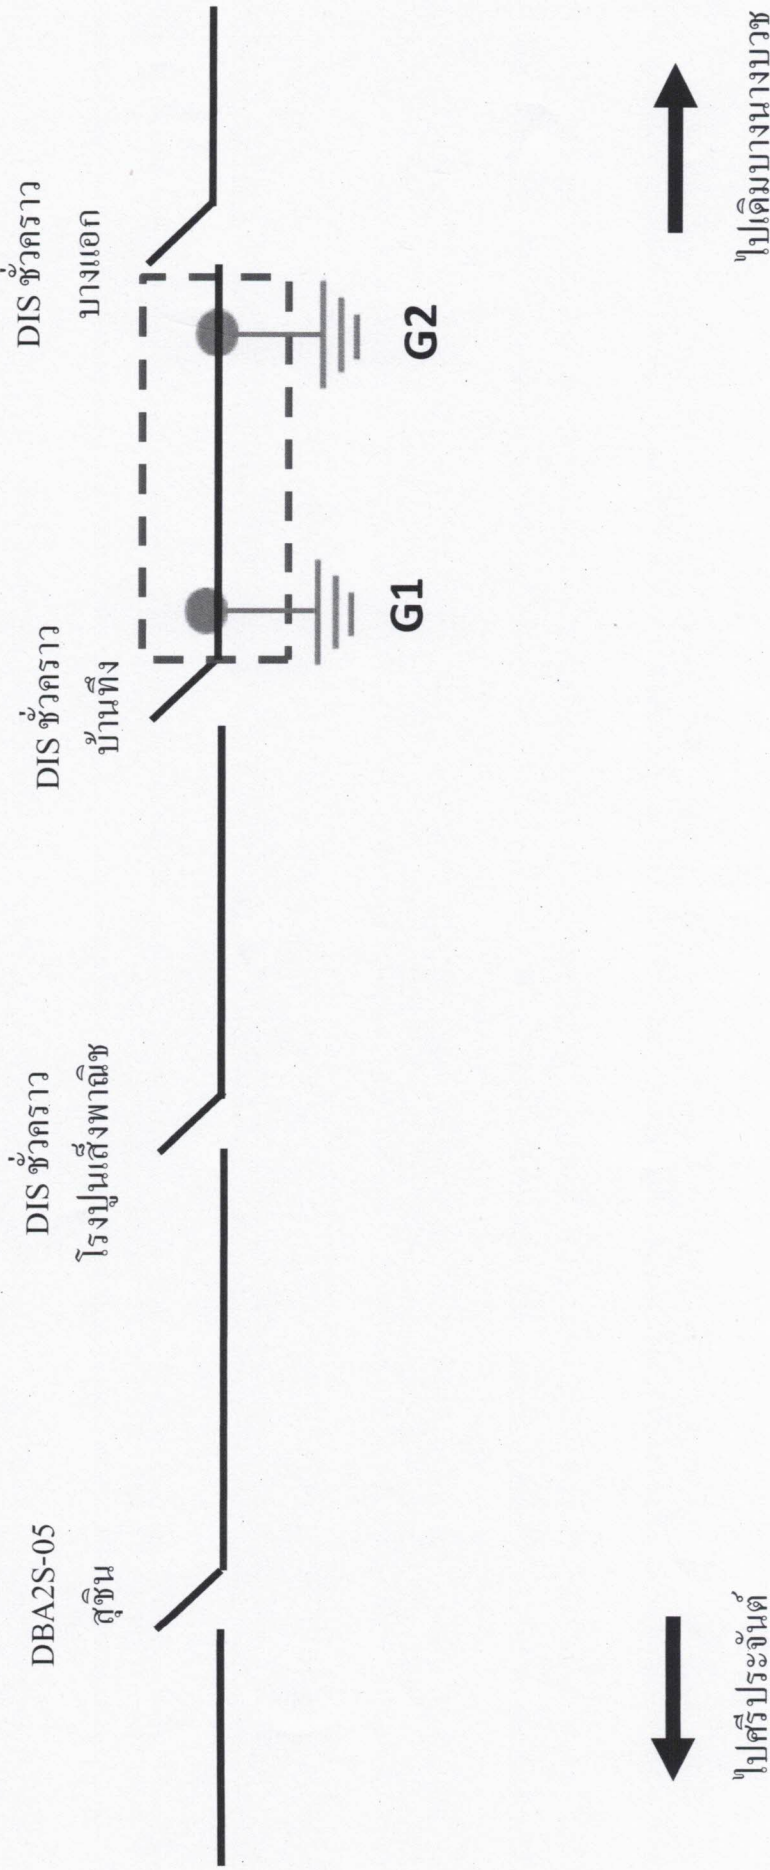

### ดับไฟฟาดสายและติดตั้งอุปกรณ์

งานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี (ใต้แนวสายส่ง 115 เควี)  
บริเวณจุดแบ่งแดนเดิมบาง - สามชุก ถึง สะพานบางขวางฝั่งซ้าย  
ช่วงที่ 1 วันที่ 4 ตุลาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 17.30 น.

ผู้ซื้อตราจุด G1  
นายภูวนัย ทิมหอม พง.4 ผกบ.กฟส.สามชุก  
ผู้ซื้อตราจุด G2  
นาย ปิณณทัต เทพบุตร พง.5 ผกบ.กฟส.สามชุก

