



# วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(บป) ๐๐๑๙ /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง  
ชื่อผู้ส่ง รศช. กฤษี สีโสด  
จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.บป.(ก๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน  
ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอตัดบ่อนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อการปฏิบัติงาน สับเปลี่ยน SF๖  
บ้านยางสูง รหัส BOP๑๐S-๐๖

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒(ชั่วคราว) ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/ เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	พิดเตอร์ขอ สถานีบ่อ พลอย๑	๖ก.ย. ๖๕	๐๙.๓๐ น.	๑๒.๐๐ น.	สับเปลี่ยน SF๖บ้านยาง สูง รหัส BOP๑๐S- ๐๖	SF๖บ้าน ยางสูง รหัส BOP๑๐S- ๐๖	SF๖บ้านยางสูง รหัส BOP๑๐S- ๐๖	นายประพัทธ์ เพชร วิโรจน์ชัย โทร.๐๘๕-๗๒๗- ๗๘๒๑

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบัญชา เขาวัว ..... ตำแหน่ง พชง.๖ ..... โทร.๐๘๘-๘๒๗๕๕๖๙

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายประพัทธ์ เพชรวิโรจน์ชัย ..... ตำแหน่ง พชง.๖ ..... โทร.๐๘๕-๗๒๗-๗๘๒๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบ  
ก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด  ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ

(นายสุธี ศรีนวล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

  
๒๖.๘.๖๕

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ ๒๐๑๐ จาก BOP 103-06 ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ 6 กย ๖5 ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึง 12-๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1419/2565


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ พัดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
 ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย พดวิรินทร์ อังสันทิน ประสานงานขอดับไฟกับ นาย วัลลภ ธรรมวิ

  
 (นายพดวิรินทร์ อังสันทิน)  
 วตท. 6 1๓๓ พ.พ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. มทอ. ยพค., มทอ. นพร.

อก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 1 แผ่น

แผ่นผังแนบ 2 แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ผจฟ. .... (สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
 ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไปจนกว่างาน  
 จะแล้วเสร็จ

  
 (นายเลอหงส์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BOP10S-06 ร้านขายยาบ้านยางสูง
2. กำหนดวันที่ทำงาน 6 ก.ย. 65 ระหว่าง 09.30 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บพล. งานที่ทำ เปลี่ยน SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1419/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวศิน วันที่ 27 สิงหาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 สิงหาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 สิงหาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BOP	-	-
3	BOP05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	
4	BOP10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOP	-	
5	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
6	BOP04R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
7	<b>**ย้ายโหลด BOP10 บางส่วนไปรับไฟจาก BOP04**</b>						
8	BOP04S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพล.	SF <sub>6</sub>	สะพานบ้านยางสูง
9	BOP10S-06	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.	SF <sub>6</sub>	ร้านขายยาบ้านยางสูง (ล่าง)
10	แจ้งการจ่ายไฟให้ กฟอ.บพล. รับทราบ พร้อมทั้งให้ตั้ง Manual ไว้ตลอดการทำงาน						
11	หลังจากทำการลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
13	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
14	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยันใน WeSafe พร้อมทั้งตรวจสอบ BOP10S-06 สถานะ OFF+ล็อคคาน						
15	BOP04R-01	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
16	เมื่อพร้อมรับไฟ						
17	<b>**ย้ายโหลด BOP10 บางส่วนกลับจาก BOP04**</b>						
18	BOP10S-06	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		บพล.	SF <sub>6</sub>	ร้านขายยาบ้านยางสูง (ล่าง)
19	BOP04S-08	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		บพล.	SF <sub>6</sub>	สะพานบ้านยางสูง
20	BOP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BOP	-	-
21	BOP05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	
22	BOP10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOP	-	
23	BOP04R-01	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
24	BOP04R-01	Nonreclosing	Normal		บพล.	R	AVR. บ้านยางสูง
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							

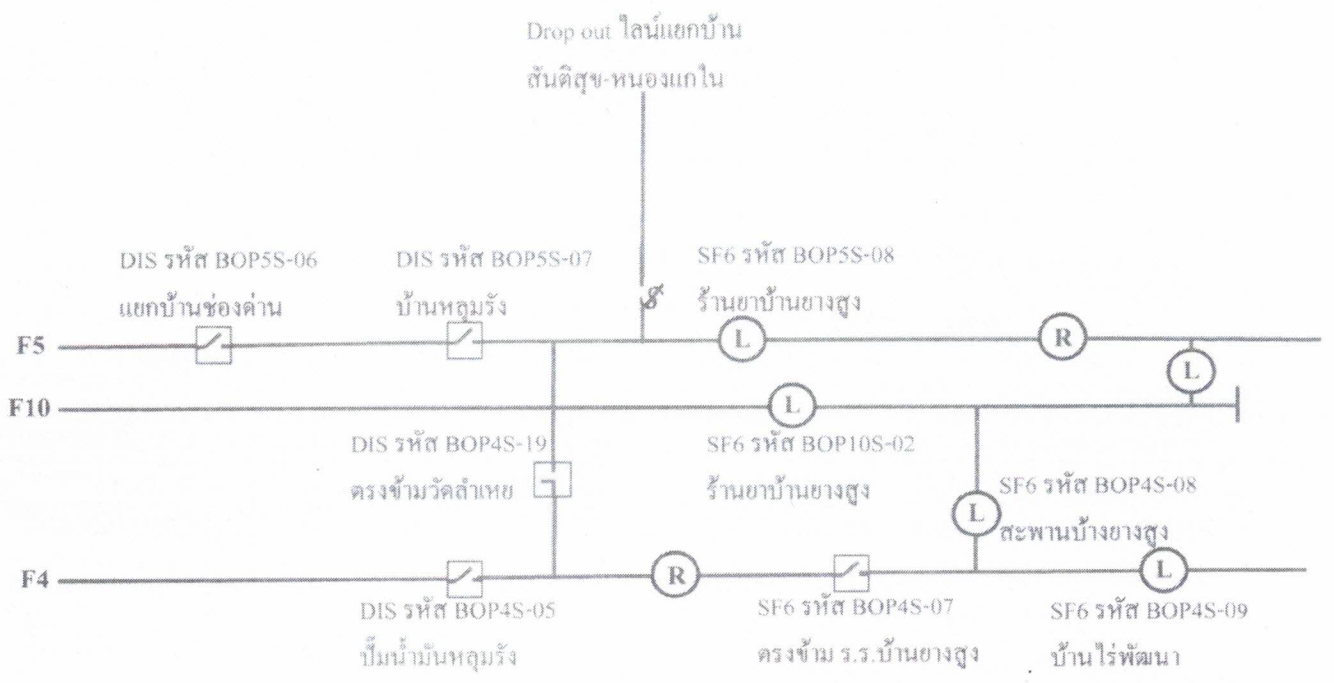

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

