



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปบ.) ๑๐๘๖/๑๑๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ กิ่งทอง
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง ผ.จก. กฟลง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟลง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง๑ ตามแผนผังสังเขป
 แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิด เตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|--------------|--------------------|-------------|----------|--|--------------|----------|-----------------------------------|
| ๑ | กฟลง.๑ | 29 สิงหาคม 2565 | 8.30 น. | 17.00 น. | ปรับปรุงระบบ จำหน่าย เพื่อรองรับ งาน UG รอบองค์พระ | DDE เทศา ๕.1 | NPT35-12 | นายพรหมแดน สุทธิงาม ทพ. ปบ. |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุธงษ์งาม... ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟลง.นครปฐม... โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๕๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟลง.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พิดเตอร์ NPT35-12 จาก PG ๑๐๘๖.๕.1 ถึง DDE เทศา ๕.1

ในวันที่ 29 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1422/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ พิดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิ่งทอง สุธงษ์งาม ประสานงานการขอตัดไฟกับ น. พรหมแดน สุธงษ์งาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟลง.๑๐๘๖

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | |
|------------------------|--|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณข้างเทศบาล - เทศา ซอย 1 | (NPV01, NPT03) |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 29 ส.ค. 65 | ระหว่าง 08.30 น. ถึง 17.00 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟจ.นฐ. | งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย UG รอบองค์พระฯ รือถอน SF6 NPT3S-12 ข้างเทศบาล ตามใบขอปฏิบัติงาน 1422/65 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสุธี ศรีเพ็ชร | วันที่ 28 สิงหาคม 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย | | วันที่ 28 สิงหาคม 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | วันที่ 28 สิงหาคม 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------|
| 1 | งานที่ทำ 1. ปรับปรุงระบบจำหน่าย UG รอบองค์พระฯ | | | | | | |
| 2 | 2. รือถอน SF6 NPT3S-12 ข้างเทศบาล | | | | | | |
| 3 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดต่อนก่อนทำสวิตชิง | | | | | | |
| 4 | NPV01VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPV | | |
| 5 | NPT03VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | NPT | | |
| 6 | เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น. | | | | | | |
| 7 | แจ้งกฟจ.นฐ ตรวจสอบสถานะ SF6 NPT3S-12 ข้างเทศบาล อยู่ "ปลด+ล๊อคคาน" | | | | | | |
| 8 | แจ้ง Hotline กระเช้า 22kV ปลด PG บริเวณข้างเทศบาล (NPV01) ได้ (ตั้งแต่จุดปลด PG ถึง SF6 NPT3S-12 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) | | | | | | |
| 9 | เมื่อ Hotline กระเช้า 22kV ปลด PG บริเวณข้างเทศบาล (NPV01) แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 10 | แจ้ง Hotline กระเช้า 22kV ปลด DDE บริเวณเทศา ซ.1 (NPT03) ได้ (ตั้งแต่จุดปลด DDE ถึง SF6 NPT3S-12 ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ) | | | | | | |
| 11 | เมื่อ Hotline กระเช้า 22kV ปลด DDE บริเวณเทศา ซ.1 (NPT03) แล้วเสร็จ | | | | | | |
| 12 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟจ.นฐ. ทราบ | | | | | | |
| 13 | แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1 | | | | | | |
| 14 | แจ้งกฟจ.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2 | | | | | | |
| 15 | เมื่อกฟจ.นฐ. Test ไฟทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว | | | | | | |
| 16 | แจ้งกฟจ.นฐ. ปฏิบัติงานได้ | | | | | | |
| 17 | NPV01VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPV | | |
| 18 | NPT03VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | NPT | | |
| ***สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*** | | | | | | | |

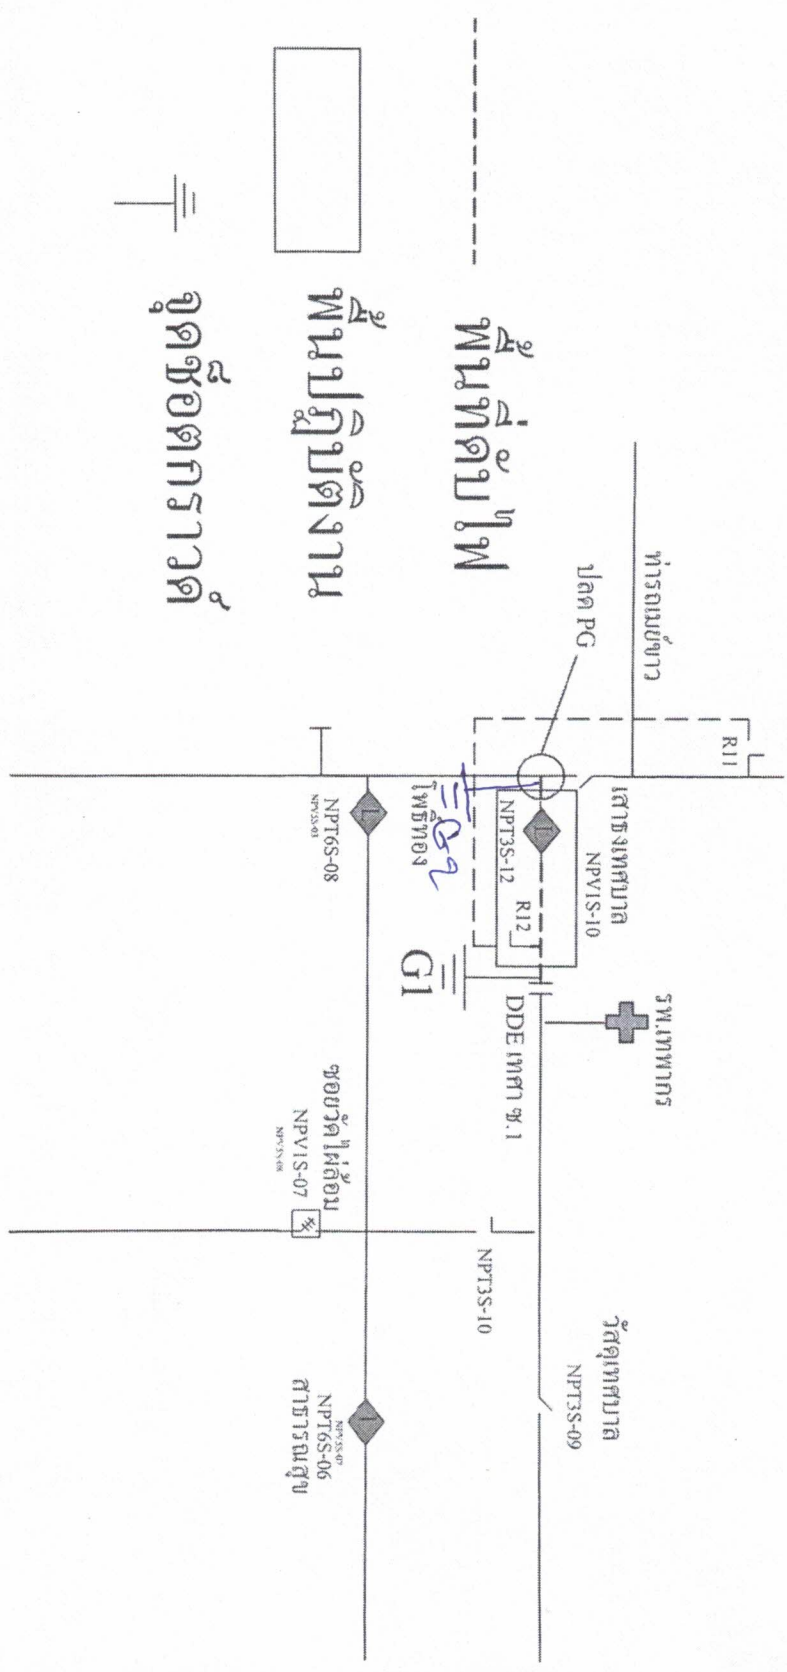

พื้นที่ข้บไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกร้าวค้

