



วิทย์ขอดับไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) ๑๖๓๖๐ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายนรินทร์ เข้มทอง
จำนวนเอกสารแนบ ๒ แผ่น

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ออก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ่อพลอย จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง
สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ดังนี้

ที่	พิด เดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BOU ๐๑ บพล. ๒	๑๐ พ.ย.๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	รื้อถอนไลน์ข้าม ทางชั่วคราว บริเวณสี่แยก หนองปรือ ย้าย R หนองปรือ-ทุ่ง กระบ้ำ รหัส BOU๐๒R-๐๑ เชื่อมวงจรเดิม โดยชุดออนไลน์	ตrophเอาร์ท ก่อนข้ามทาง R หนองปรือ- ทุ่งกระบ้ำ รหัส BOU๐๒R- ๐๑(BOP๐๔R -๐๓)	สูตรระบบ จำหน่าย	นายสันติ โรจนธรรมเจริญ ทล.ปบ.กฟอ.บพล. โทร.๐๘๔-๕๑๔-๗๓๗๔

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพินิจ ตำแหน่ง พชง.๖ (สข) โทร ๐๘๕-๒๔๖๕๔๒๔

ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายสันติ โรจนธรรมเจริญ ตำแหน่ง ทล.ปบ โทร ๐๘๔-๕๑๔๗๓๗๔

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไป
ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายนรินทร์ เข้มทอง)

ผจก.กฟอ.บ่อพลอย

ตำแหน่ง.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ 1 จาก Drop ลีนานหนองปรือ ถึง
ในวันที่ 10 พ.ย. ๖4 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1423/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พืดเตอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อเนกรัต อรรถปณิธิ ประสานงานขอดับไฟกับ นาย สวัสดิ์ ไทรพชรเกษม


(นาย สวัสดิ์ ไทรพชรเกษม)
20 ก.ย. ๖๔

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓


อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนทำสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 3 แผ่น

ผจฟ.....(สถานี.....)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน
จะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน ไลน์ BOU01 บริเวณDrop ชั่วคราวสี่แยกหนองปรือ - ปลายสาย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 10 พ.ย. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟย.ทพร. เปลี่ยนจุดจัม BOU02R-01 มาไลน์ BOU02 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1416/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BOU01VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BOU		
3	BOU02VB-01	Auto Reclose"ON"	Auto Reclose"OFF"		BOU		
4	BOU02R-01	Normal	Non-Relosing,Alter		รถทพร-		
5	- ดับไฟไลน์ BOU01 เวลา 09.00 น.						
6	BOU02R-01	สับ	ปลด		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
7	ใบมีดด้าน Source	สับ	ปลด		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
8	ใบมีดด้าน Load	สับ	ปลด		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
9	Drop.ชค. BOU01	สับ	ปลด,ใช้ไหลตบาสเตอร์		รถทพร-		Drop สี่แยกหนองปรือ
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟย.หนองปรือรับทราบ						
11	แจ้งกฟย.หนองปรือทำการ Test ไฟว่าดับเรียบร้อย						
12	แจ้งกฟย.หนองปรือทำการปลดไหลตออกก่อนทำการย้ายจุดจัม						
13	แจ้งกฟย.หนองปรือทำการปลดไหลตออกก่อนทำการย้ายจุดจัมออกทั้งหมดเรียบร้อย						
14	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยนจุดจัมจากไลน์ BOU01 มาเป็นไลน์ BOU02 (ดูตามแผนผังแนบ)						
15	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการเปลี่ยนจุดจัมจากไลน์ BOU01 มาเป็นไลน์ BOU02 เสร็จเรียบร้อย						
16	หมายเหตุ : ทำงานโดย Hot Line 22 kV.บ้านโป่ง ไม่ได้ทำการ Short Ground						
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
17	หลังจากกฟย.หนองปรือทำงานเสร็จทุกชุด(ไม่มี Short Ground)						
18	ตรวจสอบสวิตตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
19	- จ่ายไฟไลน์ BOU02						
20	ใบมีดด้าน Source	ปลด	สับ		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
21	ใบมีดด้าน Load	ปลด	สับ		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
22	BOU02R-01	ปลด	สับ,คงNon-Reclosing,Alter		รถทพร-		สี่แยกหนองปรือ
23	BOU01VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BOU		
24	BOU02VB-01	Auto Reclose"OFF"	Auto Reclose"ON"		BOU		
25	BOU02R-01	Non-Reclosing,Alter	Normal		รถทพร-		
	%%%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%						

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

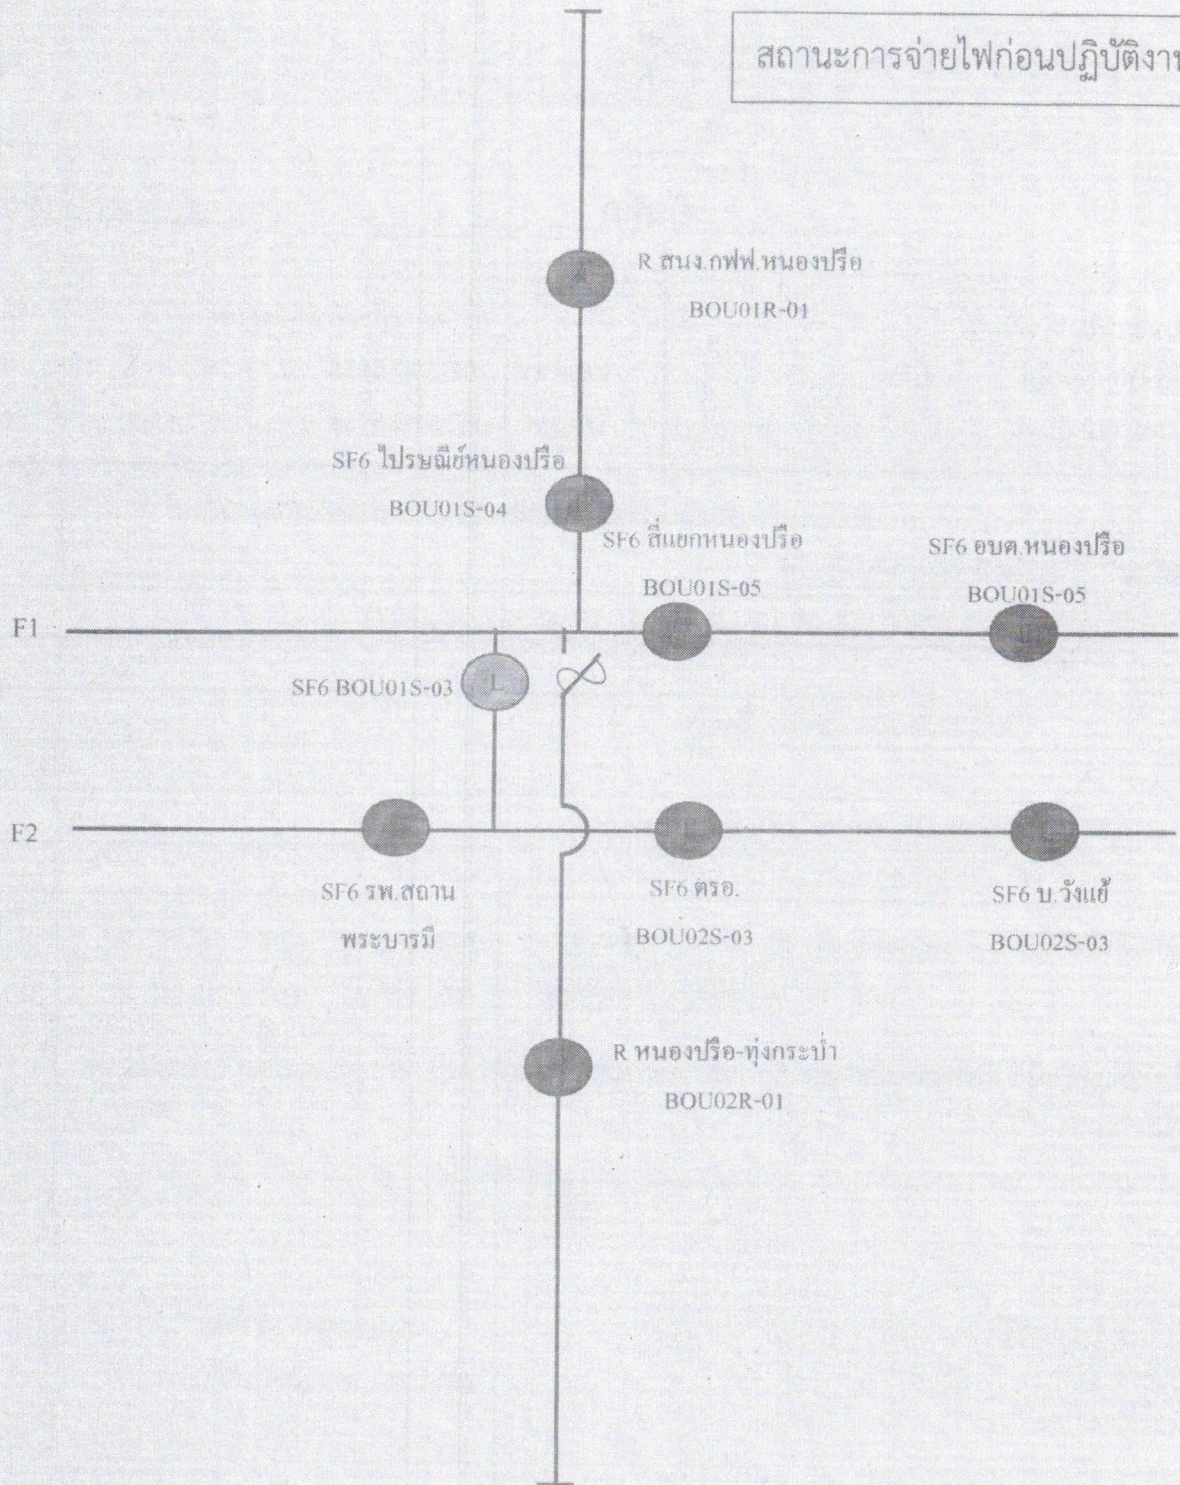


สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

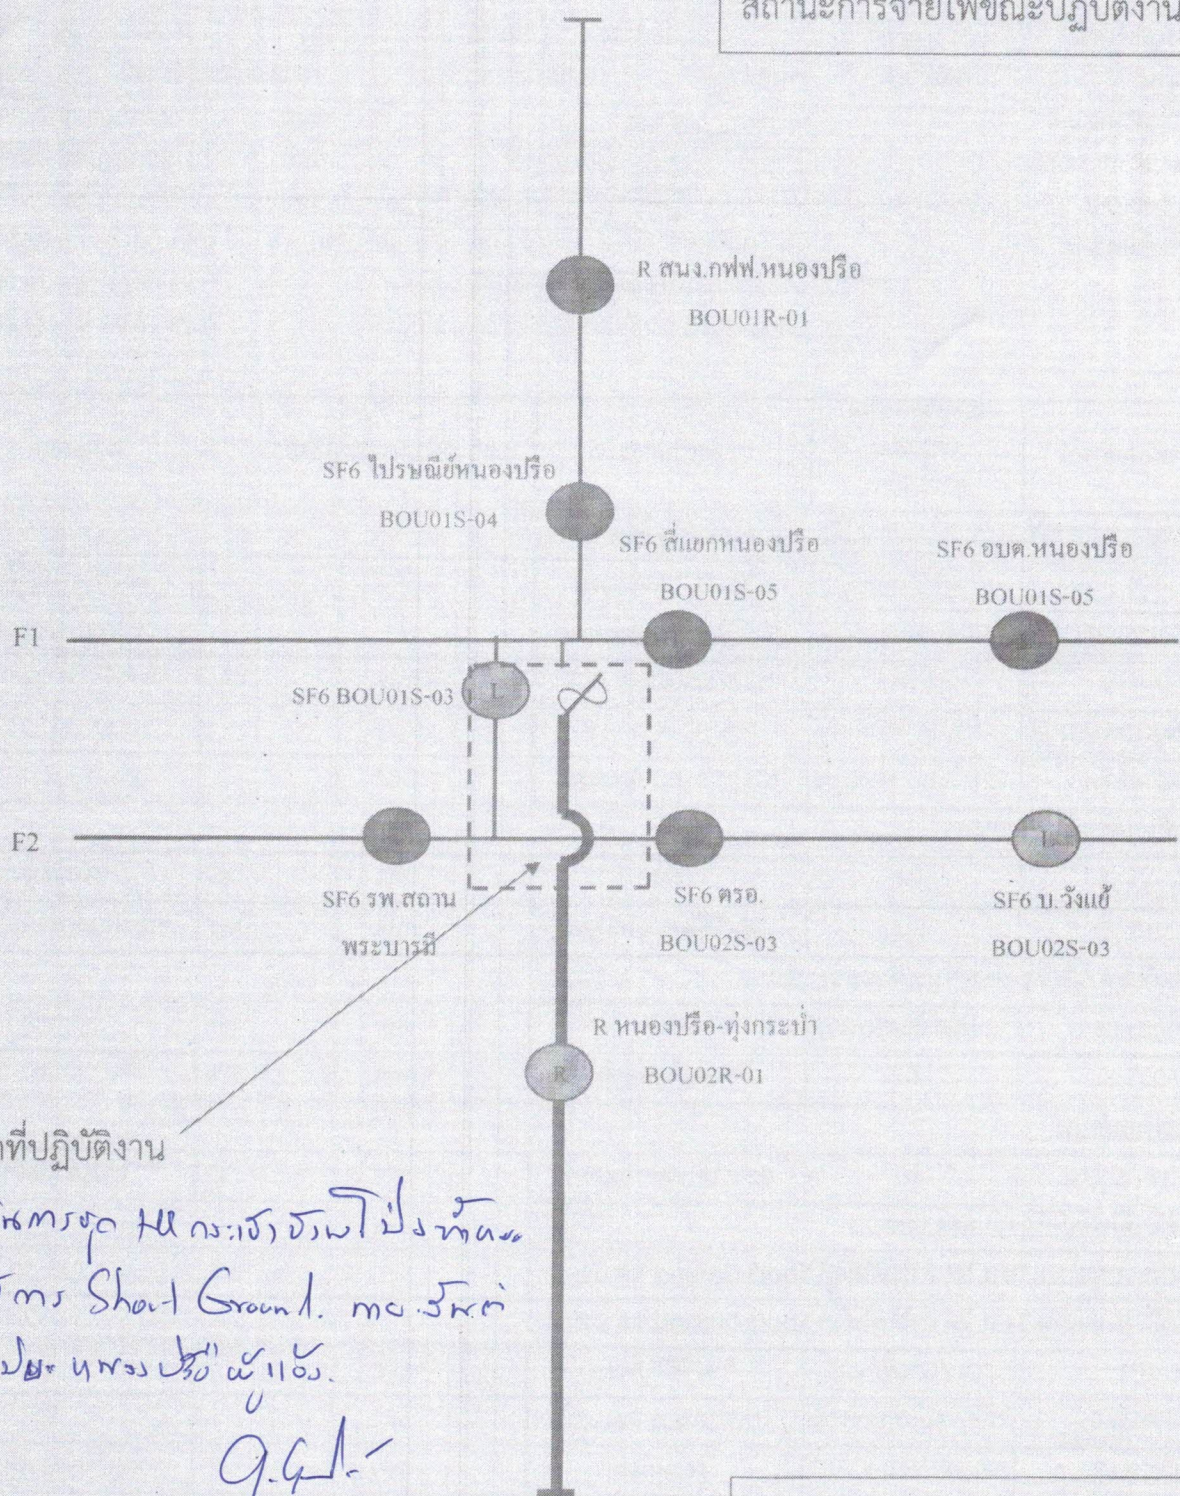

จุดที่ปฏิบัติงาน
 ดำเนินการจุด SF6 กระแสแรงดันป้องกัน
 ในบริเวณ Short Ground. มอ.5 หน้า
 มพ. ๖๕๕ มพ. ๖๕๖ มอ. ๖๕๖

จ.จ.ล.
 ๒๓.๐๔

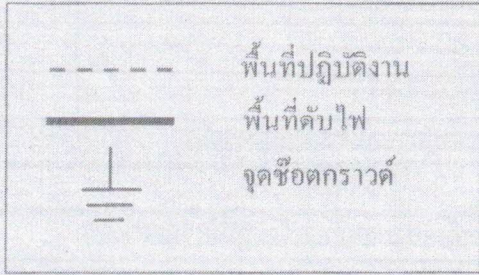

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

