



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ขปอ.ปบ/๓๓๕๑/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BPB๑๑	๒๗/ พย. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	BPB๑๑R-๐๒	จุดตัดเดิม ข้างวัดอ้อต้ง	นายจำรัส ศรีมงคล

ด้วยการไฟฟ้า อ.บ้านโป่ง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒ ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง พชง.ระดับ ๖ โทร ๐๘๖-๙๑๖๒๕๑๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BPB11 จาก BPB11R-๐2 ถึง สดตัดเขต ชุด A
ในวันที่ 27 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1426/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ภิโชค ทอญ้อย ประสานงานการขอตัดไฟกับ ราชวิทยา สิงห์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง. กฟผ.กรง.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย ภิโชค ทอญ้อย)
รจก. 6 กทพ พ.ค.พ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน BPB11R-02-DDE จุด A(ข้างวัดอ้ออี่เขียว)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 พ.ย. 64 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟอ.บปง. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1426/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายมน โทงย้อย วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวอตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	BPB11R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กรณ.		R อ้ออี่เขียว
3	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
4	*ย้ายโหลด BPB11 บางส่วนไปรับไฟจาก BPB12*						
5	BPB12S-09	ปลด	สับ		กรณ.		DIS สามแยกหนองเสือ
6	BPB11R-02	สับ	ปลด		กรณ.		R อ้ออี่เขียว
7	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการปลดสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ BPB11R-02 ออกทั้งสามเฟส						
8	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการไล่นีโหลดจำนวน1เครื่อง บริเวณวัดอ้ออี่เขียว						
9	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดA บริเวณข้างวัดอ้ออี่เขียวออกทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
10	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการตัด DDE จุดA บริเวณข้างวัดอ้ออี่เขียวออกทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
12	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
13	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
14	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
16	BPB12VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
18	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
19	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดA บริเวณข้างวัดอ้ออี่เขียวเข้าทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ)						
20	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้าทำการเชื่อม DDE จุดA บริเวณข้างวัดอ้ออี่เขียวเข้าทั้งสามเฟส (ตามผังแนบ) แล้วเสร็จ						
21	แจ้ง กฟอ.บปง. ทำการสับสวิตซ์ใบมีดด้านโหลดของ BPB11R-02 เข้าทั้งสามเฟส						
22	*ย้ายโหลด BPB11 บางส่วนกลับคืนจาก BPB12*						
23	BPB11R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		กรณ.		R อ้ออี่เขียว
24	BPB12S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กรณ.		DIS สามแยกหนองเสือ
25	แจ้งกฟอ.บ้านโป่งทำการนำโหลดจำนวน1เครื่อง กลับคืน						
26	BPB11R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กรณ.		R อ้ออี่เขียว
27	BPB12VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

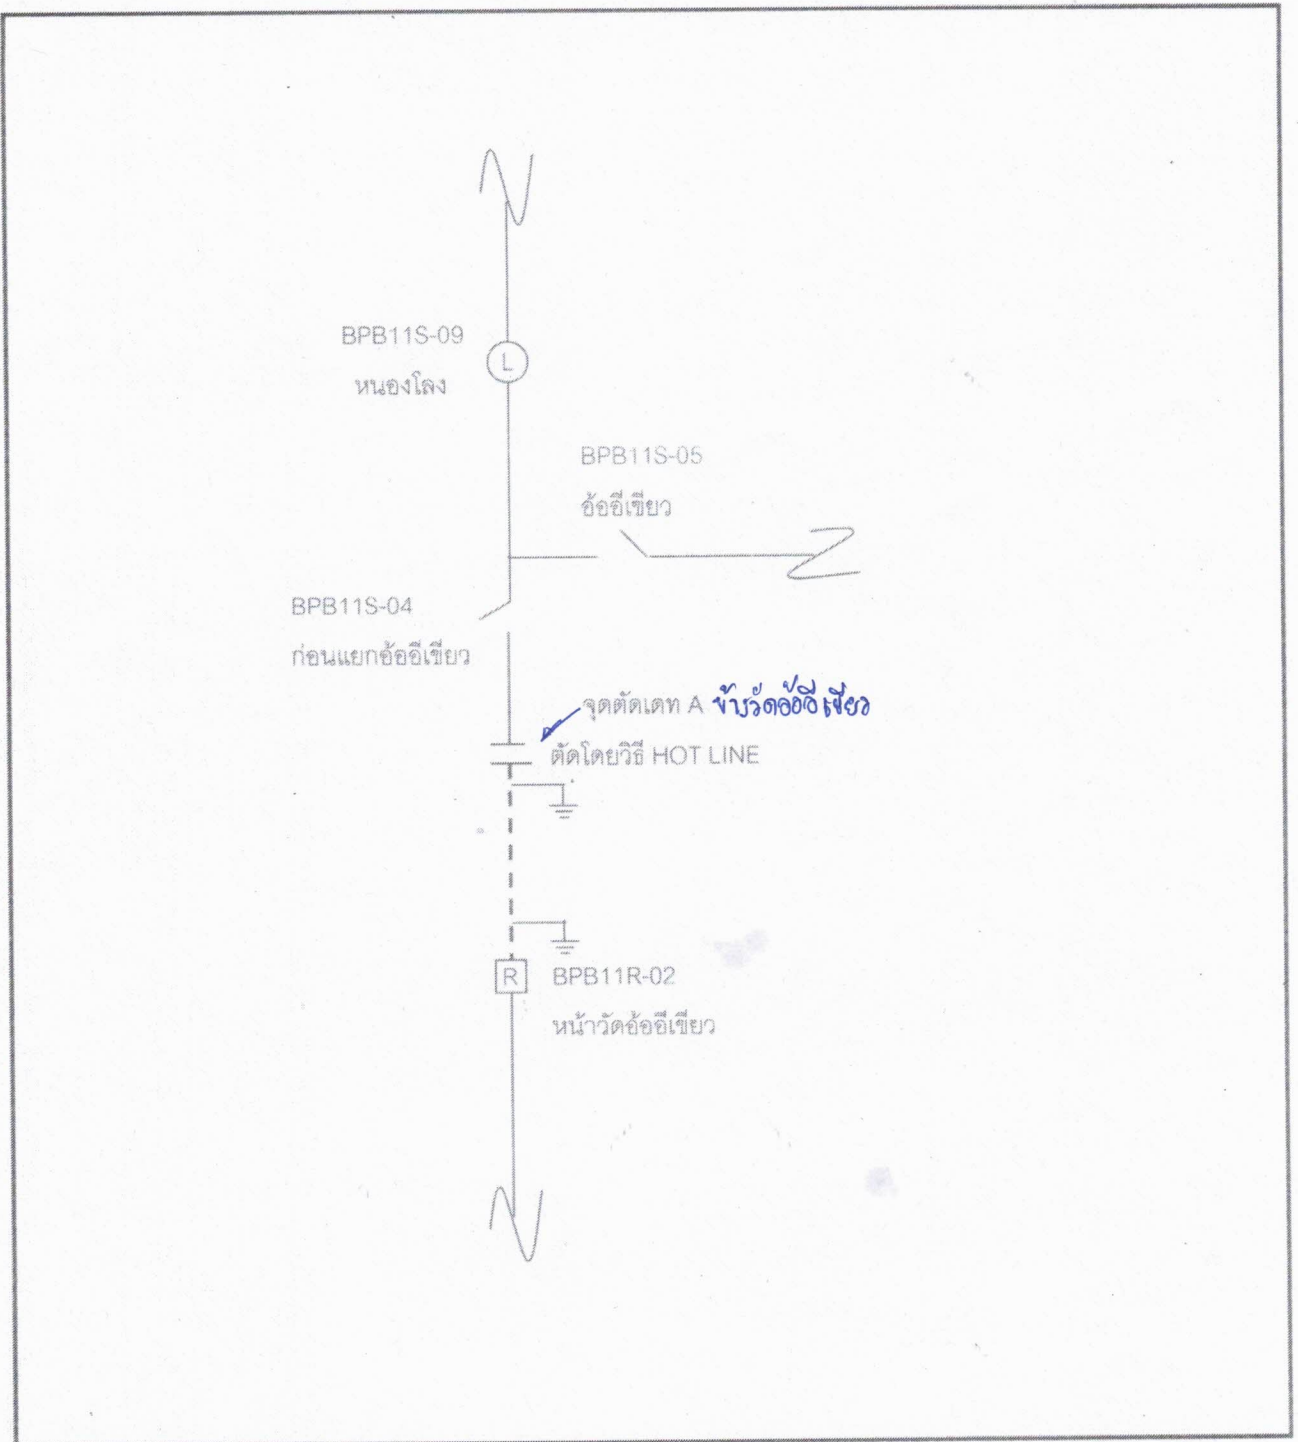

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเคท

ผู้ควบคุมงาน นายนายจำรัส ศรีมงคล
 ผู้ Short Ground นายธนพล ยะนิล
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์
