



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

## วิทยขอดับไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03273  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สึงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิดเส็ง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ เปลี่ยนเสาแรงสูง๑๒.๒๐ม. และย้ายการจ่ายไฟจาก SAC๐๕ เป็น SAC๐๔ ในซอยปฐมฤกษ์ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๒๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	เปลี่ยนเสาแรงสูง๑๒.๒๐ม. และย้ายการจ่ายไฟจาก SAC๐๕ เป็น SAC๐๔	SAC	NCA๕YS-๐๕	นายวัลลภ สุวรรณศรี ๐๘๙-๘๘๔๐๒๕๙
๒	SAC๐๓					SAC๓S-๐๓	SAC๓S-๐๒ SAC๓S-๐๓	
๓	SAC๐๔					SAC๔S-๐๓	SAC๔S-๐๒ SAC๒S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่สถานี SAC - ร้านดอยคำ และซอยปฐมฤกษ์ตลอดทั้งซอย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายรัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง หน.ปบ โทร. ๐๘๙-๙๘๑๔๗๗๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิดเส็ง)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กพอ.สามพราน


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA5Y จาก SAC14B-๐1 ถึง NCA56S-๐5  
ในวันที่ 25 11 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1435/2565.  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SAC9 จาก SAC35-๐1 ถึง SAC35-๐2, SAC35-๐3  
ในวันที่ 25 11 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SAC9 จาก SAC95-๐1 ถึง SAC95-๐2, SAC95-๐3  
ในวันที่ 25 11 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่.....  
พนักงานศูนย์ นาย..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... มโนช ทองย้อย..... ประสานงานการขอดับไฟกับ..... นายจรูญชัย..... วงศ์ยมวงค์.....

  
 (นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 2016-annunord.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก..... กฟอ.สทสร., กฟอ.พศ.  
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3..... แผ่น  
 แผ่นผังแนบ..... 1..... แผ่น



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ..... 1..... (สถานี..... SAC.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... 07:30..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)

  
 (นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
 (นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

1. สถานที่ทำงาน      ไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kV. บริเวณร้านดอยคำและชอยปทุมกัลยา
2. กำหนดวันที่ทำงาน      25 ก.ย. 65      ระหว่าง      08.00 น.      ถึง      17.00      น.
3. ผู้ขอทำงาน      กฟอ.สพร.      งานที่ทำ      เปลี่ยนเสาแรงสูงและ เปลี่ยนการจ่ายไฟจาก SAC09 เป็น SAC04      ตามใบขอปฏิบัติงาน      1435/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย      นายมนิช ทองย้อย      วันที่      20 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย            วันที่      20 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย            วันที่      20 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย      1. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต      (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)  
2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิศ,นายมนิช      (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)  
3. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร      (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
งานที่ทำ:เปลี่ยนเสาแรงสูง 12.20 เมตร และเปลี่ยนการจ่ายไฟวงจร SAC09 ชอยปทุมกัลยา 1 เป็นวงจร SAC04								
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนการทำก่อนการ Switching							
2	ตรวจสอบ Loop 115 kV NCA01YB-01 กับ NCA05YB-01 จ่าย Close Loop ปกติ							
3	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
4	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
6	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
7	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC			
8	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
9	NCA0BR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA			
10	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
11	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
12	*ย้ายโหลด SAC03 ไปรับไฟจาก NCA12*							
13	NCA12S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	คลังสินค้าดัชมิลล์(ล่าง)	
14	SAC03S-03	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ร้านดอยคำ(บน)	
15	*ย้ายโหลด SAC09 ไปรับไฟจาก NCA01*							
16	NCA01S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	คลังสินค้าดัชมิลล์(บน)	
17	SAC09S-02	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.	SF6	ร้านดอยคำ(ล่าง)	
18	OPEN Loop สายส่ง 115 kV							
19	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี	
20	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		โบริมิต 115 เควี	
21	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC		โบริมิต 115 เควี	
22	แจ้ง กฟอ.สามพรานตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SAC02S-02 และ SAC03S-02 อยู่สถานะปลด โหว์ OFF และให้ทำการล๊อคคาน							
23	ดับไฟไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kV. เวลา 08.00 น.							
24	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการปลด					นช.	LBS	115 KV.ปั๊มแก๊ส
25	NCA05YS-05	สับ	ปลด,ล๊อคกุญแจ		นช.	LBS	115 KV.ปั๊มแก๊ส	
26	SAC03VB-01	สับ	ปลด		SAC	CB	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	SAC09VB-01	สับ	ปลด		SAC		CB	-
28	SAC04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SAC		CB	-
29	SAC03S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	Pothead F.3
30	SAC09S-01	สับ	ปลด		สพร.		DIS	Pothead F.9
31	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟอ.สามพรานรับทราบ							
32	แจ้ง กฟอ.สามพราน Test ไฟว่าดับเรียบร้อย							
33	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G1							
34	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G2							
35	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G3							
36	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการ Short ground จุด G4							
37	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
38	แจ้งกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
39	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
40	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
41	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
42	NCA0BR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA			
43	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
44	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
	สิ้นสุด Switching เช้า							
45	หลังจากกฟอ.สามพรานปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด							
46	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G1 ออก							
47	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G2 ออก							
48	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G3 ออก							
49	แจ้งกฟอ.สามพรานทำการปลด Short ground จุด G4 ออก							
50	แจ้งกฟอ.สามพรานลงรายละเอียด We Safe							
51	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching							
52	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
53	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC			
54	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
55	NCA0BR-12	Normal	Nonreclosing, ALT		SCADA			
56	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ศูนย์กทม.			
57	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA			
58	ตรวจสอบ กฟอ.สามพราน เปลี่ยนการจุ่มวงจร SAC09 ซอยปฐมกัลยา 1 เป็นวงจร SAC04							
59	SAC04VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SAC		CB	-
60	จ่ายไฟไลน์ SAC03,09 และสายส่ง 115 kV							
61	ตรวจสอบ Low Gas ก่อนทำการสับ							
62	NCA05YS-05	ปลด	สับ, ล็อคกุญแจ		นช.		LBS	115 kV. บั้มแก๊ส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
63	SAC03S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Pothead F.3
64	SAC04S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Pothead F.4
65	SAC09S-01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	Pothead F.9
66	SAC03VB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose"OFF"		SAC		CB	-
67	SAC04VB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose"OFF"		SAC		CB	-
68	SAC09VB-01	สับ	สับ คง Auto Reclose"OFF"		SAC		CB	-
69	แจ้ง กพอ.สามพราน ให้ทำการปลดล๊อคคาน SF6 รหัส SAC02S-02 และ SAC03S-02							
70	จ่าย Loop สายส่ง 115 kV							
71	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC			ใบมีด 115 เควี
72	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC			ใบมีด 115 เควี
73	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง Auto Reclose"OFF"		SAC		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
74	<b>*ย้ายโหนด SAC03 กลับคืนจาก NCA12*</b>							
75	SAC03S-03	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ร้านดอยคำ(บน)
76	NCA12S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	คลังสินค้าดัชชีมิลล์(ล่าง)
77	<b>*ย้ายโหนด SAC09 กลับคืนจาก NCA01*</b>							
78	SAC09S-02	ปลด	สับ		สพร.		SF6	ร้านดอยคำ(ล่าง)
79	NCA01S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6	คลังสินค้าดัชชีมิลล์(บน)
80	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
81	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
82	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC			
83	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
84	SAC04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
85	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC			
86	NCS-KT1A//2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
87	NCA0BR-12	Nonreclosing, ALT	Normal		SCADA			
88	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ศูนย์กทม.			
89	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA			
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

งานดับไฟหน้าอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแรงสูง 12.20 ม.

และย้ายการจ่ายไฟจาก SAC09 เป็น SAC04 ในซอยปฐมกัลยา 1

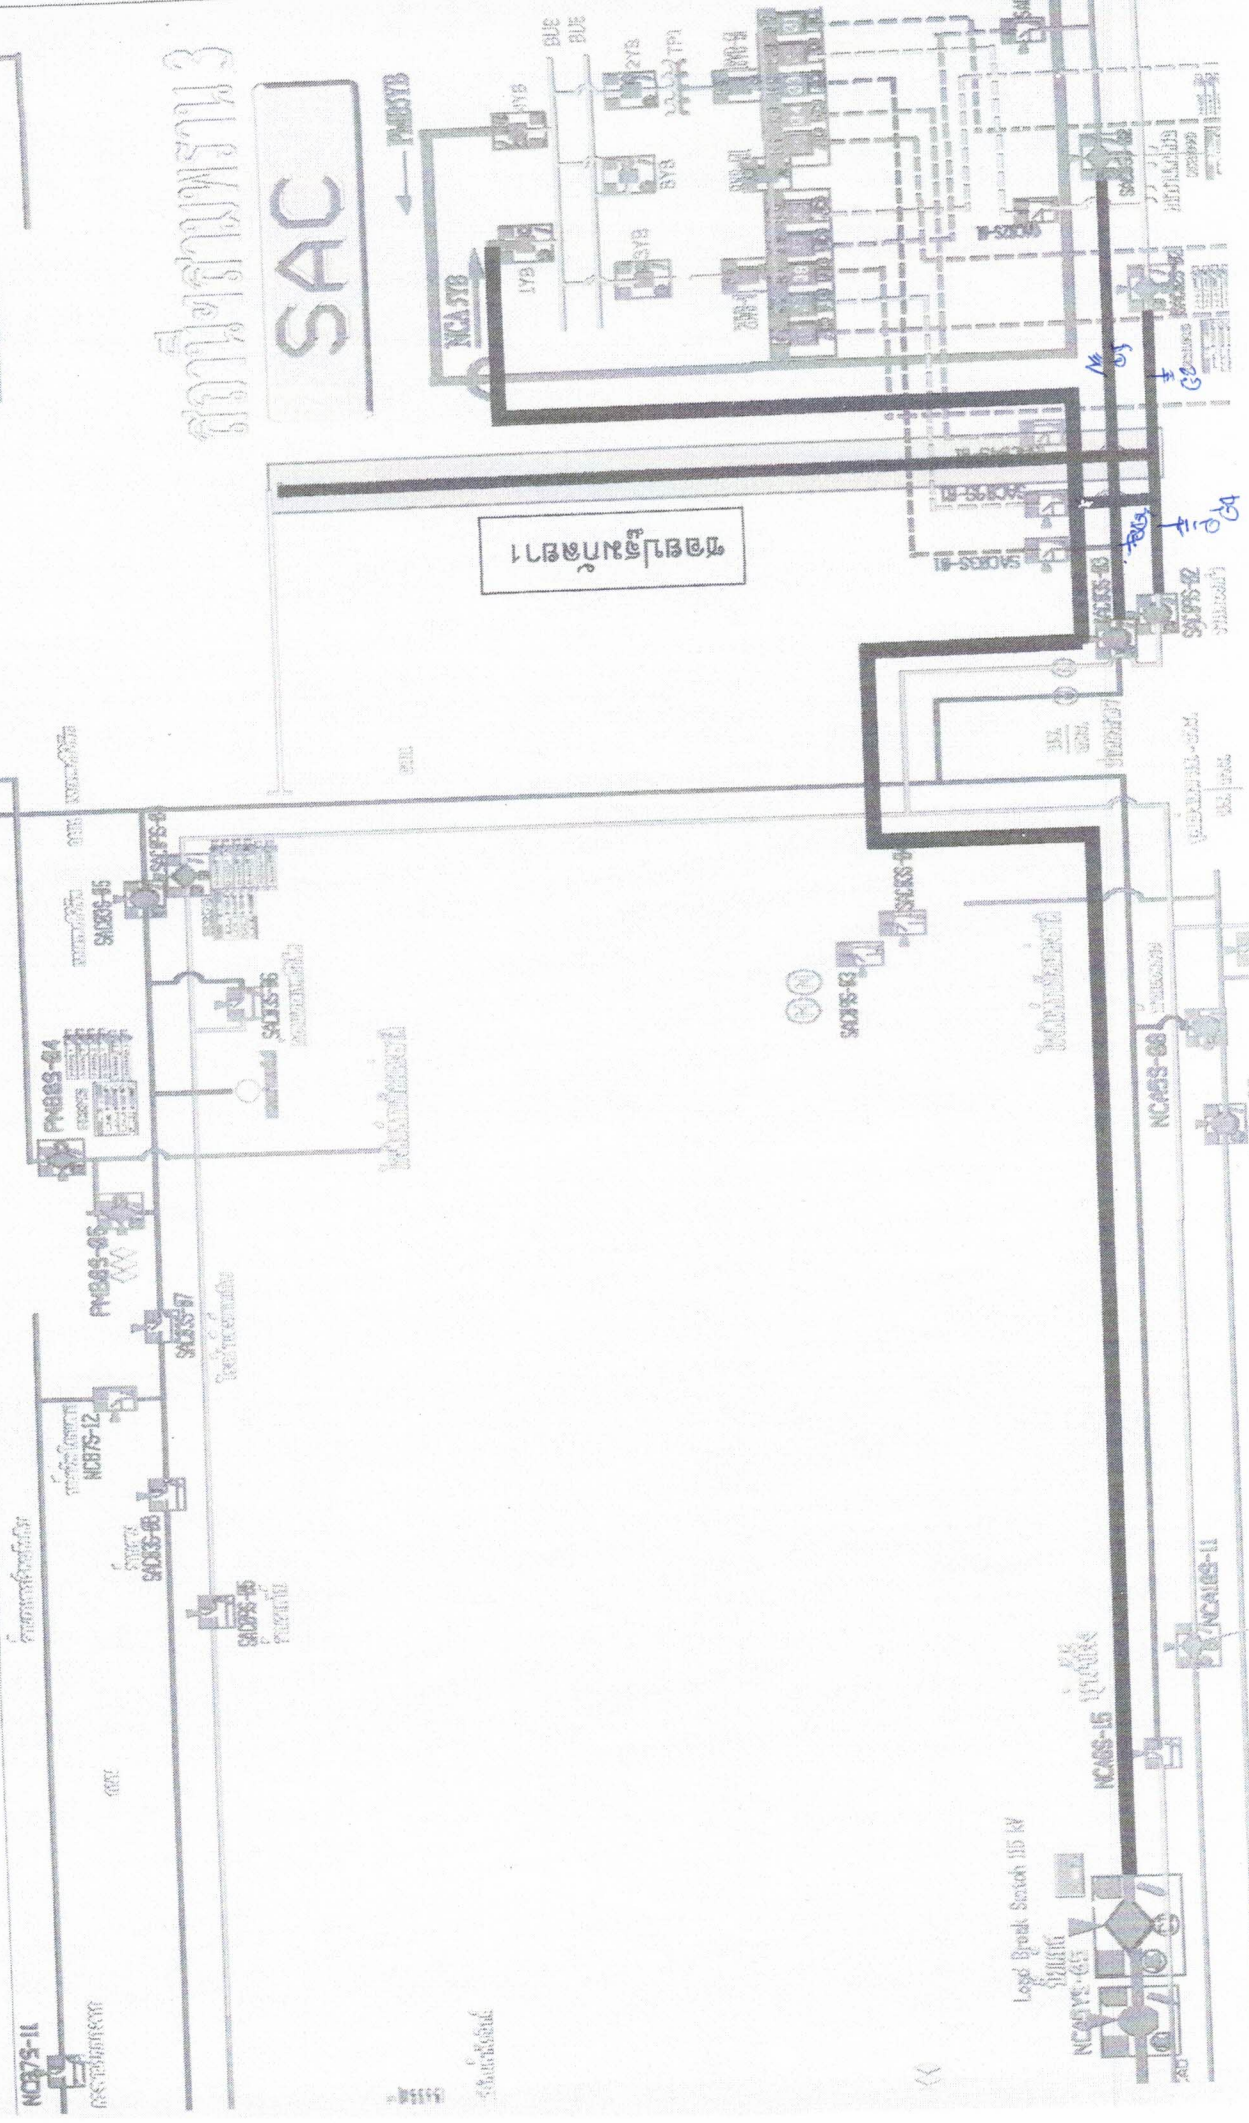

สถานีสามฟาราน 3  
SAC

ซอยปฐมกัลยา 1

Logic Break Switch 115 kV

SAC09-11
