



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พทน. ๑๘๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร์

# Switching Deadline

29 ม.ค. 67

## วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ..... ตามแผนผัง  
สิ่งเขบนับ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG๐๙	๓๐ ม.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปักเสา ๒๒ ม.(๑๑๕ เควี) แยกไฟสี - บ้านห้วยลึก	UTG๙S-๐๔ แยกไฟสี	ดิสชั่วคราว บ.ไทยควอลิตี้	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๘๐ ครัวเรือน

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.บ. โทร ๐๘๔-๓๑๖๒๑๑๙

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ .....  
( นายอรรถพงษ์ สัมครจิตร์ )

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ UTG๐๙ จาก UTG๙S-04 ถึง ดิส.บ.๓๐๐ ลัก  
ในวันที่ 30 ม.ค. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๘.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 143/67

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ..... ฟีดเดอร์ ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรรถพงษ์ สัมครจิตร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟภ.๓ อ.ก.บ.บ.๓

.....  
( นายสุภัทลลิต์ เกียงหงษ์ )  
๑๐๑.5 พทน.พ.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. พทน., กฟส. อ.บ., กฟส. พทก.

อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี) .....  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์  
นครปฐม ตั้งแต่เวลา ..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ UTG09 บริเวณแยกไฟสี -บ้านห้วยลึก	
2. กำหนดวันที่ทำงาน	30 ม.ค. 67	ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ ปักเสา 22 เมตร ตามใบขอปฏิบัติงาน 143/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 26 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	วันที่ 26 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย	วันที่ 26 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายมนตรีทร,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
3	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
4	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
5	UTG05R-01	Normal	Nonreclose,Block GND		ทกจ.	R	R.สละลงเรือ
6	UTG09R-01	Normal	Nonreclose,Block GND		ทกจ.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
7	- ทำการ By-Pass UTG09R-01						
8	SW.By-Pass	ปลด	สับ		ทกจ.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
9	UTG09R-01	สับ	ปลด		ทกจ.	R	บ้านตลิ่งเหนือ
10	- ย้ายโหลด UTG09 ไปจ่ายจาก UTG05						
11	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
12	UTG05S-13	ปลด	สับ		ลข.	DIS	สี่แยกบ้านตลิ่งเหนือ
13	DIS.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทกจ.	DIS	ชค.บริษัท ควอลิตี้
14	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
15	- ดับไฟ เวลา 08.30 น.						
16	UTG09S-04	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ทกจ.	SF6	แยกไฟสี
17	ตรวจสอบ UTG05S-08 ให้ปลดโซ่"OFF"พร้อมล๊อคคานไว้				ทกจ.	SF6	แยกไฟสี(ข้ามถนน)
18	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
19	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
20	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
21	UTG05R-01	Nonreclose,Block GND	Normal		ทกจ.	R	R.สละลงเรือ
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.พทน. ทราบ						
23	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
24	แจ้งกฟส.พทน. Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G2						
25	แจ้งกฟส.พทน.ลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
26	แจ้งกฟส.พทน.ปฏิบัติงานได้						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	หลังจากกฟส.พทน.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
28	แจ้งกฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
29	แจ้งกฟส.พทน.ทำการปลด Short Ground จุด G2 ออก						
30	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
31	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
32	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		
33	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		UTG		
34	UTG05R-01	Normal	Nonreclose,Block GND		ทกจ.	R	R.สละลงเรือ
35	- จ่ายไฟ						
36	UTG09S-04	ปลด	สับ		ทกจ.	SF6	แยกไฟสี่
37	- ย้ายโหลด UTG09 กลับคืนจาก UTG05						
38	UTG0BVB-01	ปลด	สับ		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
39	DIS.UTG09	ปลด	สับ		ทกจ.	DIS	ชค.บริษัท ควอลิตี้
40	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ลข.	DIS	สี่แยกบ้านตลุงเหนือ
41	UTG0BVB-01	สับ	ปลด		UTG	CB	22 kV.ขนานเมนบัส
42	- นำ UTG09R-01 เข้าระบบ						
43	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Non, Block GND		ทกจ.	R	บ้านตลุงเหนือ
44	SW.By-Pass	สับ	ปลด		ทกจ.	R	บ้านตลุงเหนือ
45	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
46	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		
47	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		UTG		
48	UTG05R-01	Nonreclose,Block GND	Normal		ทกจ.	R	R.สละลงเรือ
49	UTG09R-01	Nonreclose,Block GND	Normal		ทกจ.	R	บ้านตลุงเหนือ
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

ഭരണസംസ്ഥാനം

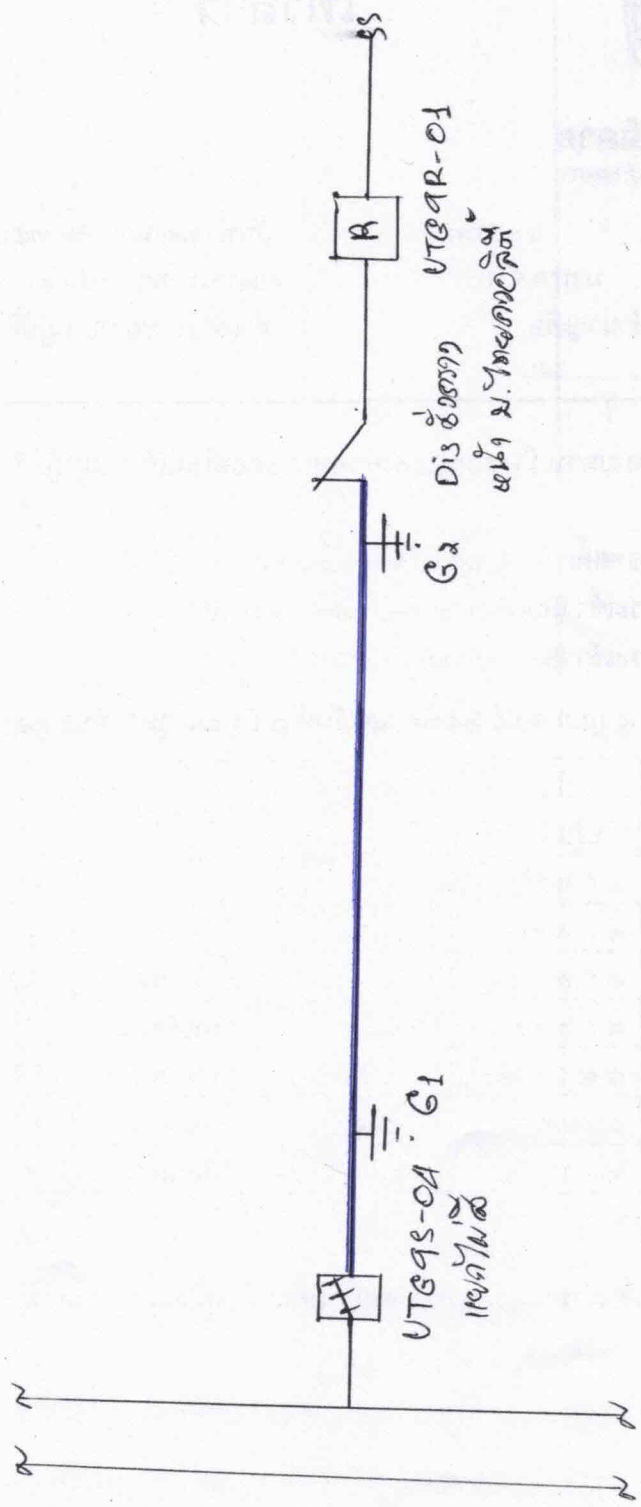

9 2
