

Switching Deadline

07 ต.ค. 66



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นฐ(ปน) ๖๗๑๕ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายสมชาย ศรีจารุพฤษ์

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก(ท) กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115kV	8 ตุลาคม 2566	8.30 น.	17.00 น.	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรง สูง แยกบ่อทราย	สฟพ.นฐ3	บ้านโป่ง2	นายสุภวิชัย เกาะลอย
๒	BPA07					BPA7S-05 วัดศรีอริยะเมตต รัย	BPA7S-06 ร้าน ขายมอเตอร์ปั้ม ลม, BPA7R-01 วังเย็น	
๓	NPV07					Dis. ชค. ศูนย์ เบนซ์	Dis. ชค. บอส เฟอร์นิเจอร์	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)... แยกบ่อทราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์รัตน์ ตำแหน่ง ขม.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย...ศรีจารุพฤษ์)

ตำแหน่ง... รจก(ท) กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ 115kV จาก BPA74B-01 ถึง NPV44B-01
ในวันที่ ๘ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1442/66
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2,3 ฟีดเดอร์ NPV07 จาก Dis.ชค. ศูนย์เบนซ์ ถึง Dis.ชค. บอสเฟอร์นิเจอร์
ในวันที่ 8 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัยยศ โพธิ์รัตน์

(นางสาวจิราภรณ์ พงษ์ศิริ)
ว.ค.๕ พานาน.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.ทอ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๔ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี) _____
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน
2. กำหนดวันที่ทำงาน
3. ผู้ขอทำงาน
4. เตรียมการสวิตชิงโดย
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย
6. อนุมัติสวิตชิงโดย
7. สั่งทำสวิตชิงโดย

แยกบ่อทราย (115kV,BPA07,NPV07)


8 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
กฟส.นฐ.	งานที่ทำ	ก่อสร้างระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1442/66	
	นายสุธี ศรีเพชร		วันที่	7 ตุลาคม 2566	
			วันที่	7 ตุลาคม 2566	
			วันที่	7 ตุลาคม 2566	
	1. นายสุธีศรีเพชร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต,			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		เบรกเกอร์ 115 เควี
3	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	Load = 15.76 MW
5	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV	-	Load = 10.48 MW
6	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	Load = 5.04 MW
7	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV	-	Load = 6.00 MW
8	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	Load = 18.93 MW
9	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load = 6.31 MW
10	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load = 2.28 MW
11	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA	-	Load = 4.24 MW
12	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
13	BPA07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R วังเย็น
14	ย้ายโหลด BPA09 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA08						
15	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
16	BPA09S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โรงขอส
17	ย้ายโหลด BPA07 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA09						
18	BPA09S-09	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 บ้านไร่ต้นสำโรง
19	BPA07R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R วังเย็น
20	BPA07R-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS SW.Load R. วังเย็น
21	ย้ายโหลด NPV07 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA09						
22	BPA07S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 ร้านขายมอเตอร์ปั้มลม
23	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- ขนานบัส
24	BPA09S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 ชาญชัยอะไหล่ยนต์
25	Dis ชค. NPV07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ศูนย์เบนซ์
26	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- ขนานบัส
27	BPA07S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นฐ.		SF6 ร้านขายมอเตอร์ปั้มลม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.						
29	Dis ชุด. NPV07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS บอสเฟอร์นิเจอร์
30	BPA07S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 วัดครีอาร์ยะเมตตรัย
31	ตรวจสอบสถานะ Loop 115kV BPB07YB-01 และ BPB09YB-01 จ่ายไฟ Close Loop อยู่สภาพปกติ						
32	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
34	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 เควี
35	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		ใบมีด 115 เควี
36	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
37	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
38	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.นฐ. ทราบ						
39	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G1						
40	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G2						
41	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G3 (115kV)						
42	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G4 (115kV)						
43	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G5						
44	แจ้งกฟส.นฐ. Test ไฟ ถ้าไม่มีไฟให้ Short Ground จุด G6						
45	เมื่อกฟส.นฐ. Test ไฟและ Short Ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
46	แจ้งกฟส.นฐ. ปฏิบัติงานได้						
47	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
48	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
49	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
50	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
51	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
52	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
53	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
54	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
55	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
56	เมื่อกฟส.นฐ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
57	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G1						
58	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G2						
59	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G3 (115kV)						
60	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G4 (115kV)						
61	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G5						
62	แจ้งกฟส.นฐ. ปลด Short Ground จุด G6 และเมื่อกฟส.นฐ. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
63	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
64	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		-	-
65	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-	-
66	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		-	-
67	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-	-
68	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
69	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
70	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-	-
71	BPA09R-01	Normal, ALT	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R	หนองดินแดง
72	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
73	Dis ชค. NPV07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	บอสเฟอร์นิเจอร์
74	BPA07S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	วัดศรีอาริยะเมตตรัย
75	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		CB	ใบมีด 115 เควี
76	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		CB	ใบมีด 115 เควี
77	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
78	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
79	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		NPV		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
80	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Reclose		BPB		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
81	ย้ายโหลด NPV07 กลับจาก BPA09							
82	BPA07S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6	ร้านขายมอเตอร์ปั๊มลม
83	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		-	ขนานบัส
84	Dis ชค. NPV07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	ศูนย์เบนซ์
85	BPA09S-04	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	ชายูชัยอะไหล่ยนต์
86	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		-	ขนานบัส
87	BPA07S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6	ร้านขายมอเตอร์ปั๊มลม
88	ย้ายโหลด BPA07 กลับจาก BPA09							
89	BPA07R-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	SW.Load R. วังเย็น
90	BPA07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R	วังเย็น
91	BPA09S-09	สับ	ปลด		นฐ.		SF6	บ้านไร่ต้นสำโรง
92	ย้ายโหลด BPA09 กลับจาก BPA08							
93	BPA09S-07	ปลด	สับ		นฐ.		DIS	โรงขอส
94	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS	ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
95	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
96	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
97	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	-
98	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-	-
99	NPV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-
100	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		-	-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
101	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-	-
102	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
103	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
104	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		-	-
105	BPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	SCADA	R	หนองดินแดง
106	BPA07R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		นธ.	SCADA	R	วังเย็น
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

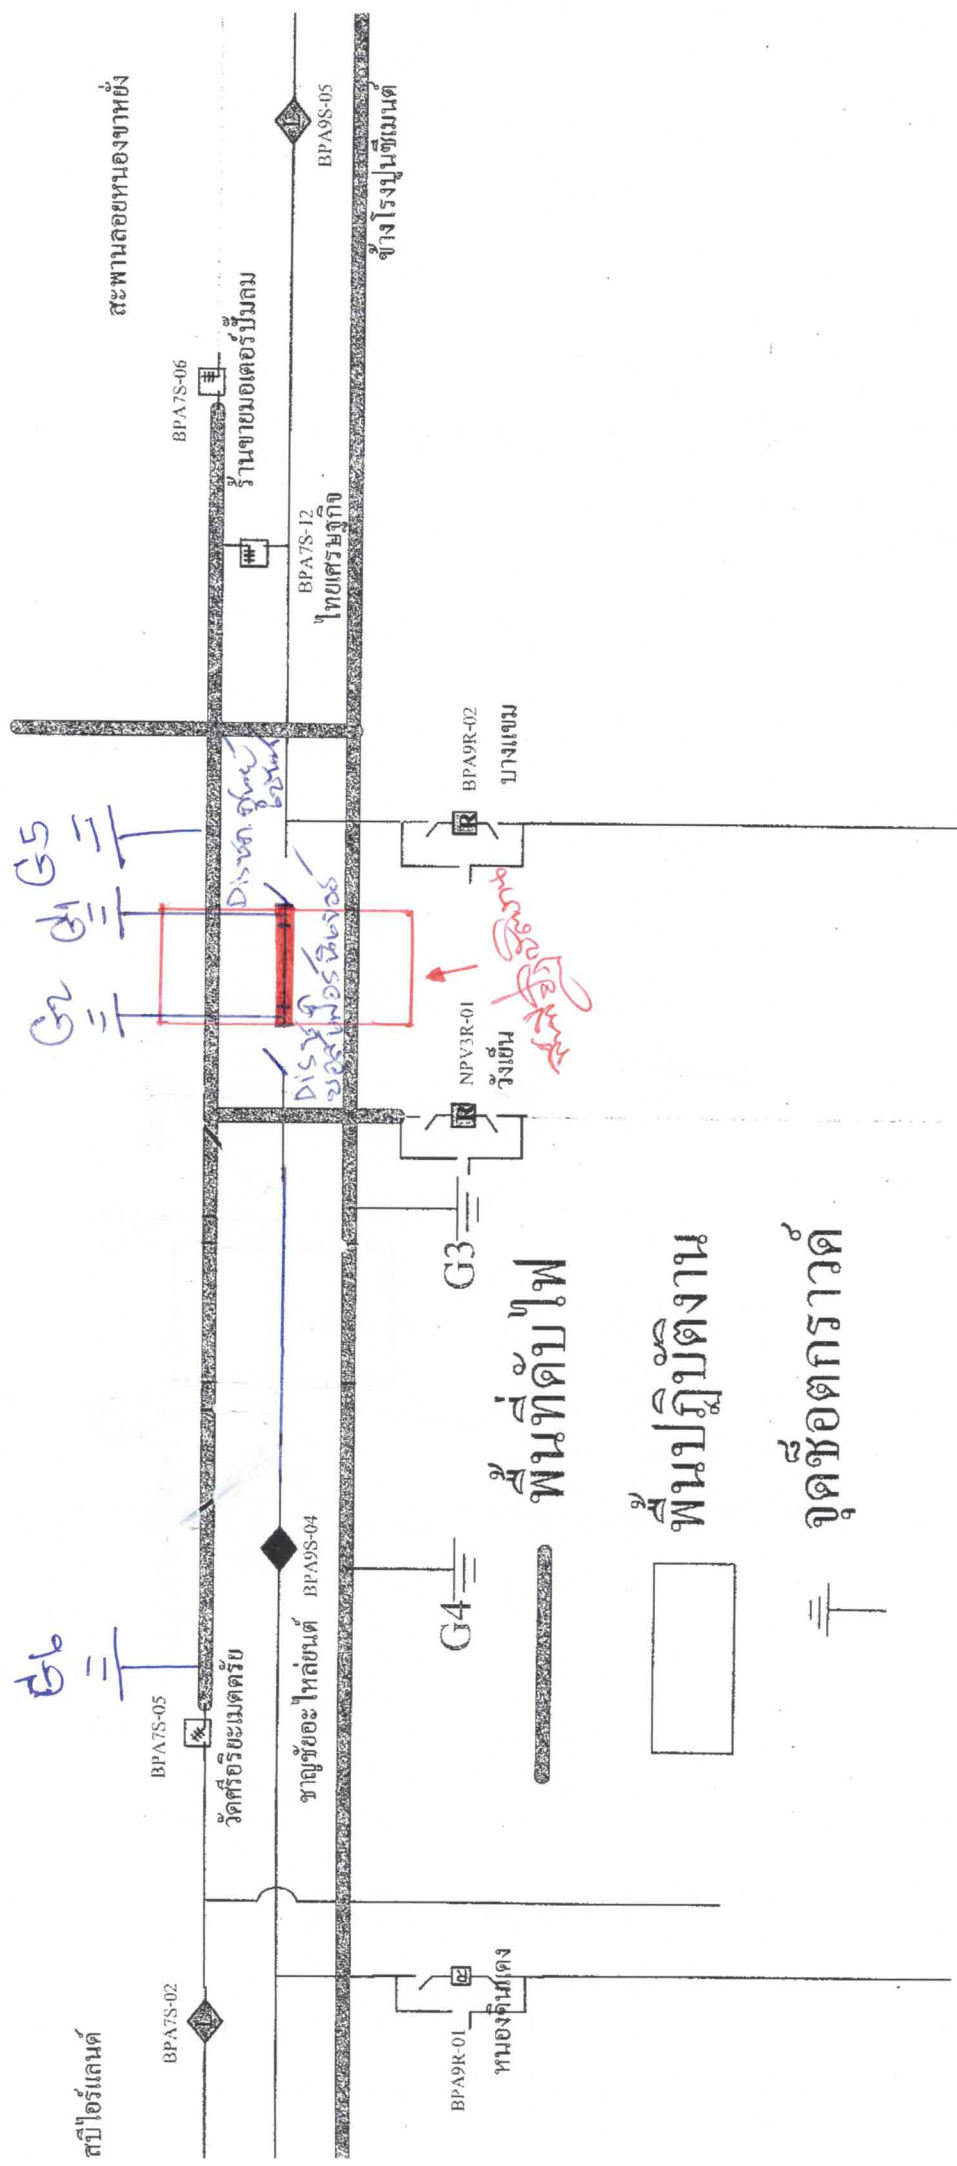

สายพานลอยทางห้อง

วัดศรีวิริยะเมตไตรย์

ช่างเขียนโฮลยนต์

ร้านขายมอเตอร์บีบลม

ไทยเสริมกิจ

ข้างโรงปูนซีเมนต์

BPA9R-01
หมอนอิงคั่นแดง

NPV3R-01
วงรี

BPA9R-02
บางแจม

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

G5
G4
G3

G6
