



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# วิทยุขอดับไฟ

## Switching Deadline

9 ต.ค. 67

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03504  
 ชื่อผู้รับ นายพิชิตนันท์ พิชิตสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟปรับปรุงสาย๑๘๕SAC เป็นสายTAC สะพานลอยแคแถว ฝั่งขาเข้า  
 กทม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

| ที่ | พิดเออร์       | วัน/เดือน/ปี   | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงาน/บริเวณ   | จาก        | ถึง  | ผู้ควบคุมงาน                    |
|-----|----------------|--|-------------|---------|--|------------|--|---------------------------------|
| ๑   | NCA๐๑          | 19-20 (วันพฤหัส)<br>๒๕-๒๖ ต.ค. ๖๗<br>กับเข้าจ่ายเช่น | ๐๘.๓๐       | ๑๖.๓๐   | ดับไฟปรับปรุงสาย๑๘๕SAC เป็นสายTAC สะพานลอยแคแถว ฝั่งขาเข้า กทม | NCA๐๑VB-๐๑ | -Disxc.ปากทางสาย ๘(สเปเซอร์ถนน)<br>-NCA๑S-๐๓ | นายนิพนธ์ ผูกฉิม<br>๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑ |
| ๒   | NCA๐๔          |  |             |         |  | NCA๐๔VB-๐๑ | -Disxc ค. ข้าง Dis Loopline(บน)              |                                 |
| ๓   | NCA๐๘<br>SAC08 |  |             |         |  | NCA๐๘VB-๐๑ | -Disxc ค. ข้าง Dis Loopline(สเปเซอร์บ้าน)    |                                 |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..... ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ..... ป.ปบ.

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  
 ๓.  พิกัดพื้นที่ดับไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๕๖๘๒ Long : ๑๐๐.๑๙๑๐๔  
 ๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๕๖๒๑ Long : ๑๐๐.๑๙๑๐๕

ลงชื่อ [Signature]  
 (นายวนภูมิ บำรุงศรี)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
 เรียง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเออร์ NCA01 จาก NCA01VB-01 ถึง NCA01S-03, Dis ๕๓. ปากทางสาย 8  
 ในวันที่ 12-13 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1457/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเออร์ NCA04 จาก NCA04VB-01 ถึง Dis ๕๓. บัง Dis loopline (บน)  
 ในวันที่ 12-13 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1457/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 พิดเออร์ SAC08 จาก NCA08VB-01 ถึง Dis ๕๓. บัง Dis loopline (ล่าง)  
 ในวันที่ 12-13 ต.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1457/2567
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเออร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ ชัย สุภัทรา วงศ์บุญพัก ประสานงานการขอดับไฟกับ หน้ต๋นัฒ ผูกฉิม

[Signature]  
 (นางสาวสุภัทรา.....วงศ์บุญพัก...)  
 ๑๘๖. 5 แทน นพ.๓พ.

สำหรับผู้อนุมัติ  
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียง ผจก. กฟส. สปร  
 อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ  
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนทางนครแจ้งเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง


|                        |   |          |                             |       |    |                   |                      |
|------------------------|---|----------|-----------------------------|-------|----|-------------------|----------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สะพานลอยแคแถว ฝั่งขาเข้า กทม.   |          |                             |       |    |                   |                      |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | <del>12-13</del> 19-20  | ค.ศ. 67  | ระหว่าง                     | 08.30 | น. | ถึง               | 16.30                |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.สพร.  | งานที่ทำ | ปรับปรุงสาย SAC เป็นสาย TAC |       |    | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1457/2567            |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก  |          |                             |       |    | วันที่            | 5 ตุลาคม 2567        |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                             |       |    | วันที่            | 5 ตุลาคม 2567        |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |                             |       |    | วันที่            | 5 ตุลาคม 2567        |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนเฑียร<br>2. นายพิรภัทร, น.ส.สุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต<br>3. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจรรย์, นายสุธี, นายสามารถ |          |                             |       |    | (กะ1              | 00.00 น. - 08.00 น.) |
|                        |   |          |                             |       |    | (กะ2              | 08.00 น. - 16.00 น.) |
|                        |   |          |                             |       |    | (กะ3              | 16.00 น. - 24.00 น.) |

| ที่                        | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ            | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                         |
|----------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 1                          | **งานวันที่ <del>12-13</del> 19-20 ค.ศ. 67 ดับเข้าจ่ายเย็น**   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 2                          | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 3                          | SAB-KT1A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                  |
| 4                          | SAB04VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAB          |            | Load = 3.86 MW                   |
| 5                          | NCA-KT3A   | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual        |      | EGAT         |            |                                  |
| 6                          | NCA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            | Load = 2.52 MW                   |
| 7                          | NCA04VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | NCA          |            | Load = 1.27 MW                   |
| 8                          | SAC08VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose   |      | SAC          |            | Load = 2.35 MW                   |
| 9                          | ย้ายโหลด NCA04 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAB04  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 10                         | NCA04S-04  | ปลด                                  | สับ                  |      | สพร.         | SCADA      | SF6 หน้าขอยทางเข้า รพ.สามพราน    |
| 11                         | NCA04VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | NCA          |            | CB 22 kV                         |
| 12                         | ย้ายโหลด NCA01 ทั้งหมดไปจ่ายจาก SAB04  |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 13                         | NCA01S-05  | ปลด, ล็อคคาน                         | สับ                  |      | สพร.         |            | SF6 ท้ายไฮโหมต                   |
| 14                         | NCA01VB-01   | สับ                                  | ปลด                  |      | NCA          |            | CB 22 kV                         |
| 15                         | เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น. (พื้นที่ดับไฟไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ)                                     |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 16                         | Dis ชด.ในไลน์ NCA01  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ชั่วคราวปากทางสาย 8          |
| 17                         | Dis ชด.ในไลน์ NCA04  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ชด. ข้าง Dis Loopline (บน)   |
| 18                         | Dis ชด.ในไลน์ SAC08  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) |      | สพร.         |            | DIS ชด. ข้าง Dis Loopline (ล่าง) |
| 19                         | NCA01S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | สพร.         |            | Pothead F.1                      |
| 20                         | NCA04S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | สพร.         |            | Pothead F.4                      |
| 21                         | NCA08S-01  | สับ                                  | ปลด                  |      | สพร.         |            | Pothead F.8                      |
| 22                         | แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.สพร. รับทราบ   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 23                         | แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 24                         | แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2   |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 25                         | เมื่อ กฟส.สพร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้ |                                      |                      |      |              |            |                                  |
| 26                         | SAB-KT1A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                  |
| 27                         | SAB04VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAB          |            |                                  |
| 28                         | NCA-KT3A   | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto          |      | EGAT         |            |                                  |
| 29                         | SAC08VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose    |      | SAC          |            |                                  |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า |  |                                      |                      |      |              |            |                                  |

| ที่                       | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ          | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ                         |
|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------|------|--------------|------------|----------------------------------|
| 30                        | เมื่อ กฟส.สพร. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                  |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 31                        | แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G1 |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 32                        | แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.สพร. ทำการปลด Short Ground จุด G2 |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 33                        | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิชชิง      |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 34                        | SAB-KT1A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            |                                  |
| 35                        | SAB04VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SAB          |            |                                  |
| 36                        | NCA-KT3A  | "OLTC" Auto                          | "OLTC" Manual      |      | EGAT         |            |                                  |
| 37                        | SAC08VB-01  | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose |      | SAC          |            |                                  |
| 38                        | เมื่อพร้อมจ่ายไฟ  |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 39                        | Dis ชด.ไนไลน์ NCA04                                     | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | DIS ชด. ข้าง Dis Loopline (บน)   |
| 40                        | Dis ชด.ไนไลน์ SAC08                                     | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | DIS ชด. ข้าง Dis Loopline (ล่าง) |
| 41                        | Dis ชด.ไนไลน์ NCA01                                     | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | DIS ชั่วคราวปากทางสาย 8          |
| 42                        | NCA01S-01   | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | Pothead F.1                      |
| 43                        | NCA04S-01   | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | Pothead F.4                      |
| 44                        | NCA08S-01   | ปลด                                  | สับ                |      | สพร.         |            | Pothead F.8                      |
| 45                        | ย้ายโหลด NCA01 ทั้งหมด กลับจาก SAB04                    |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 46                        | NCA01VB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | NCA          |            | CB 22 kv                         |
| 47                        | NCA01S-05   | สับ                                  | ปลด, ล็อคคาน       |      | สพร.         |            | SF6 ท้ายโยมอด                    |
| 48                        | ย้ายโหลด NCA04 ทั้งหมด กลับจาก SAB04                    |                                      |                    |      |              |            |                                  |
| 49                        | NCA04VB-01  | ปลด                                  | สับ                |      | NCA          |            | CB 22 kv                         |
| 50                        | NCA04S-04   | สับ                                  | ปลด                |      | สพร.         | SCADA      | SF6 หน้าขอยทางเข้า รพ.สามพราน    |
| 51                        | SAB-KT1A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            |                                  |
| 52                        | SAB04VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAB          |            |                                  |
| 53                        | NCA-KT3A  | "OLTC" Manual                        | "OLTC" Auto        |      | EGAT         |            |                                  |
| 54                        | NCA01VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NCA          |            |                                  |
| 55                        | NCA04VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | NCA          |            |                                  |
| 56                        | SAC08VB-01  | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose  |      | SAC          |            |                                  |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด |   |                                      |                    |      |              |            |                                  |

งานตีไฟวันอาทิตย์ที่ 12-13 ตุลาคม 2567 เปลี่ยนสายวงจรNCA01,NCA08 185SAC เป็นสายTAC 2 วงจร

บริเวณสะพานลอยแคแวง ผังขาเข้า กทม.

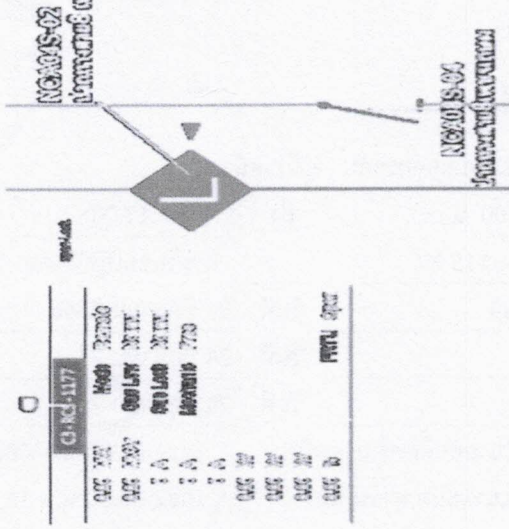

| G-NS-117 |             |
|----------|-------------|
| 005 001  | หม้อ 32730  |
| 005 002  | ตู้สาย 20TT |
| 005 003  | ตู้สาย 20TT |
| 005 004  | ตู้สาย 20TT |
| 005 005  | ตู้สาย 20TT |
| 005 006  | ตู้สาย 20TT |
| 005 007  | ตู้สาย 20TT |
| 005 008  | ตู้สาย 20TT |
| 005 009  | ตู้สาย 20TT |
| 005 010  | ตู้สาย 20TT |

