



วิทยุขอตัดไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กค.คกข.(ปน)๑๑๙๕/๒๕๖๕

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าฯ สมุทรสาคร ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF2	๑๘ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาแรงสูง	SMF๒S-๑๑	SMF๒S-๑๒ SMF๒S-๑๓	นายประวิทย์ กรังพานิชย์ เบอร์โทร ๐๙๑- ๘๑๓๒๖๐๙
๒	SMF3	๑๘ ก.ย.๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.		SMF๓S-๑๒	ถึงปลายสาย	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) วัดถั่วพร้าว แนวถนนถั่วพร้าวไปโค้งยายขาว

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรเสถียร สงวนพันธ์ ตำแหน่ง ท.ผ.ปน โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ _____

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผ.จก. กฟฟ.โคกขาม



แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ SMF02 จาก SMF25-11 ถึง SMF25-12, SMF25-13
ในวันที่ 18 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1462/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พัดเตอร์ SMF03 จาก SMF35-12 ถึง ปลายสาย
ในวันที่ 18 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พัดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย มโนช ทองย้อย ประธานงานการขอดับไฟกับ นายเศรษฐศาสตร์ วัฒนพาศักดิ์


(นายเศรษฐศาสตร์ วัฒนพาศักดิ์)
๒๑ ก. ๙ ๖๕ ๒๒.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓๓.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๓-(rev.๐๒/๒๕๖๐)



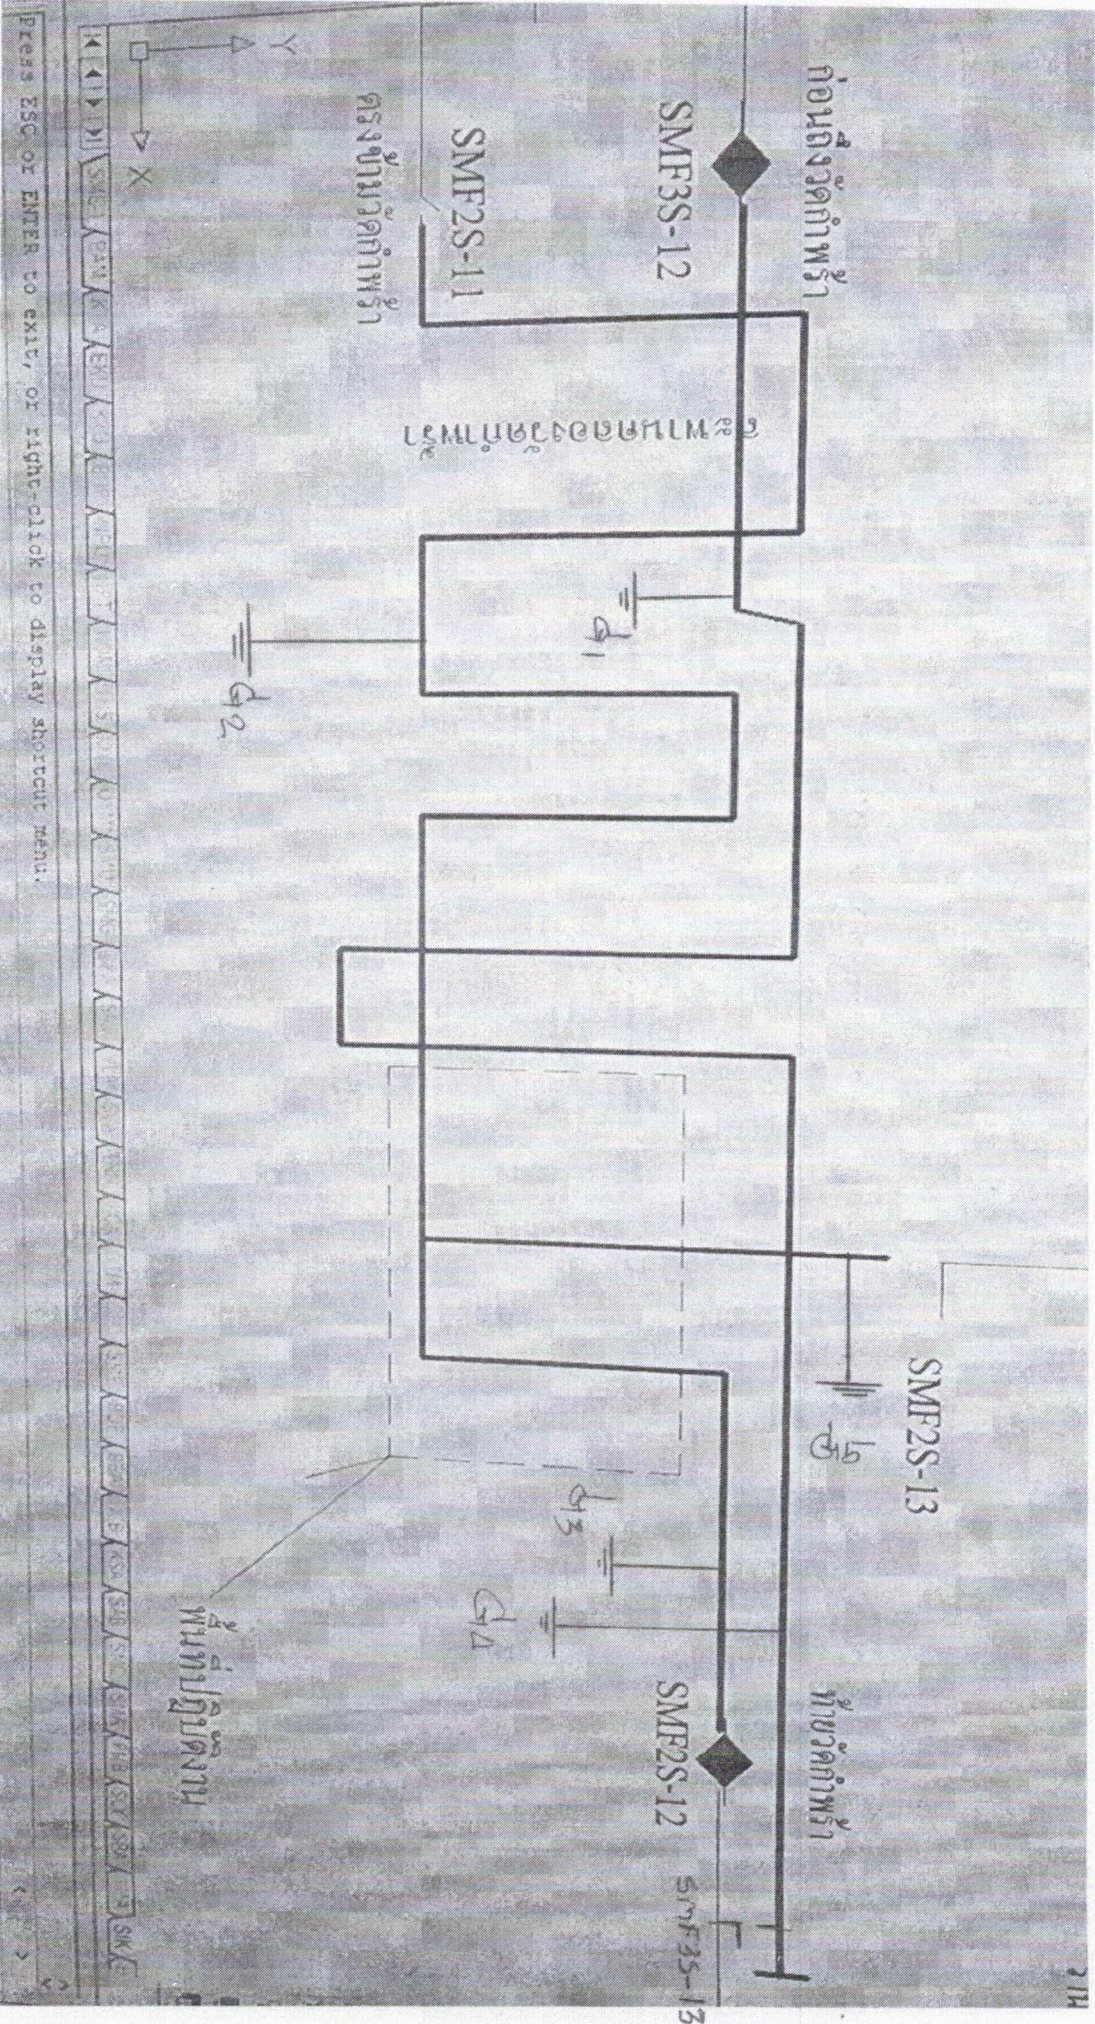
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



ก่อนตั้งวัดค่าพรี

SMF3S-12

SMF2S-11

ตรงพื้นที่วัดค่าพรี

พื้นที่วัดค่าพรี

G1

G2

SMF2S-13

10

ท้ายวัดค่าพรี



SMF2S-12

SMF3S-13

พื้นที่ปฏิบัติงาน

Press ESC or ENTER to exit, or right-click to display shortcut menu.

Navigation icons: Home, Back, Forward, Stop, Refresh, Print, Copy, Paste, Undo, Redo, Zoom In, Zoom Out, Full Screen, Exit.

1. สถานที่ทำงาน	แนวถนนวัดกำแพง้า-โค้งยายขาว						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ก.ย. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	18 ก.ย. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1462/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมน โชน ทอญ้อย					วันที่	11 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	11 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	11 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมน โชน					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
3	SMF03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกข.		- ร้านเซเว่น
4	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ตรวจสอบสถานะ SF6 รหัส SMF02S-12 (หลังวัดกำแพง้า) อยู่สถานะปลดโชว์ OPEN และให้ดำเนินการล๊อคคาน						
5	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ตรวจสอบสถานะสวิตช์ใบมีด รหัส SMF02S-13 (ซอยนายกแบน) อยู่สถานะปลดออกทั้งสามเฟส						
6	*พร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
7	SMF02S-11	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ตรงข้ามวัดกำแพง้า
8	SMF03S-12	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		คกข.		SF6 ก่อนวัดกำแพง้า
9	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟภ.โคกขาม รับทราบ						
10	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
12	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
13	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
14	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G5						
15	หลังจากทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ปฏิบัติงานได้						
17	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
18	SMF03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกข.		- ร้านเซเว่น
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
19	เมื่อ กฟภ.โคกขาม ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟกลับสภาพปกติ						
20	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						
22	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
23	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4						
24	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ทำการปลด Short Ground จุด G5						
25	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี ครบทุกจุดและยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
26	SMF02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SMF		- -
27	SMF03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		คกช.		- ร้านเซเว่น
28	*พร้อมดับไฟ เวลา 17.00 น.						
29	SMF02S-11	ปลด	สับ		คกช.		DIS ตรงข้ามวัดกำพำรำ
30	SMF03S-12	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกช.		SF6 ก่อนวัดกำพำรำ
31	แจ้ง กฟภ.โคกขาม ให้ดำเนินการปลดล็อคคาน SF6 รหัส SMF02S-12 (หลังวัดกำพำรำ)						
32	SMF02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SMF		- -
33	SMF03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		คกช.		- ร้านเซเว่น
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							
