



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHYSICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๓.....
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย...เชิดชูสุวรรณ.....

Switching Deadline

13 ก.ย. 65

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อภ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนอุปกรณ์ทางด้านแรงสูงงานสถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน...๑...แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	09/09/65 14	08.00	17.00	ติดตั้งอุปกรณ์ทางด้านแรงสูง ระบบจำหน่าย 22 เควี งาน สถานีสุพรรณบุรี 2	Dis ชั่วคราว สุพรรณ 2	DDE รานกาแพ เมืองเหนือ	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล วุทธิกร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สท.) โทร. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อภ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร


อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SPAC9 จาก Dis ชั่วคราว สุพรรณบุรี ถึง DDE รานกาแพเมืองเหนือ

ในวันที่ 14 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1467/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... พิดเคอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป


(นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สท.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม


ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อภ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้า สฟฟ.สุพรรณบุรี 2 (SPA09)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ก.ย. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ติดตั้งอุปกรณ์งาน สฟฟ.สุพรรณบุรี 2	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1169/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	9 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กษ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์			(กษ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี			(กษ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
3	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บางปลาหมอ
4	เปลี่ยนทางจ่ายไฟวงจร SPA09						
5	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.	DIS	หมู่บ้านจามจรี
6	Dis.ไลน์ SPA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.	DIS	ชั่วคราว หน้า สฟฟ.สุพรรณ 2
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 08.00 น.						
8	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร SPA09 ออก						
9	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี ไลน์โหลดหม้อแปลงบริเวณพื้นที่ดับไฟ วงจร SPA09 ออก เรียบร้อย						
10	แจ้ง Hot Line ทำการปลด DDE วงจร SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ ออกทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
11	หลังจาก Hot Line ทำการปลด DDE วงจร SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สุพรรณบุรี ทราบ						
13	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA	-	-
17	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	R	บางปลาหมอ
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** ลี้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
19	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA	-	-
21	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	R	บางปลาหมอ
22	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
23	แจ้ง กฟจ.สุพรรณบุรี ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
24	หลังจาก กฟจ.สุพรรณบุรี ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	แจ้ง Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ เข้าทั้ง 3 เฟส (แบบมีไฟ)						
27	หลังจาก Hot Line ทำการเชื่อม DDE วงจร SPA09 บริเวณร้านกาแฟเมืองเหนือ เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	จ่ายไฟวงจร SPA09 กลับสภาพเดิม						
29	Dis.ไลน์ SPA09	ปลด	สับ		สพ.		DIS ชั่วคราว หน้า สฟพ.สุพรรณ 2
30	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจู้รี
31	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
32	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.		R บางปลาหมอ
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก มทบ.กฟง.สท.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน มจก.กฟง.สท./รจก.กฟง.สท.

ถึง มจก.กฟง.สท.

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๑๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มี
แผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...Dis ชั่วคราวสถานีสุพรรณ๒ - DDE กานแฟเมืองเหนือ...เพื่อ...รื้อถอนและทาดสายแรงสูง
๑๘๕ค.มม. ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดคิดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พิดเคอร์ ...๙... สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. Disชั่วคราวสถานีสุพรรณบุรี๒ - DDE กานแฟเมืองเหนือ
กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้... ตำแหน่ง ชูคอสร้าง เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...เป็นผู้ควบคุมงานและให้และให้นาย
วรพล สุทธิไกร ตำแหน่ง ทม.กส.สท. โทร ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และเสร็จในเวลาที่กำหนด

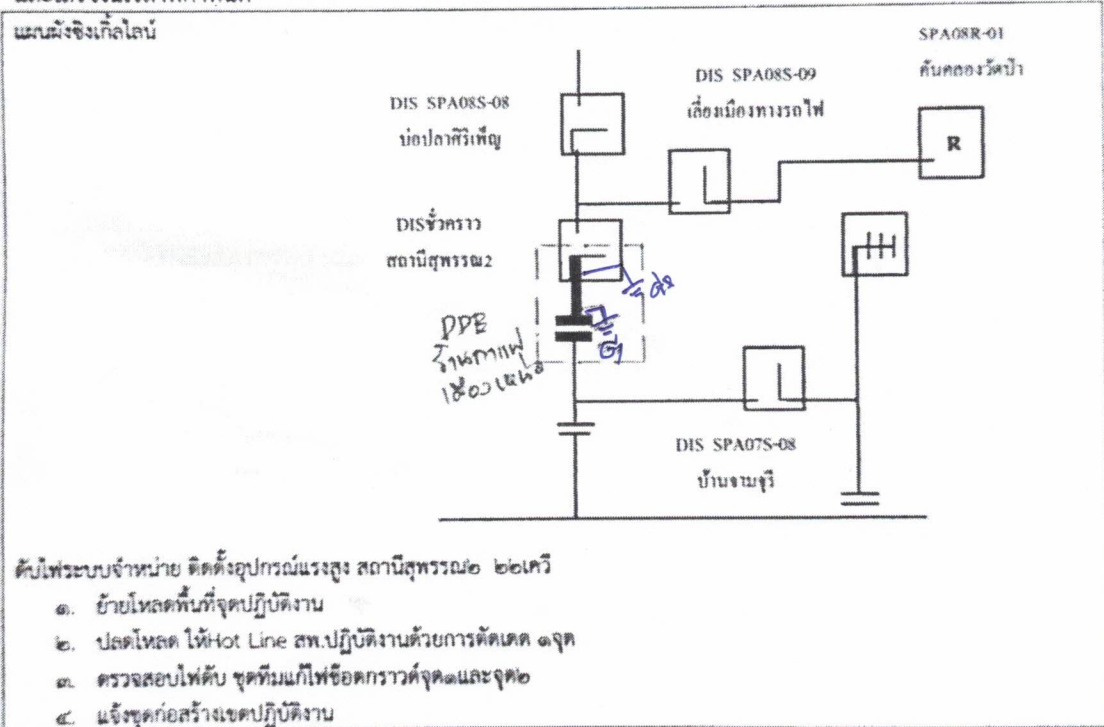

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

มจก.กฟง.สท.

๐๖
(นายชนกร สุวรรณประทีป)
พงษ.(สช.) มทบ.กฟง.สท.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๘๕-๕๖๖๕๗๙๘, ๑๘๖๕๕, ๑๘๖๖๐
