



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปง(บป.)๒๗๓๙/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล

ชื่อผู้ส่ง นายพัฒนา หงษ์อินทร์

วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.บป.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BPB 7	12 ต.ค. 2566	08.30 น.	12.00 น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดสายข้ามถนน	Dis BPB 7S-06 หน้าศิริสัมพันธ์	DPE 4 ฝั่งหมักที่ / จากบ้านป่าไร่	นายวิทยา เรือนสา
๒	BPB 9	12 ต.ค. 2566	08.30 น.	12.00 น.		Dis BPB 9S-03 โคเฮงหลี	Dis BPB 9S-04 แยกบ้านบางพัง	
๓	115 KV 5 YB-01	12 ต.ค. 2566	08.30 น.	12.00 น.		CB BPB 5 YB-01	CB 1 BPB 1YB-01	

ด้วยการไฟฟ้า.....อ.บ้านโป่ง.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า บ้านโป่ง ๒.....ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....๒.....แผ่น ดังนี้ (นำสายข้ามถนนที่ตัดไว้เมื่อวันที่ ๒ ต.ค.๖๖ ต่อเข้าระบบจำหน่ายดั้งเดิม)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิทยา เรือนสา ตำแหน่ง.....อ.ก.บป.กฟอ.บปง.....โทร.....๐๙๖-๙๑๖๒๕๑๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพัฒนา หงษ์อินทร์)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.บปง.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ BPB 7, 9 จาก BPB 7S-06, BPB 9S-03 ถึง DPE 4 ฝั่งหมักที่, BPB 9S-04, BPB 9S-02
ในวันที่ 12 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1469/66.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ 115kv. จาก BPB 5 YB ถึง 1BPC 1YB-01
ในวันที่ 12 ต.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต กลิ่นประทุม ประสานงานการขอตัดไฟกับ ท.ค.อิตยา วัฒนศิริ
3 ต.ค. 66

(นางสาวพิชิตา นนทศิริ)
ว.ค.ก.รทพ.ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบป.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บปง.

อ.ก.บช.(ก.๓), อ.ก.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสะพานเบิกไพร		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ต.ค. 66	เวลา 08.30 น.	ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บปง.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่ายนำสายแรงสูงเข้าระบบ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1496/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 5 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะ DDE โลว์ BPB 7 ปลอดภัย (ตามแผนผังแนบ)						
3	ตรวจสอบสถานะ DDE โลว์ BPB 9 ปลอดภัย (ตามแผนผังแนบ)						
4	แจ้ง บ.เบิกไพรโทรเจน ทำการหยุดขนานไฟ						
5	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
7	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
8	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
9	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
10	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
11	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ต.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	BPB05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
13	1BPC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ย้ายโหลด BPB 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BPB 5						
15	BPB05S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ไพรซีนี
16	BPB09S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
17	ย้ายโหลดสถานี หนองปลาหมอ , บ.เบิกไพรโครเจน ไปจ่ายจากสถานี โทธาราม 2						
18	NOM01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
19	1BPC01YB-01	สับ	ปลด		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	1BPC01YS-01	สับ	ปลด		BPC		- ไบมิท 115 เควี
21	1BPC01YS-02	สับ	ปลด		BPC		- ไบมิท 115 เควี
22	ตรวจสอบ SF6 BPB9S-06 เทศบาลเบิกไพร ให้อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน						
23	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
24	BPB09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ไตเฮงหลี
25	BPB07S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS รร.ศิริสัมพันธ์
26	BPB09S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS ก่อนแยกบางฟัง(ล่าง)
27	BPB05YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BPB05YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ใบมิต 115 เควี
29	BPB05YS-03	สับ	ปลด		BPB		- ใบมิต 115 เควี
30	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
31	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G1						
32	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G2						
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G3						
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G4						
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G5						
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G6						
37	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ข้อตกลงราวด์ จุด G7						
38	เมื่อไฟฟ้านำงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
39	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
40	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
42	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
43	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
44	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
45	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
46	PTS03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		ต.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	NOM01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
48	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
49	BP2-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
50	BP2-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
51	BPB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
52	BPB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
53	BPB09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		-
54	NOM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NOM		-
55	NOM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
56	NOM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
57	NOM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		-
58	PTS03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		ต.1		- เบรกเกอร์ 115 เควี
59	NOM01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
60	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G1						
61	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G2						
62	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G3						
63	แจ้งหน่วยงาน ปลดข้อตกลงราวด์ จุด G4						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
64	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
65	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
66	แจ้งหน่วยงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G7						
67	ตรวจสอบสถานะ DDE 1 โลင်း BPB 7 เชื่อมเข้าเรียบร้อย (ตามแผนผังแนบ)						
68	ตรวจสอบสถานะ DDE 2 , DDE 3 โลင်း BPB 9 เชื่อมเข้าเรียบร้อย (ตามแผนผังแนบ)						
69	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
70	แจ้งหน่วยงาน ทำการปลดโหลดหม้อแปลงก่อนทำการเชื่อม DDE 4 สนามกีฬาเทศบาลเบิกไพร						
71	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE 4 สนามกีฬาเทศบาลเบิกไพร เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
72	เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE 4 สนามกีฬาเทศบาลเบิกไพร เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
73	BPB05YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
74	BPB05YS-03	ปลด	สับ		BPB		- ใบมีด 115 เควี
75	BPB05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
76	BPB09S-03	ปลด	สับ		บปง.		DIS ไตเฮงหลี
77	ย้ายโหลดสถานี หนองปลาหมอ , บ.เบิกไพรโครเจน กลับจากสถานี โพรธาราม 2						
78	1BPC01YS-01	สับ	ปลด		BPC		- ใบมีด 115 เควี
79	1BPC01YS-02	สับ	ปลด		BPC		- ใบมีด 115 เควี
80	1BPC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
81	NOM01YB-01	สับ	ปลด		NOM		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	ย้ายโหลด BPB 7 บางส่วนกลับจาก NOM 1						
83	BPB09S-06	ปลด	สับ		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
84	BPB07S-06	ปลด	สับ		บปง.		DIS รร.ศิริสัมพันธ์
85	BPB07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 บ.ชูเท็ค
86	ย้ายโหลด BPB 9 บางส่วนกลับจาก NOM 5						
87	BPB09S-04	ปลด	สับ		บปง.		DIS ก่อนแยกบางฟังก(ล่าง)
88	BPB09S-14	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปง.		DIS มณีจรัสแสง
89	BPB09S-06	สับ	ปลด		บปง.	SCADA	SF6 หน้าเทศบาลเบิกไพร
90	ย้ายโหลด BPB 9 บางส่วนกลับจาก BPB 5						
91	BPB09S-07	ปลด	สับ		บปง.		SF6 ซอยริมแม่น้ำ
92	BPB05S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปง.		SF6 ไพรชนีย์
93	BP2-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
94	BP2-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
95	BPB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
96	BPB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
97	BPB09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		-
98	NOM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NOM		-
99	NOM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
100	NOM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-
101	NOM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NOM		-

แผนผัง Singleline Diagram แสดงพื้นที่ดับกระแสไฟและจุดช็อตกราวนด์

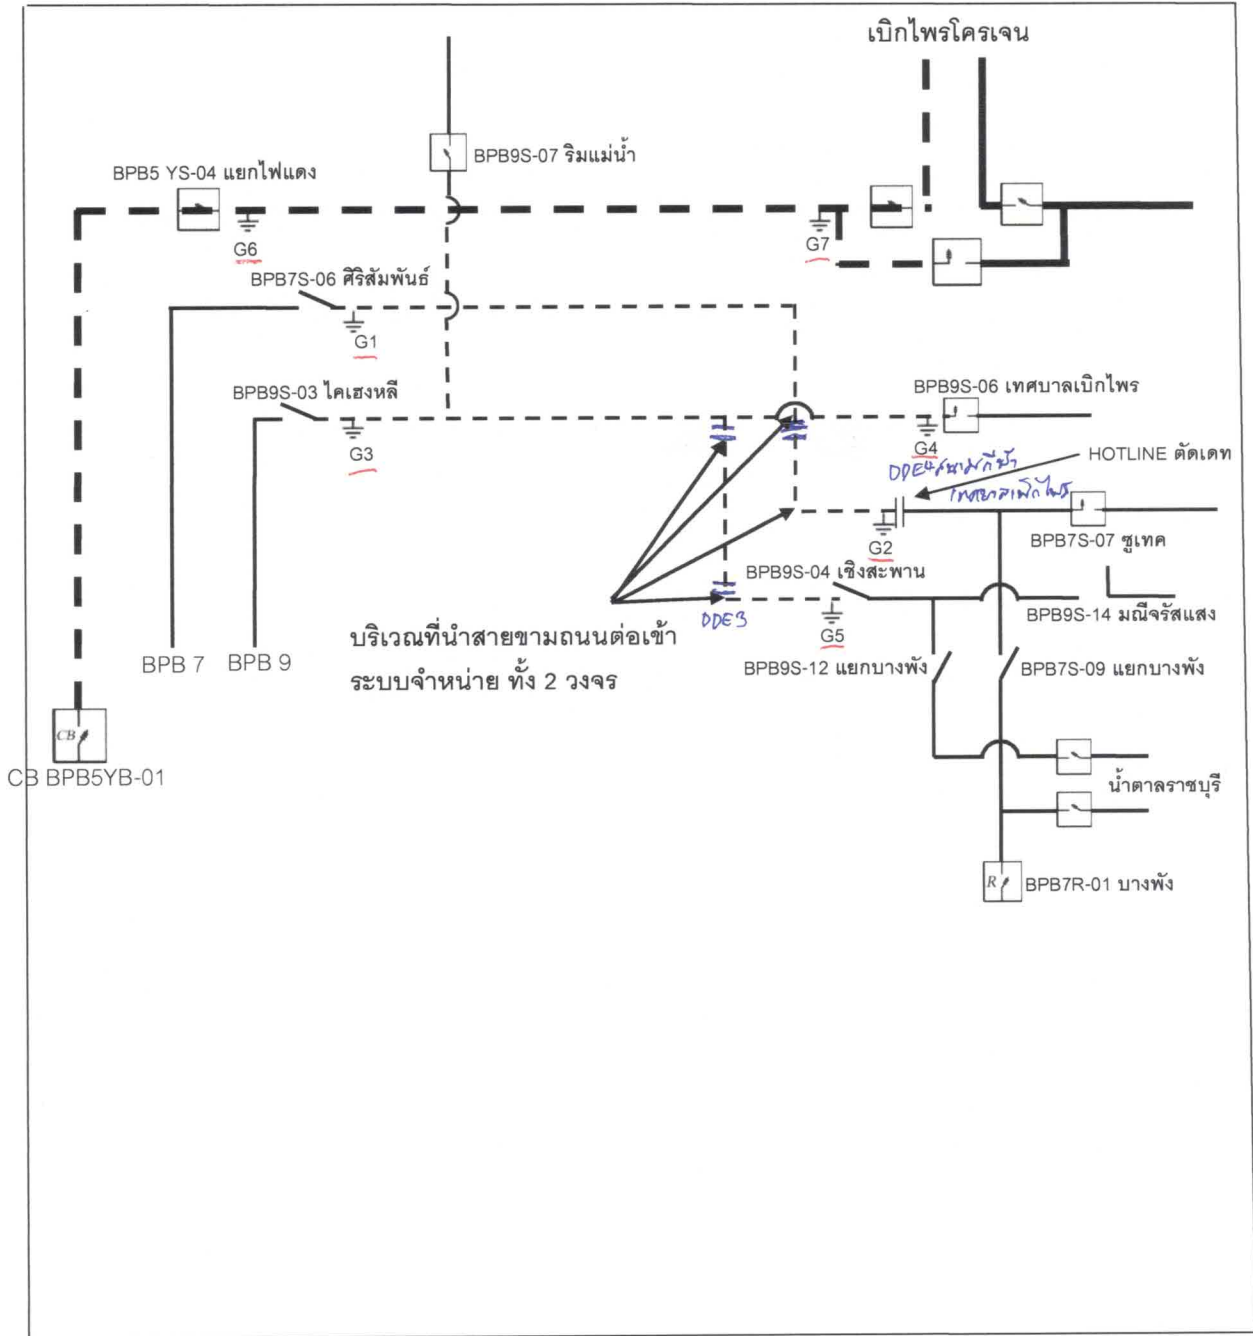

หมายเหตุ

- เส้นแสดงพื้นที่ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน
- ⊥ ตำแหน่งจุด Short Ground
- || จุดตัดเดท

ผู้ควบคุมงาน นายวิทย์...เรื่อนส่า
 ผู้ Short Ground นายวิรัชพงษ์ สวัสดิ์คณา
 จป. นายพลกิจ จงวัชรสถิตย์

Signature
