



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ .. ก.๓.นฐ.(นบ) ๑๒๓๔ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมหมาย ชื่นดวง  
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผ.จก. กฟล.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟล.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๒ ตามแผนผัง  
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPU08	12 พฤศจิกายน 2564	8.30 น.	15.00 น.	รื้อถอนเสา สายแรงสูง เพื่อจ่ายผ่าน UG บริเวณริมสนามนกเขา	DIS ชด. หน้า บ้าน ณ.ฐ	NPU8S-04	นายชัยศ โทธิริชต์ ชผ. ปบ.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .. ช.พรชัยโกษา น.5 ต.วังตะก

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยศ โทธิริชต์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟล.นครปฐม โทร ๐๘๔-๖๖๕๕๕๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟล. (หากมีโอกาสชำระ ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำระ ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ  
๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟล.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟล.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NPU08 จาก Dis ชด. หน้า ณ.ฐ. ถึง NPU8S-04  
ในวันที่ 12 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1473/64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดร.ศิริวิไล คุ้มขจร ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชัยศ โทธิริชต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟล. นฐ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายดร.ศิริวิไล คุ้มขจร  
ว.ค.ก.๓ กฟล. นฐ. อ.พ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณสนามนกเขา (NPU08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 พ.ย. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	15.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นธ.	งานที่ทำ	ร้อยสายแรงสูงเพื่อจ่ายผ่าน UG		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1473/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เที่ยงผดุง			วันที่	6 พฤศจิกายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 พฤศจิกายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
4	DIS.ชค.ไลน์ NPU08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS ชั่วคราว หน้าบ้าน ณ.ธ.
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Shot Ground จุด G1						
7	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Shot Ground จุด G2						
8	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Shot Ground จุด G1 ออก						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Shot Ground จุด G2 ออก						
13	NPU08VB 01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟผ่าน UG (หมายเหตุ AC และเช็คเฟสแล้ว เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64)						
15	DIS.ชค.ไลน์ NPU08	ปลด	สับ		นธ.		DIS ชั่วคราว หน้าบ้าน ณ.ธ.
16	NPU08S-16	ปลด	สับ		นธ.		DIS UG สนามนกเขา
17	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนผังขมอะปฏิบัติงาน

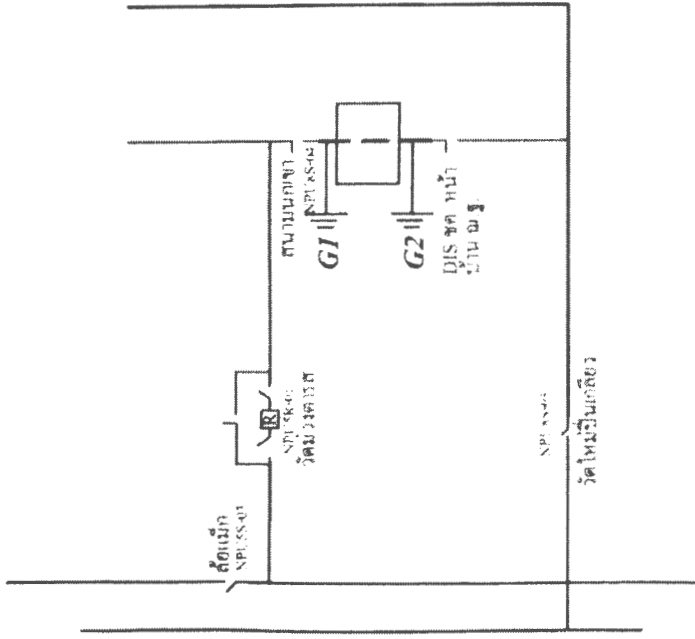


----- พันทัดไฟ

□ พนปฏิบัติงาน

≡ จุดช้อตกราวด์

แผนผังหลังก่อสร้างเสร็จ

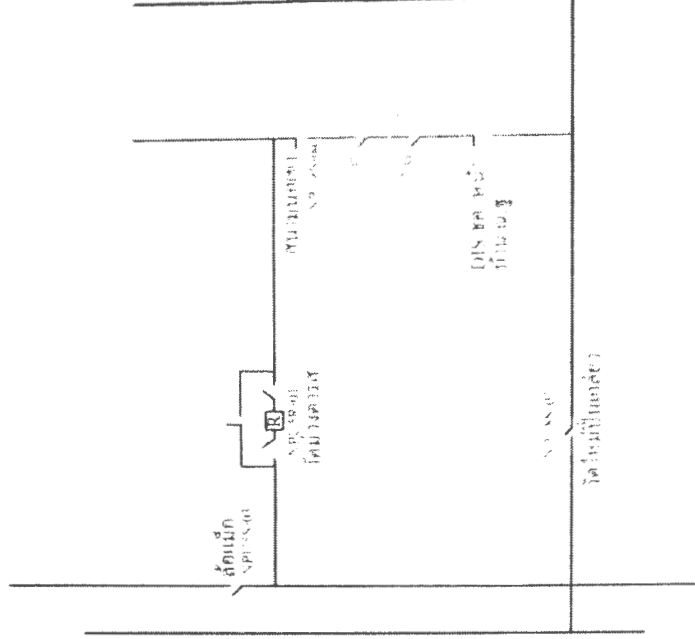

หมายเหตุ AC และเซ็กเฟส แล้วตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2564
