



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บปม.(กป.)-๑๑๓๗/๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์

ชื่อผู้ส่ง นายศาตวัต ควรประกอบกิจ

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.บางปลาม้า ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขสายแรงสูงขาด **ฉุกเฉิน** บ้านสูตร ที่ BAM๐๒R-๐๑ ถึง จุดตัด เดช A วงจร BAM02 สถานีไฟฟ้าบางปลาม้า ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

| ที่ | ฟีดเดอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|----------------------------|-----------|--------------|--------------------|
| ๑. | BAM๐๒ | ๕ ต.ค. ๒๕๖๖ | ๑๓.๐๐ น. | ๑๖.๓๐ น. | แกะไขสายแรงสูงขาด บ้านสูตร | BAM๐๒R-๐๑ | จุดตัด เดช A | นายวีระพงษ์ ลออ่อน |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสูตร

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวีระพงษ์ ลออ่อน ตำแหน่ง พชง.๕ โทร. ๐-๙๗๒๑๑๒-๗๔๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายศาตวัต ควรประกอบกิจ)
ผจก.กฟส.อ.บางปลาม้า

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM02 จาก BAM02R-01 ถึง จุดตัด DDE A
ในวันที่ ๕ ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 13.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1495/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ _____ ฟีดเดอร์ _____ จาก _____ ถึง _____
ในวันที่ _____ ตั้งแต่เวลา _____ น. ถึง _____ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ _____

พนักงานศูนย์ฯ นาย จิรวีวัฒน์ แก้วสมจิณ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย วีระพงษ์ ลออ่อน
4 ก.ค. 66

(นาย จิรวีวัฒน์ แก้วสมจิณ)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ศ.ร. ๒๒๒

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี _____)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

| | | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------------|-----------------------------|---------------|--|
| 1. สถานที่ทำงาน | บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านท่ากระบือ | | | | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 5 ต.ค. 66 | เวลา | 13.00 น. | ถึง | 16.30 น. | |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟส.บปม. | งานที่ทำ | แก้ไขสายขาด | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1475/2566 | | |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายจิรวัดน์ แก้วสมนึก | | | วันที่ | 4 ตุลาคม 2566 | |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 4 ตุลาคม 2566 | |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | | วันที่ | 4 ตุลาคม 2566 | |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | <ol style="list-style-type: none"> 1. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ, นางสาวพิชชา (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนช, นายวรรณพงษ์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|----------------------------|--|--------------------------------------|---------------------|------|--------------|------------|------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | BAM02R-01 | Normal | Nonreclosing | | | บปม. | R บ้านสูตร |
| 3 | ตรวจสอบจุดตัด DDE จุด A บ้านเสาธง มีการตัด DDE ไว้แล้ว | | | | | | |
| 4 | เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน | | | | | | |
| 5 | BAM02R-01 | สับ | ปลด | | | บปม. SCADA | R บ้านสูตร |
| 6 | ใบมีดด้าน Load | สับ | ปลด | | | บปม. | R บ้านสูตร |
| 7 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ | | | | | | |
| 8 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G1 | | | | | | |
| 9 | แจ้งพนักงานเทสไฟ ข้อตกลงจุด จุด G2 | | | | | | |
| 10 | เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการเทสไฟ และข้อตกลงจุด ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย | | | | | | |
| 11 | แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้ | | | | | | |
| สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า | | | | | | | |
| 12 | เมื่อพนักงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ | | | | | | |
| 13 | แจ้งพนักงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G1 | | | | | | |
| 14 | แจ้งพนักงานปลด ข้อตกลงจุด จุด G2 | | | | | | |
| 15 | ใบมีดด้าน Load | ปลด | สับ | | | บปม. | R บ้านสูตร |
| 16 | BAM02R-01 | ปลด | สับ คง Nonreclosing | | | บปม. SCADA | R บ้านสูตร |
| 17 | จุดตัด DDE จุด A บ้านเสาธง ยังไม่มีการเชื่อมต่อประสาน HL (จ่ายไฟจาก BAM02R-01 ไปชน DDE จุด A บ้านเสาธง) | | | | | | |
| 18 | BAM02R-01 | Nonreclosing | Normal | | | บปม. | R บ้านสูตร |
| สิ้นสุด Switching ทั้งหมด | | | | | | | |

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ดับไฟ เพื่อปฏิบัติงาน ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขสายแรงสูงขาด บ้านสูตร

ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น.

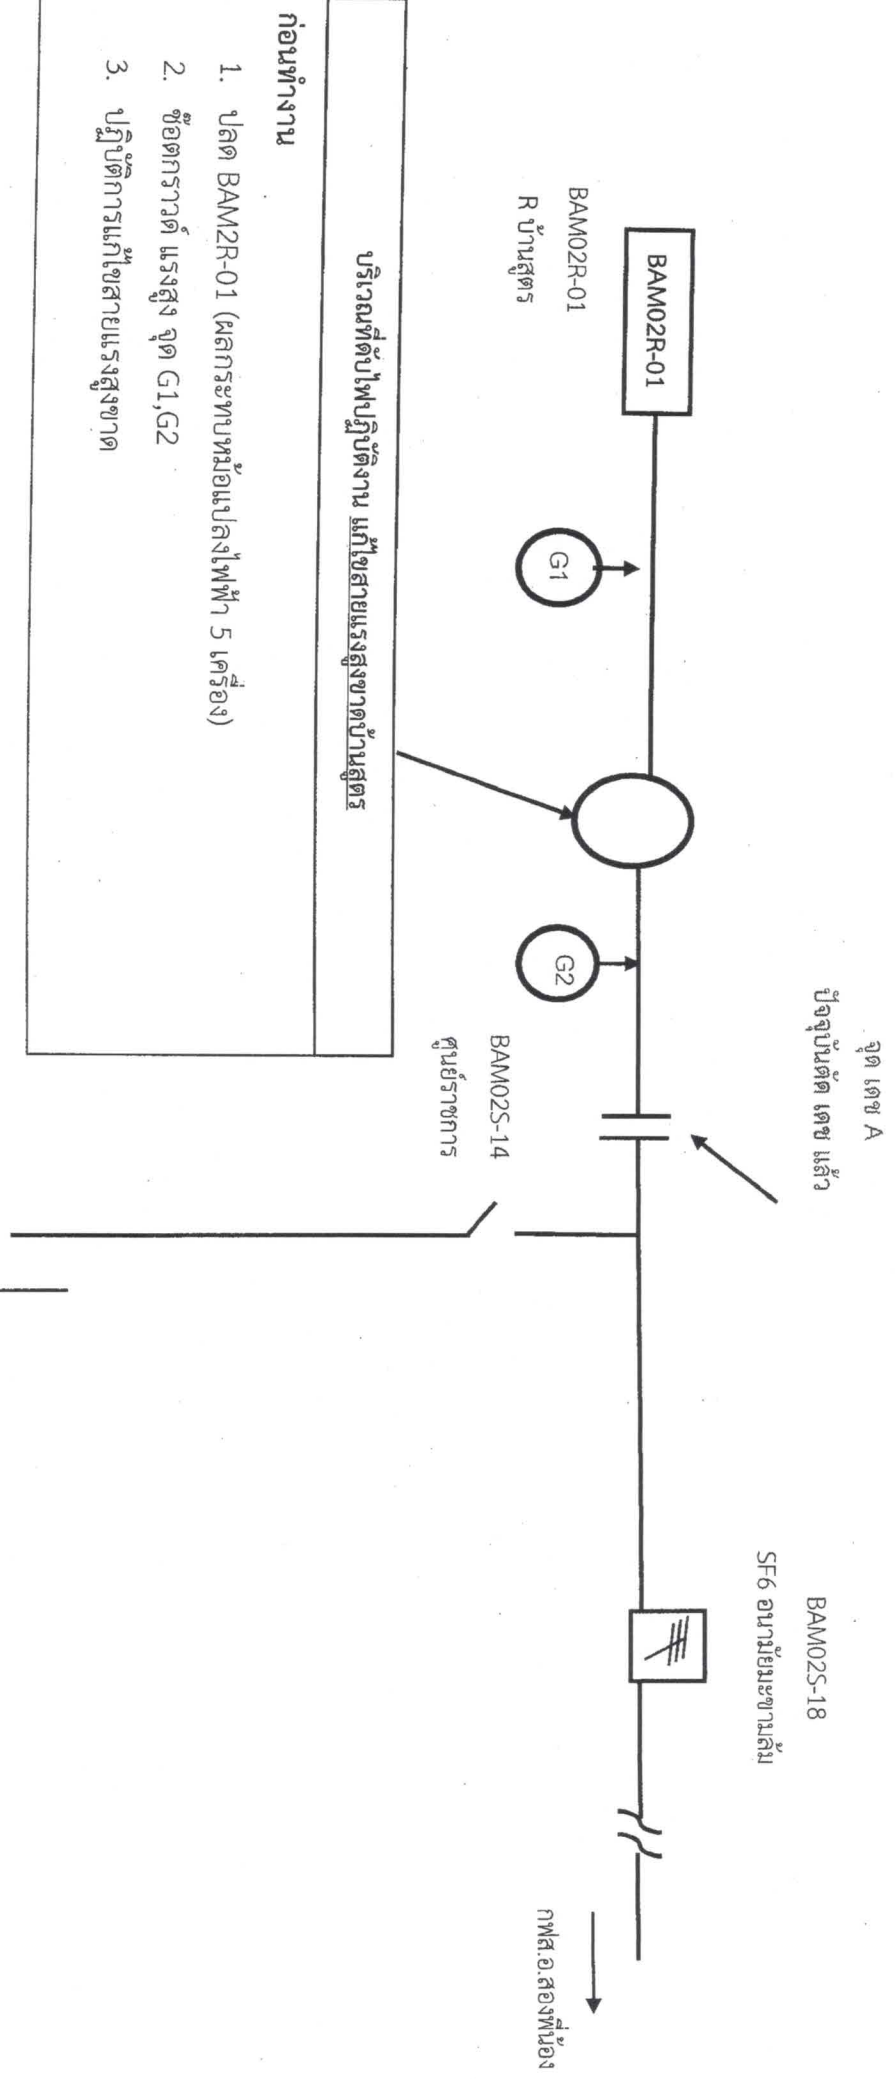

บริเวณที่ดับไฟปฏิบัติงาน แก้ไขสายแรงสูงขาดบ้านสูตร

ก่อนทำงาน

1. ปลด BAM2R-01 (ผลการกระทบหม้อแปลงไฟฟ้า 5 เครื่อง)
2. ข้อตรวจวัด แรงสูง จุด G1,G2
3. ปฏิบัติการแก้ไขสายแรงสูงขาด
