



ด่วนมาก

Switching Deadline.
วันที่ 12 พ.ย. 6๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๒๕๕๘ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวณภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แม่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB3YB	๑๓ พ.ย. ๖๔ ๑๕ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐ -	-- ๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย นครชัยศรี-ห้วยพลู (งานถนนมอเตอร์เวย์)	-NCB3YB	-DDE. ตลาดนัด	นายวิวัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑๕๔๔๙๗๘๑
๒.	NCB2VB	๑๓ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		- NCB2VB	- NCB2S-01 -Disชั่วคราว หน้าTUW.	
๓.	NCB8VB	๑๓ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		-SF6 ชั่วคราว มอเตอร์เวย์	-SF6ชั่วคราว ตรงข้ามวัด สำโรง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย (โครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวณภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

รวม 22 ครัว ทับเป

วันที่ 13 พ.ย. 6๗ วันที่ 1๗ พ.ย. 6๗

พื้นที่ดับไฟในบริเวณ



ด่วนมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นช.(ปบ.) ๒๔๕๓ /๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

Switching Deadline
วันที่ 12 พ.ย. 64

วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCB
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCB3YB	๑๔ พ.ย. ๖๔ ๑๕ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐	ย้ายแนวระบบจำหน่าย นครชัยศรี-ห้วยพลู (งานถนนมอเตอร์เวย์)	-NCB3YB	-DDE. ตลาดนัด	นายวิวัฒน์ นาคสมัย ๐๘๑๙๔๔๙๗๘๑
๒.	NCB2VB	๑๔ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		- NCB2VB	- NCB2S-01 -END - NCB2S-02 - NCB2S-03 -Dis ชั่วคราว หน้า TUW	
๓.	NCB8VB	๑๔ พ.ย. ๖๔	๐๗.๐๐	๑๗.๐๐		-SF6 ชั่วคราว มอเตอร์เวย์	-SF6ชั่วคราว ตรงข้ามวัด สำโรง -END	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) โครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ ชุมชนข้างโรงงาน TUW

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCB3YB-01 จาก NCB3YB-01 ถึง DDE ๓๓๑๑๓๓
ในวันที่ 13-15 พ.ย. 6๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1476
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ NCB02 จาก NCB2VB-01 ถึง Dis ๕๐. ๒๒๖.๖. TUN
ในวันที่ 13 พ.ย. 6๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ NCB01 จาก SFE ๕๐. ๒๐๓๓๐5๖ ถึง SFE ๕๐. ๒๐๓๓๐๖๖
ในวันที่ 13 พ.ย. 6๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 4 ฟีดเดอร์ NCB02 จาก NCB2VB-01 ถึง NCB2S-03
ในวันที่ 14 พ.ย. 6๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟีดเดอร์ NCB01 จาก SFE ๕๐. ๒๐๓๓๐๖๖ ถึง 1/๕๖๖๖๖
ในวันที่ 14 พ.ย. 6๙ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กฟ๕๐๓๖ ๕๖. ประธานงานการขอดับไฟกับ ๒๐๘ ๕๖๓๓ สหภาพ
10 พ.ย. 6๙

กฟ๕๐๓๖ ๕๖.
(๒๐๘ กฟ๕๐๓๖ ๕๖.)
๑๕๐.๗ ๓๓๔ ๒๖.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟ๑.๔๕. กฟ๑.๔๕.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 5 แผ่น
แผนผังแนบ 6 แผ่น

ผจพ. 1,2 (สถานี ๒๐๕๖๕๖๕, ๒๐๕๖๕๖๕ 1)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณถนนสหกรณ์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-พ.ย.-64	เวลา	07.00 น.	ถึง	15-พ.ย.-64	เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	รื้อถอนสาย Overhead พร้อมก่อสร้าง วงจร Detour Line ให้กรมทาง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1476/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 พฤศจิกายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	
	2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์				(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	
	3. นายภุชฉณะศักดิ์, นายศุภวัฒน์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	สวิตชิงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 07.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ให้ Hotline ปลดสาย ดับไฟวันที่ 13 พ.ย. 64 - 15 พ.ย. 64)						
2	สายส่ง 115 เควี ดับไฟไว้ล่วงหน้าเพื่อย้ายแวนวันที่ 14 พ.ย. 64 การทำงานวันที่ 13 พ.ย. 64 ไม่มีงานเกี่ยวกับสายส่ง 115 เควี						
3	ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานะการจ่ายไฟก่อนทำการ Switching						
4	ย้ายโหลด วงจร NCB07 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร SAC09						
5	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 17.8 MW
6	NCB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 3 MW
7	SAC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- 17.7 MW
8	SAC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC		- 2.2 MW
9	NCB07S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 วัตต์ตุ๊กตา
10	NCB07S-13	ปลด	สับ		นช.		DIS สี่แยกไฟแดง
11	NCB07S-07	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
12	NCB07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 วัตต์ตุ๊กตา
13	SAC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
14	SAC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- -
15	ย้ายโหลด วงจร NCB06 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร NCA06						
16	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 17.7 MW
17	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- 2.2 MW
18	NCB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 3.7 MW
19	NCB06S-09	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
20	NCB06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
21	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
22	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
23	ย้ายโหลด วงจร NCB02 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร NCB06						
24	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- 15.6 MW
25	NCB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 7.5 MW
26	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนานบัส
27	NCB02S-08	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ธนาคาร ธกส.
28	NCB02S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ท่าทรายถนอมชัย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	NCB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
30	ย้ายโหลด วงจร NCB02 บางส่วนไปรับไฟจาก วงจร NCB07						
31	NCB02S-06	ปลด	สับ		นช.		DIS ป้อมตำรวจ
32	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
33	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
34	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
35	ย้ายโหลด วงจร NCB08 ไปรับไฟจาก วงจร NCB07 ผ่าน วงจร NCB02						
36	NCB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- 3 MW
37	NCB02S-02	ปลด	สับ		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
38	SF6 ชั่วคราว NCB08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 ตรงข้ามวัดสำโรง
39	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		-
40	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 07.00 น.						
41	ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี						
42	DIS ชั่วคราว NCB02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS หน้า TUW
43	SF6 ชั่วคราว NCB08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 มอเตอร์เวย์
44	NCB02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
45	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี ให้ กฟอ.นช. ทราบ						
46	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
47	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
48	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
49	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
50	NCB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
51	NCB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
52	เมื่อพร้อมดับไฟ สายส่ง 115 เควี เวลา 09.00 น.						
53	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี NCB03YB-01 อยู่สถานะปลด						
54	NPT04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
55	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
56	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ใบมีด 115 เควี
57	แจ้งสภาพจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ให้ กฟอ.นช. ทราบ						
58	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการปลด สายส่ง 115 เควี บริเวณตลาดนัด ออกได้ (โดย Hotline 115 เควี แบบมีไฟ)						
59	เมื่อ กฟอ.นช. ทำการปลด สายส่ง 115 เควี บริเวณตลาดนัด เสร็จเรียบร้อย						
60	NPT04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
61	วันที่ 13 พ.ย. 64 สายส่ง 115 เควี ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานใต้ไลน์ไม่มีงานเกี่ยวกับสายส่ง 115 เควี						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
62	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
63	ผังหลังปฏิบัติงานตามเอกสารแนบ 3						
64	NCB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
65	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G1						
66	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
68	NCB02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
69	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		-
70	SF6 ชั่วคราว NCB08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 มอเตอร์เวย์
71	NCB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
72	NCB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564							
73	สวิตซ์วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564						
74	งานที่ทำ						
	1. ย้าย Disconnecting Switch รหัส NCB02S-02 หน้า บริษัท TUV ไปติดตั้งตามผังเอกสารแนบ 6						
	2. รื้อถอน Disconnecting Switch ชั่วคราว หน้า บริษัท TUV						
	3. รื้อถอน Loadbreak Switch SF ₆ ชั่วคราว บริเวณตรงข้ามวัดสำโรง						
	4. นำ วงจร Detour Line 115 เควี และ ระบบ 22 เควี เข้าใช้งาน						
75	ตรวจสอบอุปกรณ์และสถานะการจ่ายไฟก่อนทำการ Switching						
76	NCB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
77	NCB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
78	NCB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
79	NCB02VB-01	สับ	ปลด		NCB		-
80	NCB02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS หน้า บ.TUV
81	NCB02S-02	สับ	ปลด		นช.		DIS ตรงข้ามวัดสำโรง
82	SF6 ชั่วคราว NCB08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 มอเตอร์เวย์
83	NCB02S-01	สับ	ปลด		นช.		DIS POT HEAD F.2
84	แจ้งพื้นที่ดับไฟระบบจำหน่าย 22 เควี และสายส่ง 115 เควี ให้ กฟอ.นช. ทราบ						
85	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G3						
86	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ ระบบจำหน่าย 22 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G4						
87	เมื่อทำการ Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
88	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G1						
89	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการ Test ไฟ สายส่ง 115 เควี ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย ให้ทำการ Short Ground จุด G2						
90	เมื่อทำการ Short Ground สายส่ง 115 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
91	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้สามารถปฏิบัติงานได้						
92	NCB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
93	NCB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
94	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และทำการ Check Phase ระบบจำหน่าย 22 เควี						
95	ผังหลังปฏิบัติงานตามเอกสารแนบ 6						
96	NCB08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
97	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G1						
98	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	เมื่อทำการปลด Short Ground สายส่ง 115 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
100	แจ้ง กพอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G3						
101	แจ้ง กพอ.นช. ให้ทำการปลด Short Ground จุด G4						
102	เมื่อทำการปลด Short Ground ระบบจำหน่าย 22 เควี จุดปฏิบัติเสร็จเรียบร้อย เวลา ผู้แจ้ง.....						
103	NCB02S-01	ปลด	สับ		นช.		DIS POT HEAD F.2
104	NCB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		-
105	SF6 ชั่วคราว NCB08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 มอเตอร์เวย์
106	ทำการ Check Phase ระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร NCB02 ที่ Disconnecting Switch รหัส NCB02S-03 หน้า บริษัท TUW						
107	NCB07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		-
108	เมื่อทำการ Check Phase วงจร NCB02 ที่ Disconnecting Switch รหัส NCB02S-03 หน้า บริษัท TUW เสร็จเรียบร้อย						
109	ทำการ Check Phase ระบบจำหน่าย 22 เควี วงจร NCB08 ที่ Disconnecting Switch รหัส NCB02S-02 ช่างชวย บริษัท TUW						
110	เมื่อทำการ Check Phase วงจร NCB02 ที่ Disconnecting Switch รหัส NCB02S-02 ช่างชวย บริษัท TUW เสร็จเรียบร้อย						
111	NCB08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		-
112	ทำการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี						
113	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
114	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ใบมีด 115 เควี
115	NCB03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
116	ทำการจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ถึงวันที่ 15 พ.ย. 64						
117	ย้ายโหลด วงจร NCB02 กลับจาก วงจร NCB07						
118	NCB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
119	NCB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCB		- -
120	NCBBVB-01	ปลด	สับ		NCB		- ขนानบัส
121	NCB02S-03	ปลด	สับ		นช.		DIS หน้า บ.TUW
122	NCB02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS ป้อมตำรวจ
123	ย้ายโหลด วงจร NCB07 กลับจาก วงจร SAC09						
124	SAC-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
125	SAC09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAC		- -
126	NCB07S-07	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 ตลาดไฟฟ้า
127	NCB07S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 วัดตุ๊กตา
128	NCB07S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นช.		DIS สี่แยกไฟแดง
129	NCB07S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นช.		SF6 วัดตุ๊กตา
130	SAC-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
131	SAC09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAC		- -
132	NCB07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
133	ย้ายโหลด วงจร NCB02 กลับจาก วงจร NCB06						
134	NCB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- -
135	NCB02S-15	ปลด	สับ		นช.		DIS ท่าทรายถนอมชัย
136	NCB02S-08	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ธนาคาร ชกส.
137	NCBBVB-01	สับ	ปลด		NCB		- ขนานบัส
138	NCB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
139	NCB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
140	ย้ายโหลด วงจร NCB06 กลับจาก วงจร NCA06						
141	NCS-KT4A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
142	NCA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NCA		- -
143	NCB06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นช.		SF6 โรงสีสหกรณ์
144	NCB06S-09	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 ตรงข้ามท่าตำหนัก
145	NCB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCB		- -
146	NCB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCB		- -
147	NCS-KT4A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
148	NCA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NCA		- -
สิ้นสุด Switching วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564							
149	สวิตซ์วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564						
150	เมื่อพร้อม เชื่อมสายส่ง 115 เควี เวลา 09.00 น.						
151	NPT04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
152	NCB03YB-01	สับ	ปลด		NCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
153	NCB03YS-01	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
154	NCB03YS-03	สับ	ปลด		NCB		- ไบมีด 115 เควี
155	แจ้งสภาพจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี ให้ กฟอ.นช. ทราบ						
156	แจ้ง กฟอ.นช. ทำการ Test ไฟสายส่ง 115 เควี ยืนยันไฟดับเรียบร้อย						
157	แจ้ง กฟอ.นช. ให้ทำการเชื่อม สายส่ง 115 เควี บริเวณตลาดนัด เข้าได้ (โดย Hotline 115 เควี แบบมีไฟ)						
158	เมื่อ กฟอ.นช. ทำการเชื่อม สายส่ง 115 เควี บริเวณตลาดนัด เสร็จเรียบร้อย						
159	NCB03YS-01	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
160	NCB03YS-03	ปลด	สับ		NCB		- ไบมีด 115 เควี
161	NPT04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน..... ย้ายแนวระบบจำหน่าย (งานถนนมอเตอร์เวย์ห้วยพลู)	
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน..... ย้ายแนวระบบจำหน่าย (งานถนนมอเตอร์เวย์ห้วยพลู)	
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน..... ๑๓ พ.ย ๖๔	เริ่มเวลา..... ๐๗.๐๐ น. จ่ายไฟคืนเวลา..... ๑๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก..... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี	
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	
ชื่อ..... นายวณภูมิ บำรุงศรี	ตำแหน่ง..... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘	ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... U-๒
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก..... นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์	
ตำแหน่ง..... พชง.๕ ผกร.กคค.(ก๓)	เบอร์โทรศัพท์มือถือ..... ๐๘๑-๔๔๔๔๗๘๑ ชื่อเรียกขานทางวิทยุ..... -
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว..... กฟภ.	
.....	
.....	
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า..... นายชลิต สีขาวขำ ผ.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)	
๒.ผู้รับข้อต่อสายลงดินชั่วคราวจุดที่๑..... หน้าโครงการมอเตอร์เวย์ ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๒	
จุดที่ ๒..... ตรงข้ามวัดสำโรง ผู้รับผิดชอบ..... นช.๐๔	จุดที่ ๓..... ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๔..... ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๕..... ผู้รับผิดชอบ.....
จุดที่ ๖..... ผู้รับผิดชอบ.....	จุดที่ ๗..... ผู้รับผิดชอบ.....
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่..... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๔ พร้อมแผนผัง Switching	
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ..... นางสาวปัทมา หงษ์สินี	
.....	
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง..... ราย ข้อทักท้วงคือ.....	
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง.....	
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรที่มีไฟฟ้า และวงจรที่ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อนวันระดมหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่..... ๑๐ พ.ย. ๖๔ สถานที่ประชุม..... ห้องประชุม ชั้น ๑	
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม..... รจก.(ท) , ผ.บ., ผ.กส., จ.ป. กฟอ.นช. กคค.(ก๓)	
.....	
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปคูหน้างานจริง พร้อมชี้แจ้งจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจ้งที่หน้างาน เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจ้งที่หน้างาน เมื่อวันที่..... ๑๐ พ.ย. ๖๔	
.....	

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบต่อสายดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

Check List

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีขออนุมัติปฏิบัติงานโดยวิธีดับไฟฟ้าแบบระดมชุดงาน

ชื่องาน... ย้ายแนวระบบจำหน่าย (งานถนนมอเตอร์เวย์ห้วยพลู)	
สถานที่ดับไฟฟ้าเพื่อทำงาน... ย้ายแนวระบบจำหน่าย (งานถนนมอเตอร์เวย์ห้วยพลู)	
วันที่ดับไฟเพื่อทำงาน... ๑๔ พ.ย ๖๔	เริ่มเวลา... ๐๗.๐๐ น. ... จ่ายไฟคืนเวลา... ๑๗.๐๐ น.
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก... การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนครชัยศรี	
ชื่อผู้อำนวยการงานระดม(เจ้าของพื้นที่งานระดม ดัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ และประสานงานดับ-จ่ายไฟฟ้า)	
ชื่อ... นายวณภูมิ บำรุงศรี	ตำแหน่ง... รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี
เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๓-๘๕๘๗๘๕๘	ชื่อเรียกขานทางวิทยุ... U-๒
ชื่อช่างผู้คุมงานหลัก... นายวิวัฒน์ นาคสมัย	
ตำแหน่ง... พชง.๕ ผกร.กคค.(ก๓)	เบอร์โทรศัพท์มือถือ... ๐๘๑-๙๔๔๙๗๘๑
ชื่อเรียกขานทางวิทยุ... -	
หน่วยงานที่เข้าร่วมทำงานในวันดังกล่าว... กฟภ.	
.....	
.....	
๑.ผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟฟ้า/จ่ายไฟฟ้า... นายชลิต สีขาวขำ ผ.บ.กฟอ.นครชัยศรี (U-๖)	
๒.ผู้รับผิดชอบสายลงดินชั่วคราวจุดที่ ๑... หน้าโครงการมอเตอร์เวย์(115) ผู้รับผิดชอบ... กคค.(ก๓)	
จุดที่ ๒ หน้า TUV(115) ผู้รับผิดชอบ... กคค.(ก๓)	จุดที่ ๓ โครงการมอเตอร์เวย์ ผู้รับผิดชอบ... นช.๐๔
จุดที่ ๔ หน้า TUV ผู้รับผิดชอบ... นช.๐๒	จุดที่ ๕ ผู้รับผิดชอบ...
จุดที่ ๖ ผู้รับผิดชอบ...	จุดที่ ๗ ผู้รับผิดชอบ...
๓.ขออนุมัติแผนงานดับไฟฟ้า ตามบันทึกที่... ก.๓ นช.(ปบ) /๒๕๖๔ ... พร้อมแผนผัง Switching	
๔.แจ้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ตามบันทึกที่.....	
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในวันดับไฟฟ้าทำงาน ชื่อ... นางสาวปพิชญา หงษ์สินี	
.....	
๕.ผลการแจ้งผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่หรือไม่	
<input checked="" type="checkbox"/> ไม่มีข้อทักท้วง <input type="checkbox"/> ข้อทักท้วง.....ราย ข้อทักท้วงคือ.....	
วิธีดำเนินการแก้ไข/ป้องกัน ข้อทักท้วง	
๖.ผู้อำนวยการงานระดม จัดประชุมชี้แจงมอบหมายงาน ชี้แจงวงจรมีไฟฟ้า และวงจรถดับไฟเพื่อปฏิบัติงานก่อน	
วันระดมหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่จัดประชุม เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> จัดประชุมแล้ว เมื่อวันที่... ๑๐ พ.ย. ๖๔ ... สถานที่ประชุม... ห้องประชุม ชั้น ๑	
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม... รจก.(ท) , ผ.บ. , ผ.กส.จ.บ. กฟอ.นช. กคค.(ก๓)	
.....	
๗.ผู้อำนวยการงานระดม ได้นำชุดงานไปดูหน้างานจริง พร้อมชี้แจงจุดอันตรายก่อนถึงวันดับไฟเพื่อปฏิบัติงานหรือไม่	
<input type="checkbox"/> ไม่ชี้แจงที่หน้างาน เหตุผล.....	
<input checked="" type="checkbox"/> ได้ชี้แจงที่หน้างาน เมื่อวันที่... ๑๐ พ.ย. ๖๔	
.....	

C๓ Safety CAP ๐๑

หมายเหตุ ผู้อำนวยการงานระดม จะต้องเป็นผู้ประสานงานดับไฟดังนี้

- ๑.เมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ดับไฟแล้ว ต้องสั่งการให้ผู้รับผิดชอบสายลงดินชั่วคราวตรวจสอบ แรงดัน เมื่อเห็นว่าไม่มีไฟแล้ว จึงให้ต่อสายลงดินชั่วคราว เสร็จแล้วจึงสั่งการให้ชุดก่อสร้างขึ้นปฏิบัติงานได้
- ๒.เมื่องานเสร็จแล้ว มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง ระเบียบร้อยของงาน เมื่อเห็นว่างานถูกต้องเรียบร้อย คนงานลงหมดแล้ว จึงแจ้งให้รถถอนสายต่อลงดินชั่วคราว เมื่อรถถอนสายต่อลงดินชั่วคราวและคนงานลงจากเสาแล้ว จึงให้จ่ายไฟฟ้า

NCB2YB
NCB3YB
NCB8
NCB2

NCB2S-01

NCB8S-01

NCB2S-02

NCB2S-03

DIS ชั่วคราว
โรงเปิด

ชั่วคราวสะพานข้ามมอเตอร์เวย์

ชั่วคราวตรงข้ามวัดสารโรง

ชั่วคราวหน้า TUV.

TUV.

NCA4YS-07

หน้าอเนกนัยสัมปทาน

NCA4YS-06


NCA4YS-05

NCA4Y


สถานะการจ่ายไฟ ก่อนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวขำ)
ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

10 กรกฎาคม 140 1

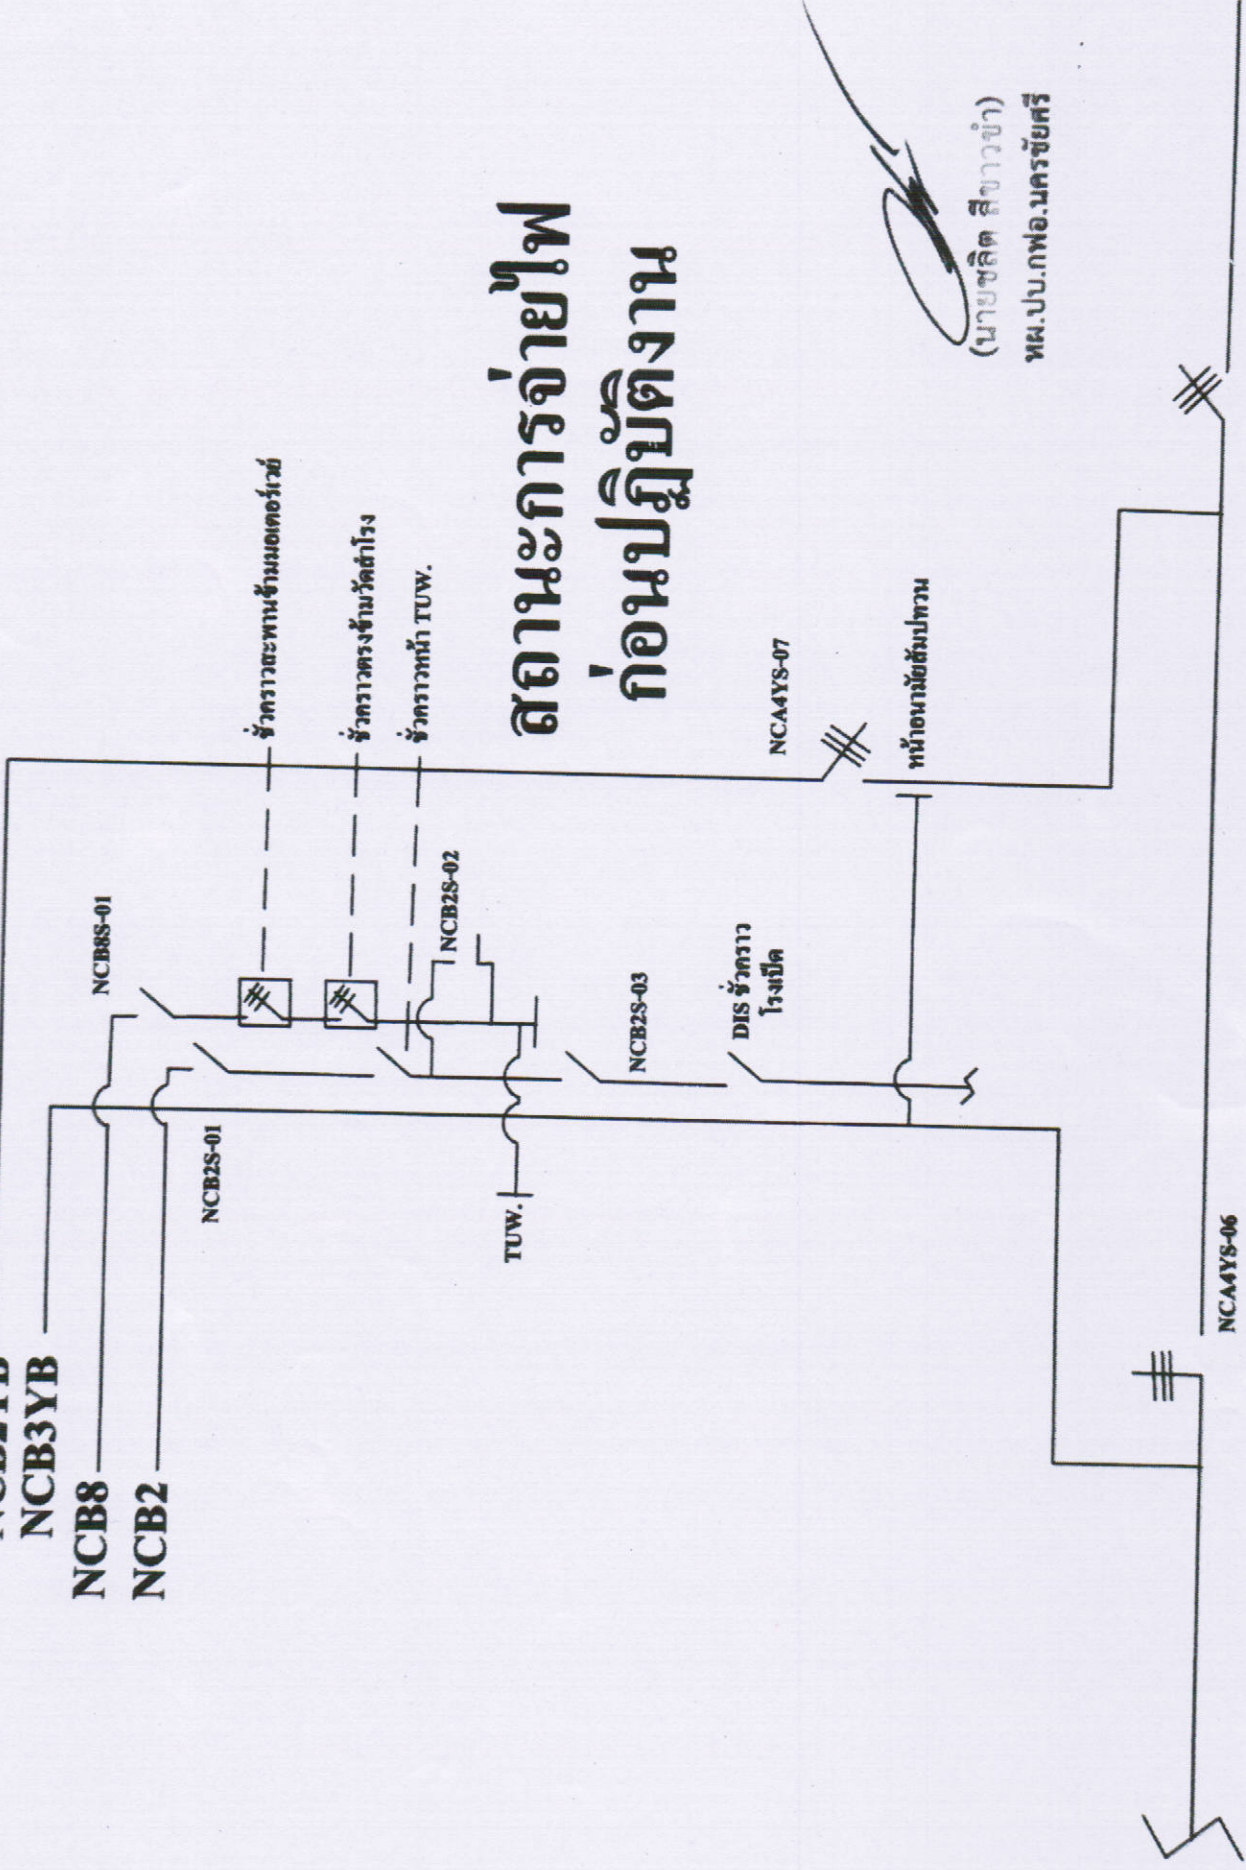

NCB2YB
 NCB3YB
 NCB8
 NCB2

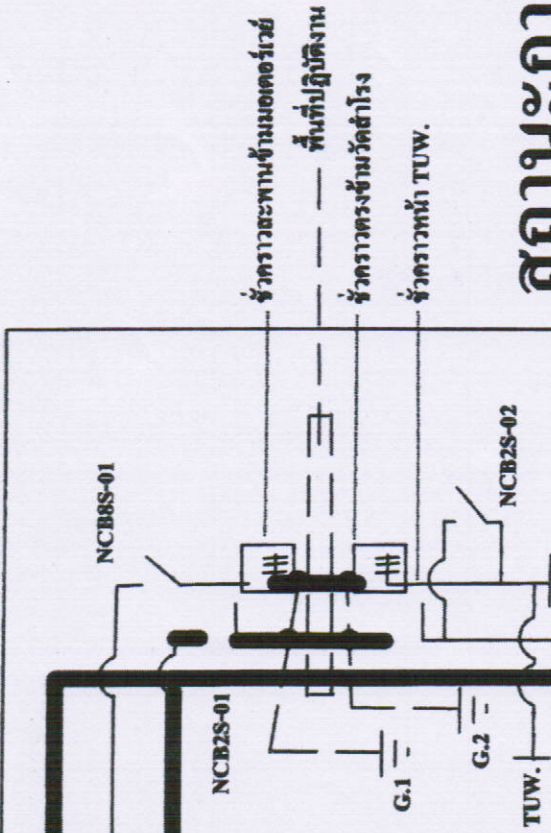

DDE. ตรงข้ามคาน้ำ
 Hot Line เปิด DDE. วันที่ 13 พย 64 เวลา 09.00น.

สถานะการจ่ายไฟ ตอนปฏิบัติงาน

(Signature)
 (นายชลิต สีขาวซ่า)
 พณ.ปป.กฟอ.นครชัยศรี

หมายเหตุ

- G.1 หน้าโครงการคอเคอร์เวจ ซ็อกทาวร์ 2 วงจร กฟอ.นครชัยศรี ดำเนินการ
- G.2 ตรงข้ามวัดค่าโรง ซ็อกทาวร์ 2 วงจร กฟอ.นครชัยศรี ดำเนินการ

NCA4YS-07

หน้าอนามัยสัมปทาน

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

107 สร 1144 2

NCB2YB

NCB3YB

NCB8

NCB2

NCB8S-01

NCB2S-01

TUW.

NCB2S-02

NCB2S-03

DDE. ตรงข้ามตึกนัด

Hot Line เชื่อม DDE. วันที่ 15 พย 64 เวลา 09.00น.

DIS ชั่วคราว
โรมบีด

NCA4YS-07

หน้าอนามัยสัมปทาน

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

สถานะการจ่ายไฟ หลังปฏิบัติงาน

ชั่วคราวสะพานข้ามมอเตอร์เวย์


ชั่วคราวตรงข้ามวัดสำโรง

ชั่วคราวหน้า TUW.

(นายชลิต สีขาวขำ)
ผ.ป.บ.กฟอ.นครชัยศรี

107525 1120 3

NCB2YB
NCB3YB
NCB8
NCB2

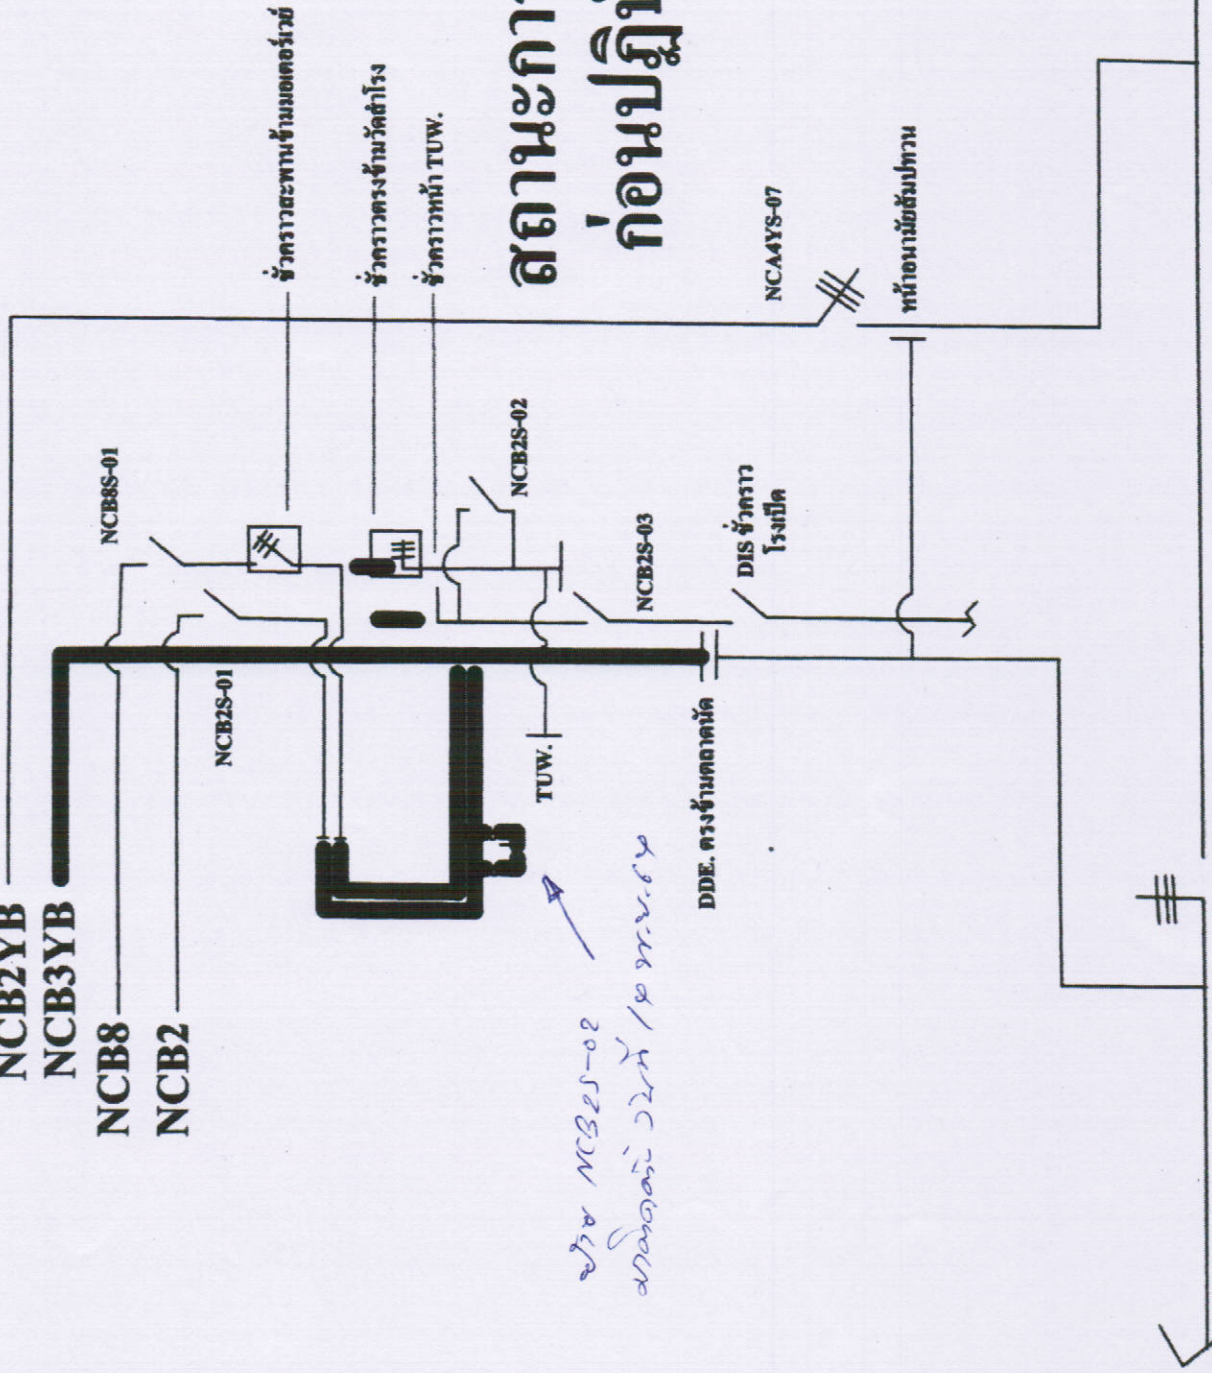

สถานะการจ่ายไฟ ก่อนปฏิบัติงาน

ขอ NCB2S-02
มาดัดแปลง 22KV / 10 KV. 6KV

(นายชลิต สีขาวง่า)
ทท.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี

10755142 S

NCB2YB
 NCB3YB
 NCB8
 NCB2

NCB8S-01

NCB2S-01

G.1

ตู้ควบคุมเข้ามอเตอรื

ตู้ควบคุมเข้ามอเตอรื

ตู้ควบคุมเข้ามอเตอรื

ตู้ควบคุมเข้ามอเตอรื

*ตู้ควบคุม NCB 2S-02
 ควบคุมเข้ามอเตอรื / 14.11.2560*

NCB2S-02

NCB2S-03

G.2

DDE. คุมเข้ามอเตอรื

DIS ควบคุม
 โรงบด

NCA4YS-07

หน้าอเนกประสงค์

หมายเหตุ

G.1 หน้าโครงการมอเตอรื อกค.(ก3) คำนึงการ


G.2 หน้าโรงงาน TUV. อกค.(ก3) คำนึงการ

G.3 หน้าโครงการมอเตอรื 2 วงจร อกค. 2 วงจร อกค. นกรชัยศรี คำนึงการ

G.4 หน้าโรงงาน TUV. อกค. อกค. นกรชัยศรี คำนึงการ

(นายชลิต สีขาวขำ)
 หน.ป.บ.กฟอ.นกรชัยศรี

สถานะการจ่ายไฟ ตอนปฏิบัติงาน

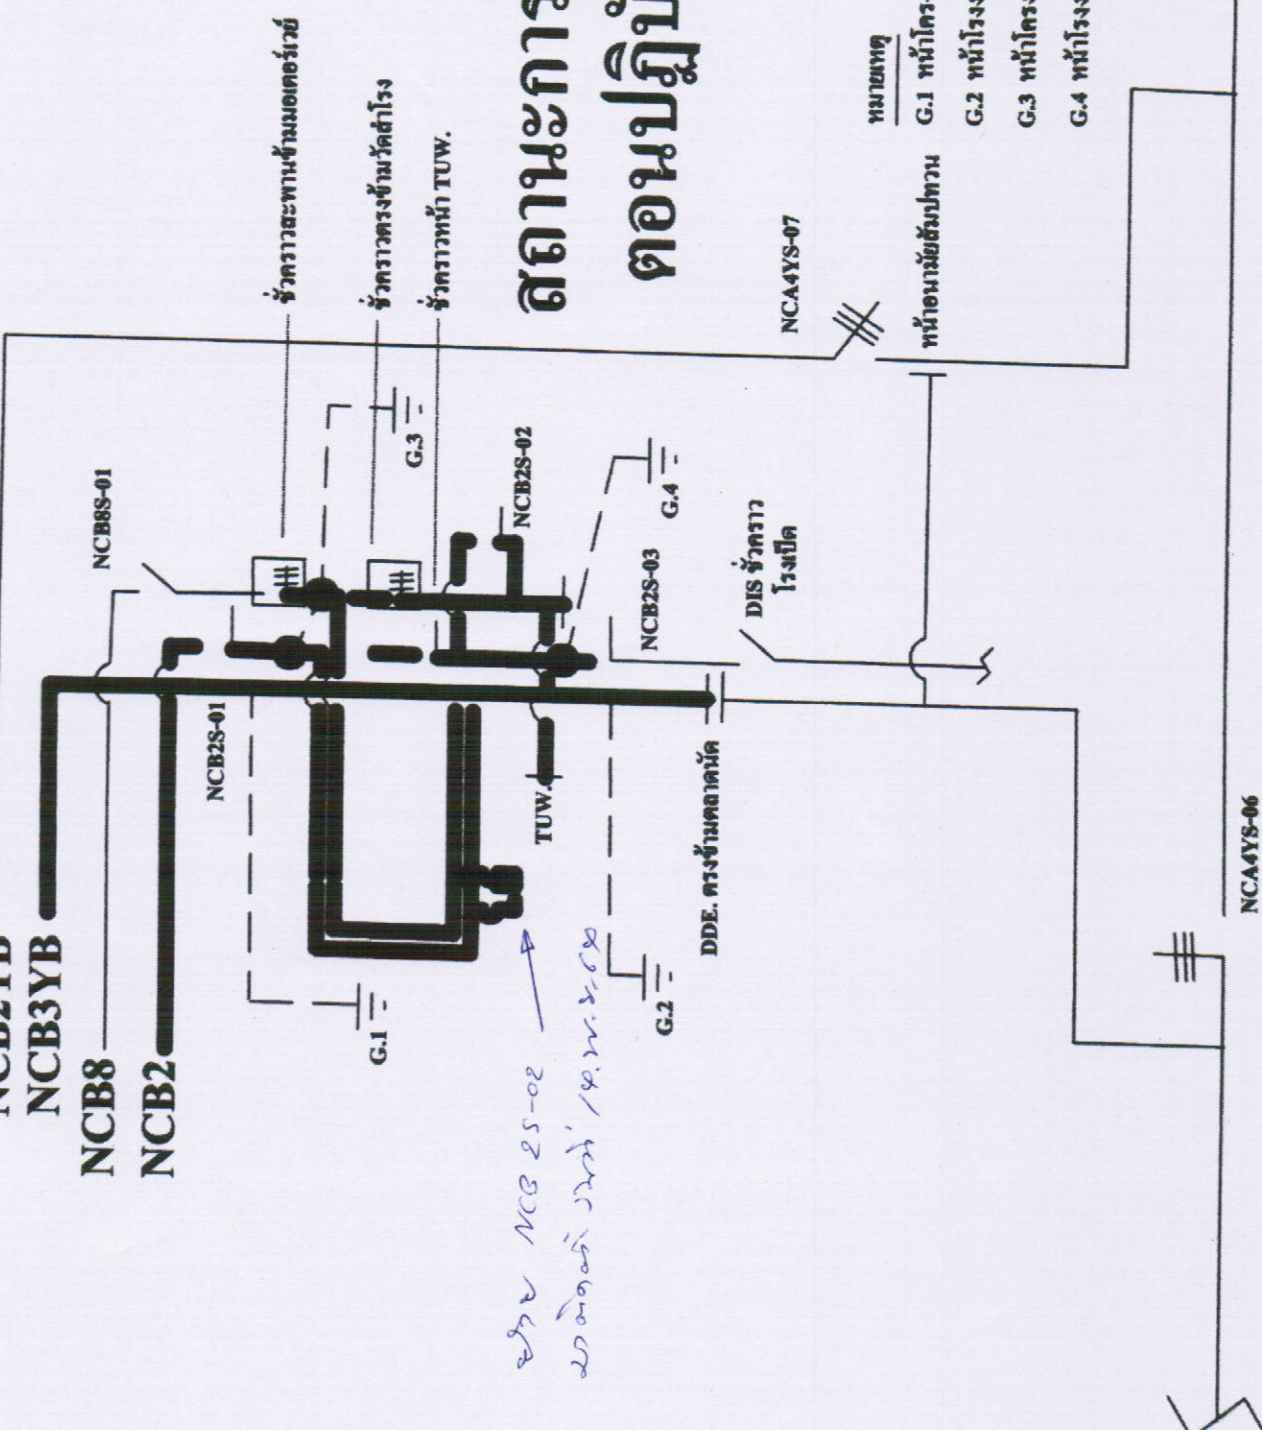

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

10/11/25 5

NCB2YB
NCB3YB
NCB8
NCB2

NCB2S-01
NCB8S-01

NCB2S-01

ชั่วคราวสะพานข้ามคอข่าย

สถานะการจ่ายไฟ หลังปฏิบัติงาน

DDE. ตรงข้ามคานัด
Hot Line เชื่อม DDE. วันที่ 15 พย 64 เวลา 09.00น.

DIS ชั่วคราว
โรงเปิด

NCA4YS-07

หน้าอนามัยสภทวน

NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

(นายชลิต สีขาวขำ)
พ.บ.ป.ท.อ.น.ครชัยศรี

100 นร 124 8
