



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

11 ต.ค. 66

เลขที่ ก.๓ บล.(ป.บ.) ๒๒๘๑ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัชรนันท์ พชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกชัย หังสุวรรณ

วันที่ ๔ ต.ค. ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ๑๑๕ kV. บริเวณหน้าสถานีฯบางเลน ๒ (ชั่วคราว) ถึง จุดแบ่งแดน พุทธมณฑล ตามหนังสือขอตัดไฟ จาก พชง.๖ ผกร.กกค.(ก.๓) ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEU1	15 ต.ค.66	08.00 น.	17.00 น.	ปักเสาแรงสูง ๑๑๕ kV	BEU1VB-01	BEU1S-03 BEU1S-07	นายวีรพัฒน์ นาคล มัย พชง.6 ผกร.กกค. (ก.3)
2.	BEU2					BEU2VB-01	BEU2S-02 BEU2S-03	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) ผังตรงข้ามสถานีฯบางเลน๒(ชั่วคราว)

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประดิษฐ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง หน.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกชัย หังสุวรรณ)

ผจก.กฟอ.บางเลน

หมายเหตุ ขอตัดไฟแรงดัน เนื่องจากได้รับการร้องขอจากผู้ใช้งานทางจราจรว่า หลุมเสาที่ชำรุดไว้อยู่ใกล้ถนน เกรงว่าจะเกิดอันตราย
สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ BEU1 จาก BEU1VB-01 ถึง BEU1S-03
ในวันที่ ๒๒-๑๐-๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1476/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ BEU2 จาก BEU2VB-01 ถึง BEU2S-03
ในวันที่ 15-๑๐-๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประพันธ์ ประสานงานขอตัดไฟกับ ทบป.ประจักษ์ ไทยงามศิลป์

(นายเอกรินทร์ สอนิทราน
๐๘๓-๖ ๑๓๓๓ ๓๖๓๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.บางเลน, กฟภ.๓

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานีฯ) -



เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ BEU01,02 บริเวณตรงข้ามสถานีไฟฟ้าบางเลน2				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปักก่อสร้างสายส่ง 115 KV.	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1476/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์			วันที่	8 ตุลาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
3	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
4	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
5	BEU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
6	BEU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
7	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
8	- ย้ายโหลด BEU01 จ่ายไฟจาก BEU04						
9	BEU04S-09	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 สามแยกตาเพียง(ข้ามถนน)
10	BEU01S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถบล-		SF6 ตรงข้ามบ.ไฮเทคฯ(ล่าง)
11	- ย้ายโหลด BEU02 จ่ายไฟจาก SLY09						
12	SLY09S-03	ปลด	สับ		รถพทท-	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ
13	BEU02S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		รถพทท-		SF6 สำนักพิมพ์พิสิขเซ็นเตอร์
14	ตรวจสอบ BEU01S-07 ให้อยู่ตำแหน่ง"OFF"พร้อมล็อคคานไว้					รถพทท-	SF6 ตรงข้ามร้านกึ่งเก้(ล่าง)
15	ตรวจสอบ BEU02S-02 ให้อยู่ตำแหน่ง"OFF"พร้อมล็อคคานไว้					รถบล-	SF6 ตรงข้ามBEU(บน)
16	- ดับไฟเวลา 08.00 น.						
17	BEU01VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB BEU01
18	BEU02VB-01	สับ	ปลด		BEU		CB BEU02
19	BEU01S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS หัว Pot Head BEU01
20	BEU02S-01	สับ	ปลด		รถบล-		DIS หัว Pot Head BEU02
21	Dropไลน์BEU01	สับ	ปลด		รถบล-		Drop ทางเข้าริยะแลนด์
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟอ.บางเลนรับทราบ						
23	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
25	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
26	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
27	แจ้งกฟอ.บางเลน Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
28	แจ้งกฟอ.บางเลนลงรายละเอียด We safe ก่อนปฏิบัติงาน						
29	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
30	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
31	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
32	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
33	แจ้งกฟอ.บางเลนปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
34	หลังจากกฟอ.บางเลนปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
35	แจ้งกฟอ.บางเลนปลด Short ground จุด G1 ออก						
36	แจ้งกฟอ.บางเลนปลด Short ground จุด G2 ออก						
37	แจ้งกฟอ.บางเลนปลด Short ground จุด G3 ออก						
38	แจ้งกฟอ.บางเลนปลด Short ground จุด G4 ออก						
39	แจ้งกฟอ.บางเลนปลด Short ground จุด G5 ออก						
40	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
41	SLY-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SLY		
42	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
43	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		
44	BEU04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		
45	- จ่ายไฟ						
46	BEU01S-01	ปลด	สับ		รถบล-		DIS หัว Pot Head BEU01
47	BEU02S-01	ปลด	สับ		รถบล-		DIS หัว Pot Head BEU02
48	BEU01VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEU		CB BEU01
49	BEU02VB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		BEU		CB BEU02
50	Dropไลน์BEU01	ปลด	สับ		รถบล-		Drop ทางเข้าอริยะแลนด์
51	- ย้ายโหลด BEU01 กลับคืนจาก BEU04						
52	BEU01S-03	ปลด	สับ		รถบล-		SF6 ตรงข้ามบ.ไฮเทคฯ(ล่าง)
53	BEU04S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถบล-		SF6 สามแยกตาเพียง(ข้ามถนน)
54	- ย้ายโหลด BEU02 กลับคืนจาก SLY09						
55	BEU02S-03	ปลด	สับ		รถพทท-		SF6 สำนักพิมพ์ฟิสิกเซ็นเตอร์
56	SLY09S-03	สับ	ปลด		รถพทท-	SCADA	SF6 วิทยาลัยการอาชีพ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	SLY-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SLY		
58	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
59	BEU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BEU		
60	BEU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
61	BEU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
62	BEU04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEU		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

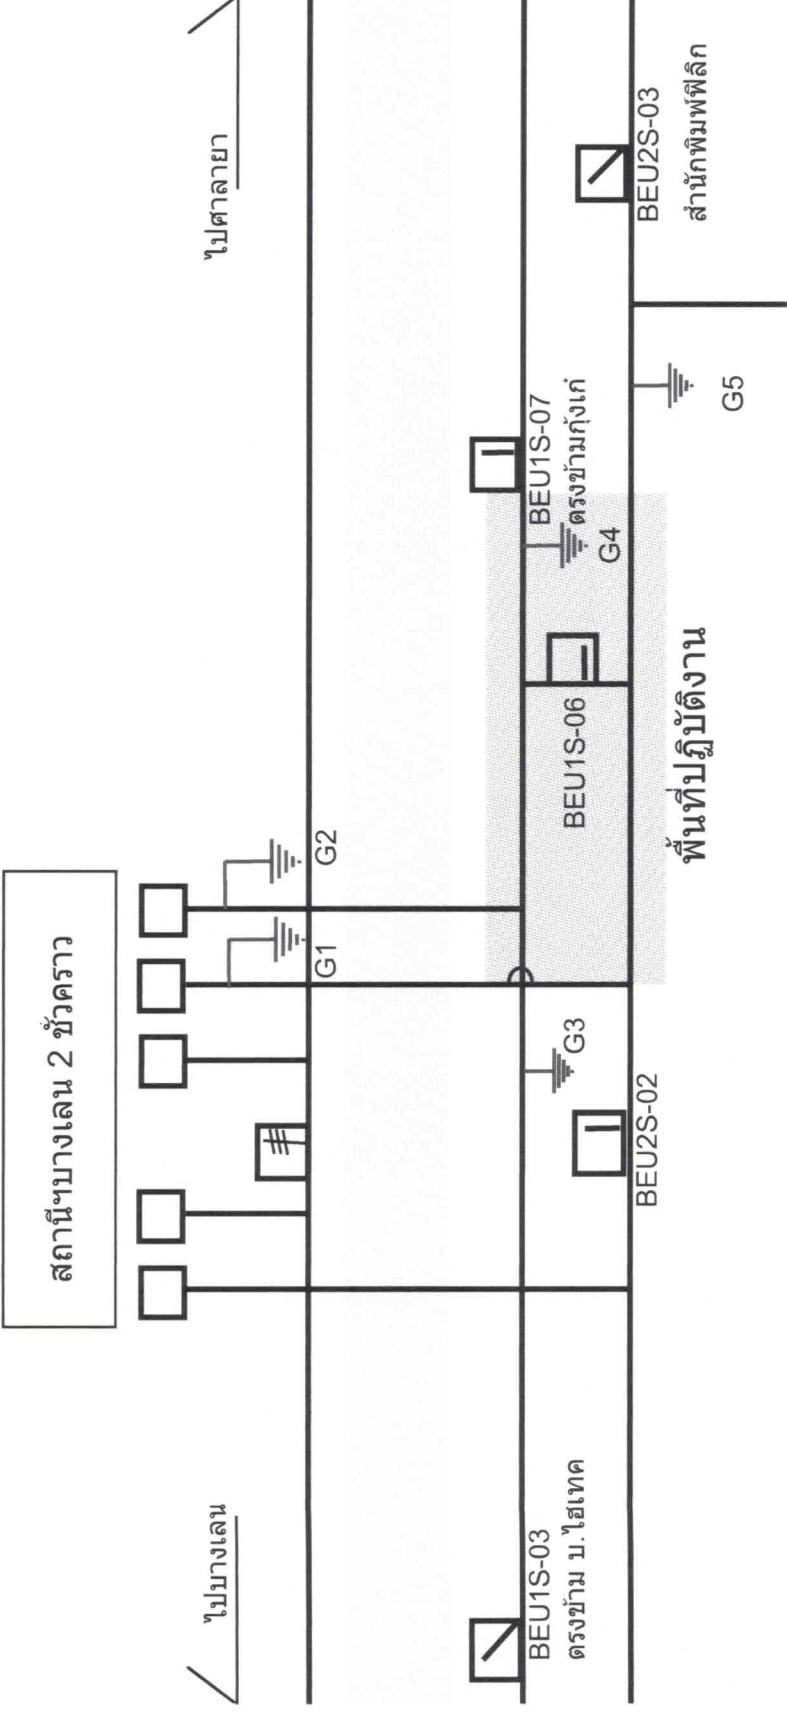

ผังดับไฟปฏิบัติงาน วันที่ 15 ตุลาคม 2566



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผู้ควบคุมงาน ถึง ผจก.กฟอ.บางเลน
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขออนุมัติดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน ก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม
เรียน ผจก.กฟอ.บางเลน

ตามอนุมัติที่ กรฟ.ก(อส.๓ก)๕๑/๒๕๖๔ ลว. ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ ให้แผนกก่อสร้างระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. CUT&TURN (สถานีไฟฟ้าบางเลน-สถานีไฟฟ้าศาลายา) - สถานีไฟฟ้าบางเลน ๒ (พุทธมณฑล ๓) จ.นครปฐม WBS : P-TDD02.1-I-BLNT0.0002 โครงการ 6001159267 โดยมี **นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์ พง.๖ ผกร.กคค.(ก๓)** เป็นช่างควบคุมงาน ปัจจุบันได้เตรียมแผนงานเพื่อปฏิบัติงานดังนี้

- ปักเสา คอร. ขนาด ๒๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- ติดตั้งอุปกรณ์หักเสา จำนวน ๑๖ ต้น

ในการดำเนินการและปฏิบัติงานมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. และระบบจำหน่าย ๒๒ kV. และแรงต่ำ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะจ่ายไฟฟ้าให้ก่อน ดังนั้นขอความอนุเคราะห์ให้ทาง กฟอ.บางเลน ดำเนินการดังนี้

กฟอ.บางเลน

- ดำเนินการประกาศแจ้งผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าวทราบในวัน , เวลา ตามระเบียบ
 - ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าบริเวณ สฟฟ.บางเลน ๒ (ชั่วคราว) ถึง ชนแดนบางเลน-พุทธมณฑล ระบบสายส่ง ๑๑๕ kV. ระบบจำหน่าย ๒๒ kV. และแรงต่ำ
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการให้ต่อไป

อนุมัติตามเสนอ

(นายวีรพัฒน์ นาคลัมย์)
พง.๖ ผกร.กคค.(ก๓)
ผู้ควบคุมงาน
