



# วิทยุขอดับไฟ

## Switching Deadline

15/10/67

### การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ บพล.(ปบ) **๑๕๖๗** /๒๕๖๗  
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชราสุวรรณชล  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง  
 จำนวนเอกสารแนบ ๓ แผ่น

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๗  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)  
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.บพล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขาบ่อพลอย ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี สถานีไฟฟ้าบ่อพลอย ๒

สถานีไฟฟ้า บ่อพลอย ๒ ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๑ สถานี บ่อพลอย ๒	๑๘ ต.ค. ๖๗	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ บ้านห้วยผาก ม.๓	DISชค. บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	จุดตัด DDE(๑) บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	นายวิษณุ มีผล พงษ.๖(ปพ) โทร. ๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙
					เชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน F๑ ก่อนบ้านปลักประดู่	SF๖ปลักประดู่ BOU๐๑S-๐๘	จุดตัด DDE(๒) บ้านห้วยผาก ม.๓ ต.หนองปรือ	

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนเรศ พูลพจน์ ตำแหน่ง พงษ.๗ (สข) โทร ๐๘๔-๒๔๖๙๔๒๔  
 ผู้ประสานงานหน้างาน ชื่อ นายวิษณุ มีผล ตำแหน่ง พงษ.๖ (ปพ) โทร ๐๘๒-๒๔๒๔๖๘๙

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ.(หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด **๑.๒** ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

ตำแหน่ง

ผจก.กฟส.บ่อพลอย

- ๗ ต.ค. ๒๕๖๗

ส่งทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เลขทะเบียน.....

วันที่..... - ๗ ต.ค. ๒๕๖๗

ผู้ส่ง.....

70067

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BOU01 จาก Dis ๕๓.บ้านห้วยผาก ถึง DDE (1) บ้านห้วยผาก  
ในวันที่ 18 ต.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1489/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ LWA07 จาก BOU01S-08 ถึง DDE (2) บ้านห้วยผาก  
ในวันที่ 18 ต.ค. ๖7 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 13:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่ 1489/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตชิ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ น.ส. สุภิญญา วงศ์บุญภัก ประสานงานขอดับไฟกับ นาย भरต พูลพันธ์

สุภิญญา

(นางสาวสุภิญญา วงศ์บุญภัก )

๓๓๓.๕ มท. มพ.ลพ.

ผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓. ทปภ, กฟภ.๓. ๓๓.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนทำสวิตชิ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจก. (สถานี - )

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับ  
ศูนย์นครปฐม ตั้งแต่เวลา .....น. เป็นต้นไปจนกว่างาน  
จะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สะพานลอยแคแถว ฝั่งขาเข้า กทม.						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-13 ต.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.		
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงสาย SAC เป็นสาย TAC	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1457/2567		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมา					วันที่	12 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	12 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	12 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐภาณุจณ์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BOUBR-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BOU		
3	LWA07R-03	Normal	Non-Reclosing		ดช.		เขาช่องคับ
4	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
5	Dis ชด.ในไลน์ BOU01	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทปร.		DIS ชั่วคราวบ้านห้วยผาก
6	BOU01S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทปร.	SCADA	SF6 บ้านปรักประตุ้
7	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.ทปร. รับทราบ						
8	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1						
9	แจ้งชุดปฏิบัติงาน กฟส.ทปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2						
10	เมื่อ กฟส.ทปร. ทำการ Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงข้อมูลใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว แจ้งให้ชุดปฏิบัติงานได้						
11	BOUBR-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BOU		
12	LWA07R-03	Non-Reclosing	Normal		ดช.		เขาช่องคับ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

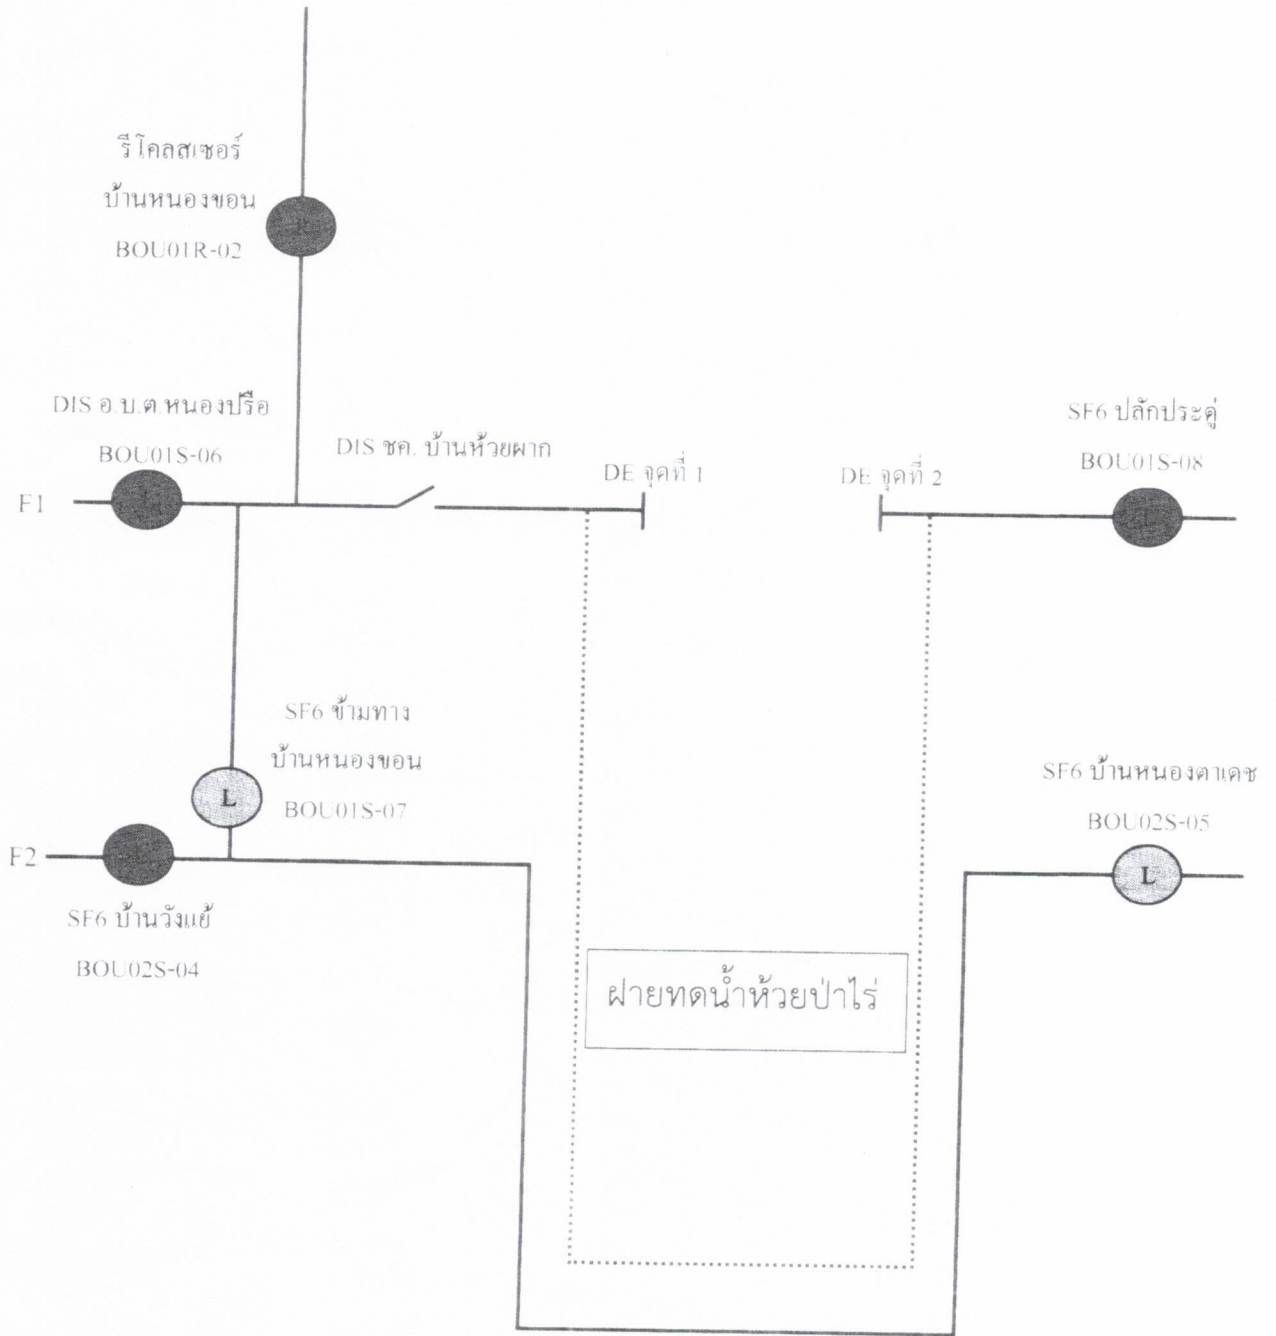

70067

สถานะการจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน

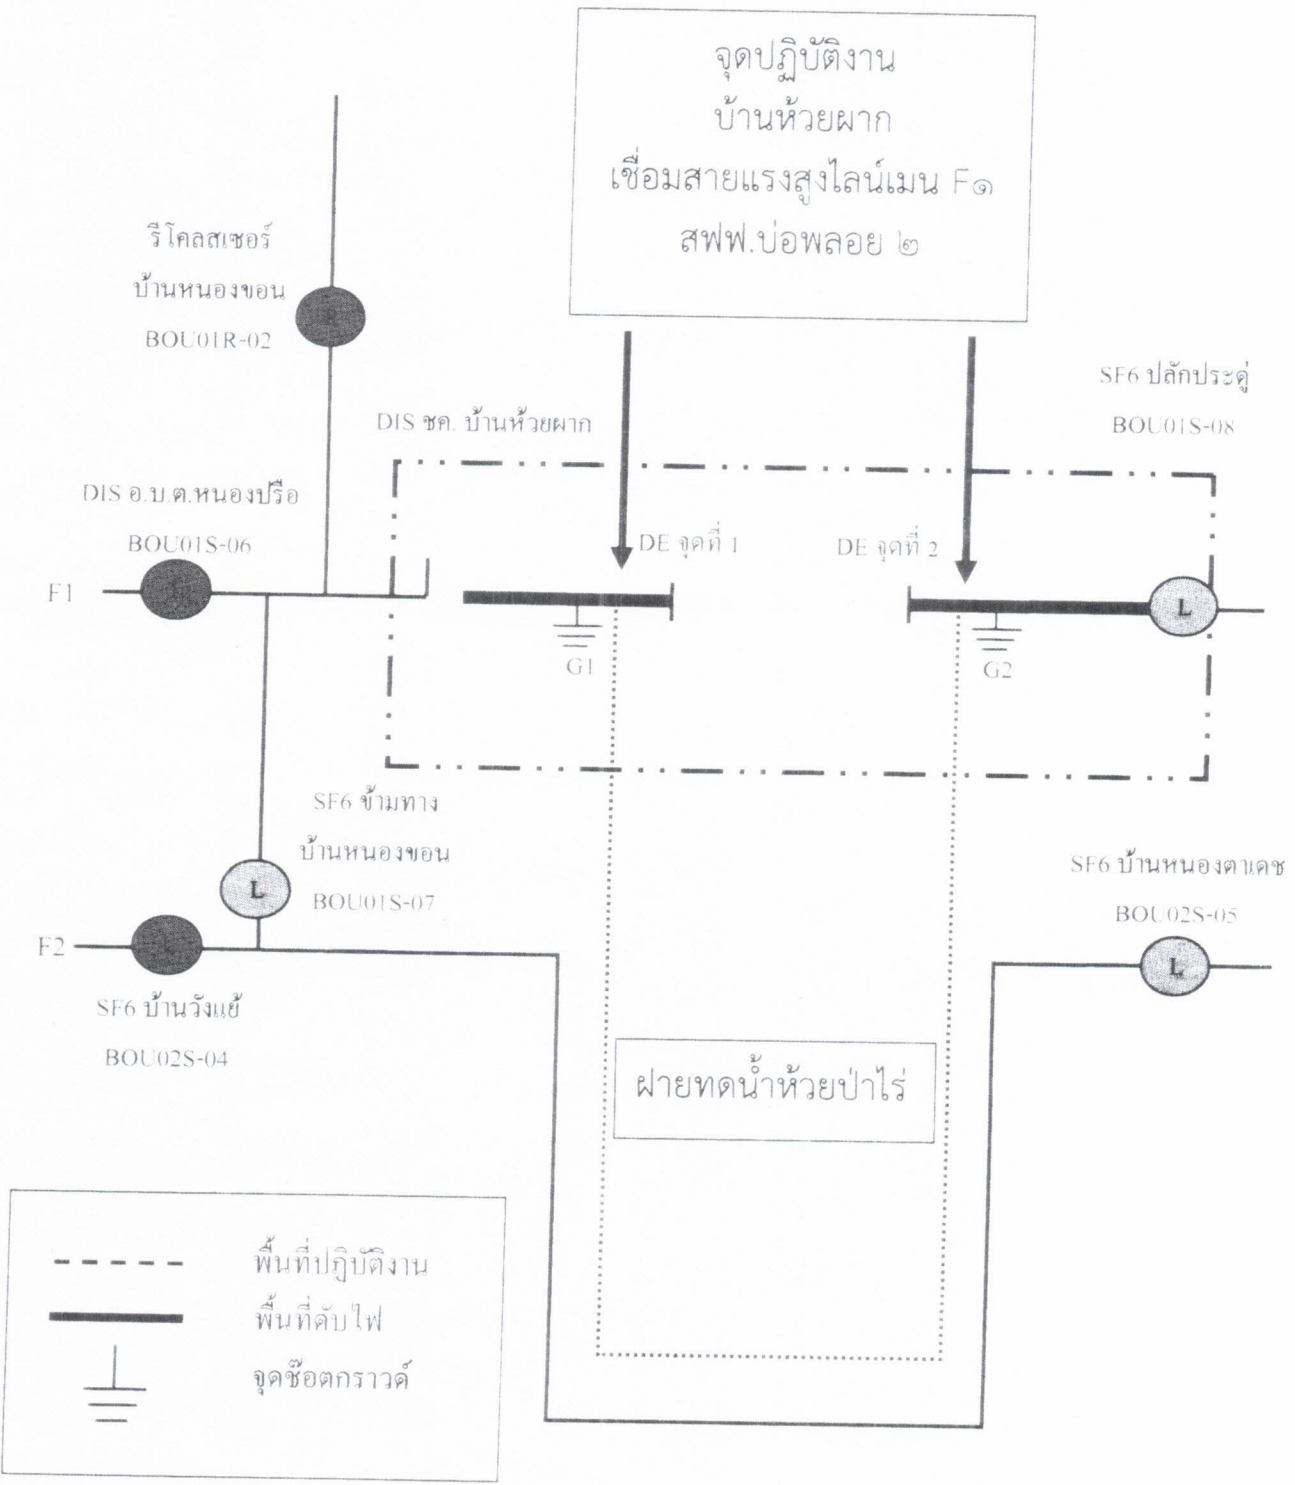

เนื่องจากใช้รถกระเช้าในการเชื่อมสายแรงสูงไลน์เมน  
จึงขอช้อตกราวด์เพียง ๑ จุดด้านหน้าจุดปฏิบัติงาน

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

