



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ปบ.)- ๑๙๕ /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงานติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB 07S-04 ปากชอยบ่อปลาเฉยตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๗ KTB	๒๘ ม.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ชุดงานก่อสร้าง กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTB๐๗S-๐๔ บริเวณปากชอยบ่อปลา ตาเฉย	จุดปลด DDE ปากชอย	จุดปลด DDE ช่วงโค้งเลย Dis KTB๐๗S-๐๔	นายฐิติพล อุปกัว พงง.๖ ผกส. โทร.๐๙๗-๒๓๔๐๖๓๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำระ  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำระ

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ | ฟีดเดอร์ KTB ๗ จาก PDE ชัยเสถียร ถึง PDE นคร KTB 75-04  
ในวันที่ ๒๘ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 148/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชชา กลิ่นประทุม ประสานงานการขอดับไฟกับ ผอ.นพพร ติวใจอภิว  
25 ม.ค. 67

(นาย จิรวรรณ นกักรัตน์)

๑๓ ก. ๕ ๖๖๓๓ ๖๖.๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๕ แผ่น

แผนผังแนบ ๕ แผ่น

เรียน ผจก. นพ. กน.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

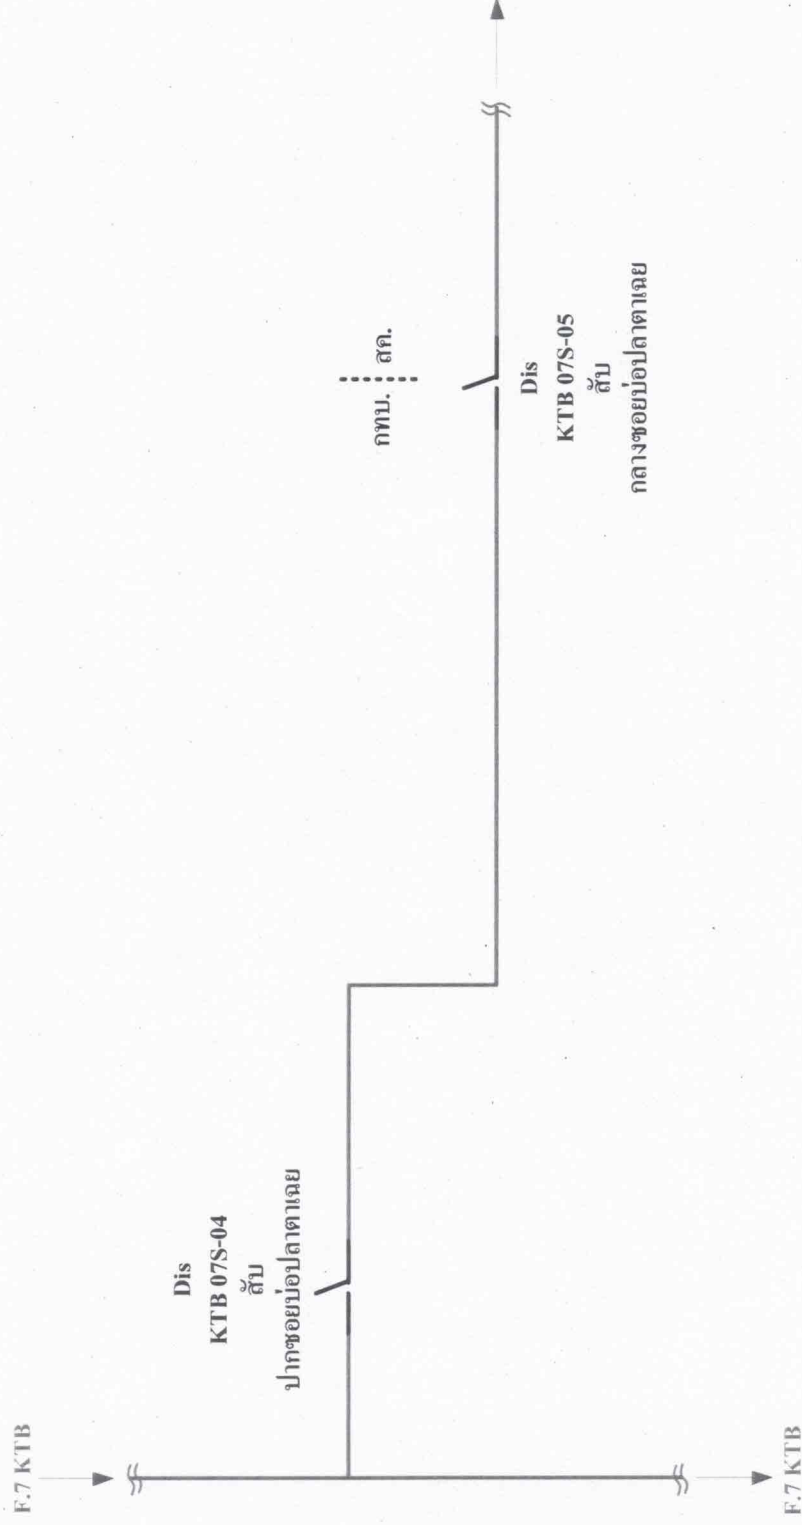
1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเฉย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	28 ม.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.กทบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยน DIS เป็น SF6 KTB7S-04 ตามใบขอปฏิบัติงาน 148/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม		วันที่ 25 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 25 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีร์วัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB	-	-
4	KTB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
5	KTB07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB	-	-
6	SN1-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-	-
7	SMABR-08	Normal	Nonreclosing		SMA	R	-
8	<del>SMABR-10</del>	Normal	Nonreclosing		SMA	R	-
9	ย้ายโหลด KTB 7 บางส่วนไปจ่ายจาก SMA 8						
10	KTBBVB-01	ปลด	สับ		KTB	-	ขนานบัส
11	KTB07S-06	ปลด	สับ		สก.	SCADA	SF6 ก่อนถึงศูนย์เบญจรงค์
12	KTB02S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 กม.12
13	KTB07S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS ปากซอยบ่อปลาตาเฉย
14	KTB02S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 กม.12
15	KTBBVB-01	สับ	ปลด		KTB	-	ขนานบัส
16	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE ปากซอยบ่อปลาตาเฉย ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
17	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุด DDE หลัง DIS KTB7S-04 ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
18	หลังจาก Hotline ทำการปลด DDE ทั้ง 2 จุด เสร็จ						
19	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน่วยงานรับทราบ						
20	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
21	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
22	เมื่อไฟฟ้าหน่วยงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
23	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้						
24	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
25	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB	-	-
26	KTB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
27	KTB07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB	-	-
28	SN1-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-





แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเคย (กลางซอยเทพกาญจนา)  
เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB07S-04 บริเวณปากซอยบ่อปลาตาเคย  
ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ( กรณีจำเป็นเร่งด่วน )



หมายเหตุ  
ไม่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการตัดไฟ

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ่อปลาตาย (กลางซอยเทพกาญจนา)

เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB07S-04 บริเวณปากซอยบ่อปลาตาย

ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

