



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๒ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เจริญสุวรรณ

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

Switching Deadline

วันที่ 21 ก.ย. 65

ด้วย การไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี จะขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี 2 ตามแผนผังส่งแบบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	9 สท.	24/09/65	08.00	17.00	รื้อถอนและพาดสายแรงสูง	DDE วรพรณ อินน์	SPA08S-08 บ่อปลา	โทร ๐๙๐ ๑๕๖๖๓๓๓ นายปรีชา ทองระย้า

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟฟ้าดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนกร สุวรรณประทีป ตำแหน่งช่างบ. (สช.) โทร ๐๘๕-๕๓๒๐๕๖๗
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสงของ กฟน. (หากมีโอกาสชำรุด ผดง กสร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลโยงแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เจริญสุวรรณ)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) สท.ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.สท.

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (สทฟ.) กฟอ.๓

เวียน อก.ปบ.(ก๓)

ผศพ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิกัดเคอร์ SPAT จาก DDE สส.ทพรณ. SPA8S-08
ในวันที่ 24 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1491/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิกัดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นนริณทร์ อังสาคณดิษ ประสานงานการขอตัดไฟกับ รจก.อภกส. สุพรรณบุรี

(นาย นนริณทร์ อังสาคณดิษ)
2๕๖๕

ขั้นตอนการสวิชชิง 3 แผน
แผนผังแบบ 1 แผน

ผจพ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

สำหรับข้อมูล

ที่ ก.๓ กปบ.(ศพ)

เวียน ผจก. กฟอ.๓พ., กฟอ.บปบ., กฟอ.มท.

อก.บช.(ก๓), อก.กว.(ก๓)


อนุมัติ และแจ้ง จป เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมที่ระงับข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน หน้าสถานีฯ สุพรรณบุรี 2 (วงจร SPA8, SPA9)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 24 ~~ก.ย.~~ 65 ระหว่าง 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟจ.สพ. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1491/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายนครินทร์ อังสนาวศิน วันที่ 21 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 21 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย _____ วันที่ 21 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
3	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
4	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
5	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
6	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
7	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
8	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
9	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก BAM02						
10	BAM02S-18	ปลด	สับ		มขล.		SF6 สีแยกมะขามล้ม
11	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
12	DIS04-33001	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS จุด/Amorosa
13	BAM02S-12	สับ	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมะนาว
14	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
15	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
16	SPA08S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บ่อปลาสิริเพ็ญ
17	- ดับไฟไลน์ SPA09 เวลา 08.00 น.						
18	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE. จุด A และ จุด B						
19	หลังจาก กฟจ.สพ. ทำการปลดโหลดผู้ใช้ไฟออกทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้ง Hot Line กระจายทำการตัด DDE. ไลน์ SPA09 จุด A ตามผังแนบ						
21	หลังจาก Hot Line กระจายทำการตัด DDE. ไลน์ SPA09 จุด A ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
22	แจ้ง Hot Line กระจายทำการตัด DDE. ไลน์ SPA08 จุด B ตามผังแนบ						
23	หลังจาก Hot Line กระจายทำการตัด DDE. ไลน์ SPA08 จุด B ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
24	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. รับทราบ						
25	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
26	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
28	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4						
29	แจ้ง กฟจ.สพ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G5						
30	แจ้งให้ กฟจ.สพ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
31	แจ้ง กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
32	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
33	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
34	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
35	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
36	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
37	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
38	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
***** สิ้นสุด Switching เข้า *****							
39	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
40	เมื่อ กฟจ.สพ. ทำงานแล้วเสร็จ พร้อมยืนยัน We Safe						
41	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G1 ออก						
42	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G2 ออก						
43	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G3 ออก						
44	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G4 ออก						
45	แจ้ง กฟจ.สพ. ทำการปลด Short ground จุด G5 ออก						
46	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
47	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
48	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
49	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
50	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
51	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
52	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		
53	BAM02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
54	- จ่ายไฟไลน์ SPA09						
55	แจ้ง Hot Line กระจายไฟการจัม DDE.ไลน์ SPA09 จุด A ตามผังแนบ						
56	หลังจาก Hot Line กระจายไฟการจัม DDE.ไลน์ SPA09 จุด A ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
57	แจ้ง Hot Line กระจายไฟการจัม DDE.ไลน์ SPA08 จุด B ตามผังแนบ						
58	หลังจาก Hot Line กระจายไฟการจัม DDE.ไลน์ SPA08 จุด B ตามผังแนบเสร็จเรียบร้อย						
59	แจ้ง กฟจ.สพ. นำไหลดผู้ใช้ไฟเข้าได้ทั้งหมด						
60	เปลี่ยนทางจ่ายไฟ SPA09 บางส่วนไปรับไฟจาก SPA09						
61	SPA08S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS บ่อปลาสิริเพ็ญ
62	SPA07S-08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
63	ย้ายไหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก BAM02						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	BAM02S-12	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดমনาว
65	BAM02S-12	ปลด	สับ		สพ.		DIS วัดมนาว
66	BAM02S-12	สับ	สับ		บปม.	SCADA	SF6 วัดมนาว
67	BAM02S-18	สับ	ปลด, ล็อคคาน		มขล.		SF6 สี่แยกมะขามล้ม
68	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
69	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
70	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
71	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
72	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
73	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		
74	BAM02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		บปม.	SCADA	R บ้านสูตร
***** สิ้นสุด Switching *****							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟง.สพ.

ถึง ผจก.กฟง.สพ.

เลขที่ ก.๓ สท.(ปบ.)-

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย


เรียน ผจก.กฟง.สพ./รจก.กฟง.สพ.

ด้วยในวันที่...๒๔...เดือน...กันยายน...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...เลยโรงแรมเทรนนอน-บ่อปลาศิริเพ็ญ ...เพื่อ...รื้อถอนและทาดสายแรงสูง๑๘๕ ต.มม. ๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี๒...โดยมีรายละเอียดที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ฟีดเดอร์ ...๙๙. สถานีฯ ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ ...เลยโรงแรมเทรนนอน-บ่อปลาศิริเพ็ญ

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปริชา ทองระย้า ตำแหน่ง ชูตก่อสร้าง กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔...เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิโกธ ...ตำแหน่ง ผ.ก.ส.กฟจ.สพ.เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐...เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

แนบผังซึ่งเก็ลไลน์

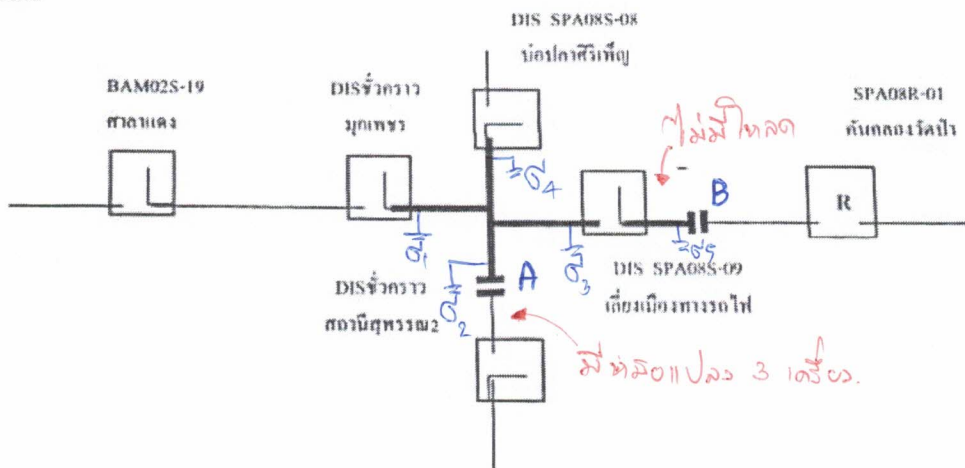

ดับไฟเพื่อรื้อถอนและทาดสาย ระบบจำหน่าย๒๒เควี สถานีสุพรรณบุรี ๒

๑. ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
๒. ปลดโหลดจุด ๑ จุด ให้ Hot Line สท.ปฏิบัติงานด้วยการตัดเคด ๒ จุด
๓. ตรวจสอบไฟดับ ชูตทีมแก้ไขข้อบกพร่องจุด ๑ และจุด ๒
๔. แจ้งชูก่อสร้าง กฟจ.สุพรรณบุรีปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)

รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน

ผจก.กฟจ.สพ.

Ok
(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พขง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา

โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
