



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กฟส.กทบ.(ป.)- ๑๙๖ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิราสุวรรณ์ชล
ชื่อผู้ส่ง นายนรุตม์ชัย เกษมณี

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.กทบ. ขออนุมัติดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ติดตั้ง SF6 แทน Dis.KTB 06S-07 หลังวัดแคราย.....ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๖ KTB	๒๘ ม.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ชุดงานก่อสร้าง กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF๖ แทน Dis KTB๐๖S-๐๗ บริเวณหลังวัดแคราย	จุดปลด DDE ส.๒/แรงกด วัดแรง	จุดปลด DDE ช่วงเลย Dis KTB๐๖S-๐๗ ขั้วประจุ วัดแรง	นายพลศรัณย์ ธีรจันทร์ พง.๔ ผกส. โทร.๐๘๒

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการดับไฟปฏิบัติงาน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนพพร ชาวไชยศรี ตำแหน่ง หน.ปบ.กฟส.กทบ. โทร ๐๘๗-๖๗๑๕๖๒๖

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)

(นายนรุตม์ชัย เกษมณี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.กทบ.

๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ KTB๐๖ จาก DDE ส.๒/แรงกด วัดแรง ถึง DDE ขั้วประจุ วัดแรง
ในวันที่ 2๘ ม.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 149/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ วัฒนา
25 ม.ค. 67

ประสานงานการขอดับไฟกับ นายนพพร ชาวไชยศรี

(นาย วิวัฒน์ วัฒนา)
วัด. 5 หน.คท.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ ๒ แผ่น

เรียน ผจก. กฟส. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ผจก. (สถานี)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|--|----------|---|
| 1. สถานที่ทำงาน | หลังวัดแคราย | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 28 ม.ค. 67 | ระหว่าง | 08.30 น. ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กฟอ.กทบ. | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS เป็น SF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 149/2567 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายวีรวัชร เสมามิ่ง | | วันที่ 25 มกราคม 2567 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 มกราคม 2567 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 25 มกราคม 2567 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายจิราวัฒน์, วัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
4	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
5	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
6	ย้ายโหลด KTB06 บางส่วนไปรับจาก KTA10						
7	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	Scada	SF6 โรงปุนนายสวาสดี
8	KTA010S-10	ปลด	สับ		กทบ.		DIS โรงงานเพชรศิเดนซ์
9	KTB06S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS หลังวัดแคราย
10	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	Scada	SF6 โรงปุนนายสวาสดี
11	เมื่อพร้อมดับไฟ						
12	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณสามแยกหลังวัดแคราย ออกทั้ง 3 เฟส(ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
13	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณสามแยกหลังวัดแคราย ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้ง HOTLINE ตัด DDE บริเวณชุมประตูดวัดแคราย ออกทั้ง 3 เฟส(ไม่มีโหลดผู้ใช้ไฟ)						
15	เมื่อ HOTLINE ตัด DDE บริเวณชุมประตูดวัดแคราย ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
16	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
17	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
18	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
20	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
21	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
22	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
23	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
สิ้นสุด Switching แรก							
25	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
26	ตรวจสอบสถานะ SF6 KTB06S-07 อยู่สถานะ OPEN+ล็อกคาน						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
29	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
30	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
31	KTA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		
32	KTB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTB		
33	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณสามแยกหลังวัดแคราย เข้าทั้ง 3 เฟส						
34	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณสามแยกหลังวัดแคราย เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
35	แจ้ง HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณชุมประตูดัดแคราย เข้าทั้ง 3 เฟส						
36	เมื่อ HOTLINE เชื่อม DDE บริเวณชุมประตูดัดแคราย เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
37	ย้ายโหลด KTB06 บางส่วนกลับจาก KTA10						
38	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	Scada	SF6 โรงปูนนายสาวาสดี
39	KTB06S-07	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 หลังวัดแคราย
40	KTA010S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.		DIS โรงงานเพชรซิเดนซ์
41	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	Scada	SF6 โรงปูนนายสาวาสดี
42	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
43	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
44	KTA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		
45	KTB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTB		
สิ้นสุด Switching							

แผนผังสถานะปัจจุบัน ก่อนตัดไฟฟ้า บริเวณหลังวัดแคทราย ตำบลแคทราย
 เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB06S-07 บริเวณหลังวัดแคทราย
 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

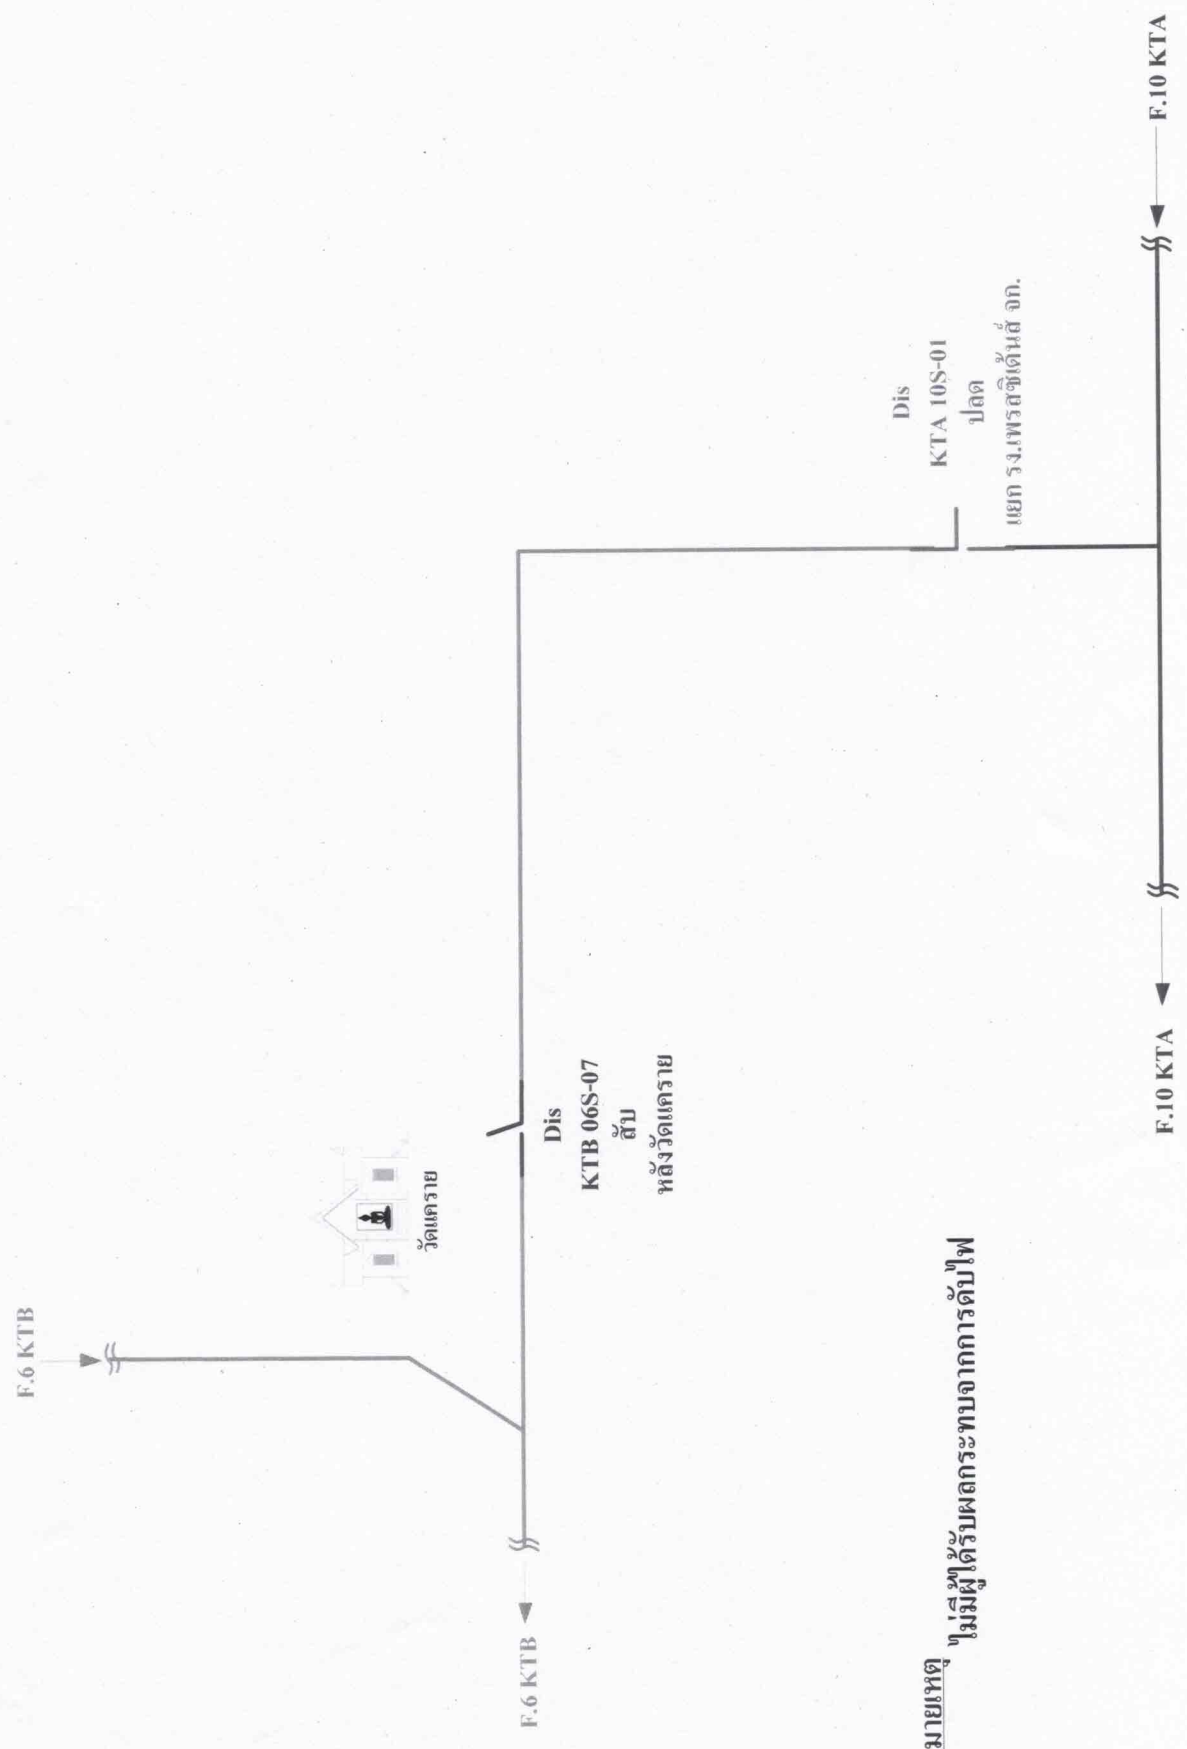

หมายเหตุ
 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับผลกระทบจากการตัดไฟฟ้า

แผนผังสถานะปัจจุบัน หลังตัดไฟฟ้า บริเวณหลังวัดแคราย ตำบลแคราย
 เพื่อให้ชุดงานก่อสร้างของ กฟ.ส.กทบ. ติดตั้ง SF6 แทน Dis KTB06S-07 บริเวณหลังวัดแคราย
 ปฏิบัติงานวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (กรณีจำเป็นเร่งด่วน)

