



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

21 ก.ย. 65

วิทย์ขอตัดไฟ

เลขที่ ก.๓ กจ.(ปบ) ๒๓๗๓ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโฑทอง
ชื่อผู้ นายณณมิตร ศิริพรรค

วันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ KV ได้ไลน์๑๑๕KV ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ภาณุจันบุรี๑ วงจร F4 บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินใหม่ ถนนบางพอส ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.ภาณุจันบุรี ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	115KV สฟฟ.กจ.2	๒๒ ก.ย.๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	รื้อถอน/ปักใหม่เสา๑๒ ม. พาดสายSAC๕๐บริเวณหน้าสนง.ที่ดินใหม่ ถนนบางพอส	115KV สฟฟ.กจ.2	115KV สฟฟ.พทน.	นายสมปอง กำจรกิติคุณ ๐๘๑-๔๔๒๒๔๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มี มีสวิชชิงข้างเคียงหมายเลข 1455

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายวัชร ธานี ตำแหน่ง พงษ.๗ โทร. ๐๘๕-๑๘๕๖๑๑๑ / ๐๓๔-๕๑๑๕๔๑ / ๐๓๔-๕๑๒๕๕๖ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟ ปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายณณมิตร ศิริพรรค)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.กจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก 115KV สฟฟ.กจ.2 ถึง 115KV สฟฟ.พทน.
ในวันที่ 22 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1507/65

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง ในวันที่
ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สิริพรรค ศิริพรรค ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายวัชร ธานี

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟจ.กจ., กฟส.พทน.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายณณมิตร ศิริพรรค)
รจก. 6 m w. n.

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี ภาณุจันบุรี 2, พนมทวน)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)
สแกนด้วย CamScanner

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	สถานี กายจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	22 ก.ย. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	22 ก.ย. 65	เวลา	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1507/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์					วันที่	21 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	21 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	21 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1. กฟง.กจ. ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณหน้าสำนักงานที่ดินใหม่ (ดับสายส่ง 115 เควีช่วงสถานี กายจนบุรี 2 - สถานี พนมทวน)						
2	2. กongsก่อสร้างรื้อถอนอุปกรณ์ภายในสถานี (ดับไฟระบบ 115 เควีทั้งหมด)						
3	แจ้ง VSPP บริษัท ลินโซยศรี จำกัด (วงจร PTU03) งดการขนาน						
4	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
5	PTU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PTU		- โหลด 14.29 MW
6	PTU01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.82 MW
7	PTU02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 0.20 MW
8	PTU03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.88 MW
9	PTU04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 3.08 MW
10	PTU05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		- โหลด 1.20 MW
11	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 0.00 MW
12	PTU10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		โหลด 3.27 MW
13	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		โหลด -17.7 MW
14	UTG01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 2.21 MW
15	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		- โหลด 1.38 MW
16	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		- โหลด 9.67 MW
17	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		- โหลด 2.70 MW
18	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 16.9 MW
19	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 14.6 MW
20	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 3.59 MW
21	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 1.96 MW
22	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		- โหลด 5.55 MW
23	KCB03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCB		-
24	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
25	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
26	PTU01S-07	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
27	PTU01VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
28	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
29	PTU02S-14	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
30	PTU02VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
31	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดไปรับไฟจาก TMU02						
32	PTU03S-19	ปลด	สับ		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง
33	PTU03VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
34	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA04						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
35	KCA04S-04	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 หน้าปัดเซลล์
36	PTU04VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
37	KCA04S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
38	PTU05VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
39	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA09						
40	KCA09S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยงเฮ้าส์
41	PTU10VB-01	สับ	ปลด		PTU		-
42	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดไปรับไฟจาก KCA05 (ผ่านไลน์ PTU09 ชั้นบัส 2)						
43	KCA04S-09	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
44	- เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น						
45	PTU01BVB-01	สับ	ปลด		PTU		- INCOMING 1
46	PTU01YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	PTU01YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
48	PTU01YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
49	PTU04YB-01	สับ	ปลด		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
50	PTU04YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
51	PTU04YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
52	PTU02YS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
53	PTU02YS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
54	PTUBYS-01	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
55	PTUBYS-02	สับ	ปลด		PTU		- ไบมีด 115 เควี
56	KCB03YB-01	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
57	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	KCB03YS-01	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
59	KCB03YS-02	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
60	KCB03YS-03	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
61	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
62	KCB03YS-07	สับ	ปลด		KCB		- ไบมีด 115 เควี
63	PTU01BVB-01	ทริค "In service"	ทริค "Out service"		PTU		- INCOMING 1
64	แจ้ง Hotline ปลดจุดเชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน ออกทั้ง 3 เฟส						
65	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.กจ. ทราบ และทดสอบไฟก่อนปฏิบัติงาน ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
66	แจ้งให้ กฟจ.กจ. ทราบและปฏิบัติงานได้						
67	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		
68	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
69	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
70	UTG09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
71	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
72	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
73	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
74	KB-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
75	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
76	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
77	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
78	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
79	****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า****						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
80	เมื่อ กฟจ.ก. ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุดแล้ว พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
81	PTU09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		PTU		
82	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		UTG		-
83	UTG04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
84	UTG09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		UTG		-
85	TMU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMU		-
86	TMUBR-02	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMU		-
87	KB-KT1A//3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
88	KB-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
89	KCA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
90	KCA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
91	KCA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KCA		-
92	TMK02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		TMK		-
93	แจ้ง Hotline เชื่อมสายส่ง 115 เควี ตรงข้ามสถานีฯ พนมทวน เข้าทั้ง 3 เฟส						
94	PTU01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		PTU		- INCOMING 1
95	KCB03YS-01	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
96	KCB03YS-02	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
97	KCB03YS-03	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
98	KCB03YS-04	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
99	KCB03YS-07	ปลด	ล๊ับ		KCB		- ไบมีด 115 เควี
100	KCB03YB-02	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
101	KCB03YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		KCB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
102	PTU04YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
103	PTU04YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
104	PTU02YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
105	PTU02YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
106	PTUBYS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
107	PTUBYS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
108	PTU04YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
109	PTU01YS-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
110	PTU01YS-02	ปลด	ล๊ับ		PTU		- ไบมีด 115 เควี
111	PTU01YB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
112	PTU01BVB-01	ปลด	ล๊ับ		PTU		- INCOMING 1
113	- ย้ายโหลด PTU06,07,08,09 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA05						
114	KCA04S-09	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ข้างวัดเขาน้อย (ข้ามถนน)
115	- ย้ายโหลด PTU10 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA09						
116	PTU10VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
117	KCA09S-02	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามยมงเข้าสี่
118	- ย้ายโหลด PTU04,05 ทั้งหมดกลับคืนจาก KCA04						
119	PTU05VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
120	KCA04S-03	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามหมู่บ้านคำหวาน
121	PTU04VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
122	KCA04S-04	ล๊ับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 หน้าบ่มเซลล์
123	- ย้ายโหลด PTU03 ทั้งหมดกลับคืนจาก TMU02						
124	PTU03VB-01	ปลด	ล๊ับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
125	PTU03S-19	ล๊ับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 ตรงข้ามบ้านหนองพง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
126	- ย้ายโหลด PTU02 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG04						
127	PTU02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
128	PTU02S-14	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
129	- ย้ายโหลด PTU01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก UTG01						
130	PTU01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		PTU		-
131	PTU01S-07	สับ	ปลด		พทน.	SCADA	SF6 บ.ตลาดเขต
132	PTU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PTU		-
133	PTU01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
134	PTU02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
135	PTU03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
136	PTU04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
137	PTU05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
138	PTU09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
139	PTU10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		PTU		-
140	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		UTG		-
141	UTG01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
142	UTG04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		UTG		-
143	TMU-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMU		-
144	TMUBR-02	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMU		-
145	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
146	KB-KT1A//3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
147	KCA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
148	KCA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
149	KCA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCA		-
150	KCB03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KCB		-
151	TMK02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		TMK		-
สิ้นสุดสวิตช์ชิงทั้งหมด							

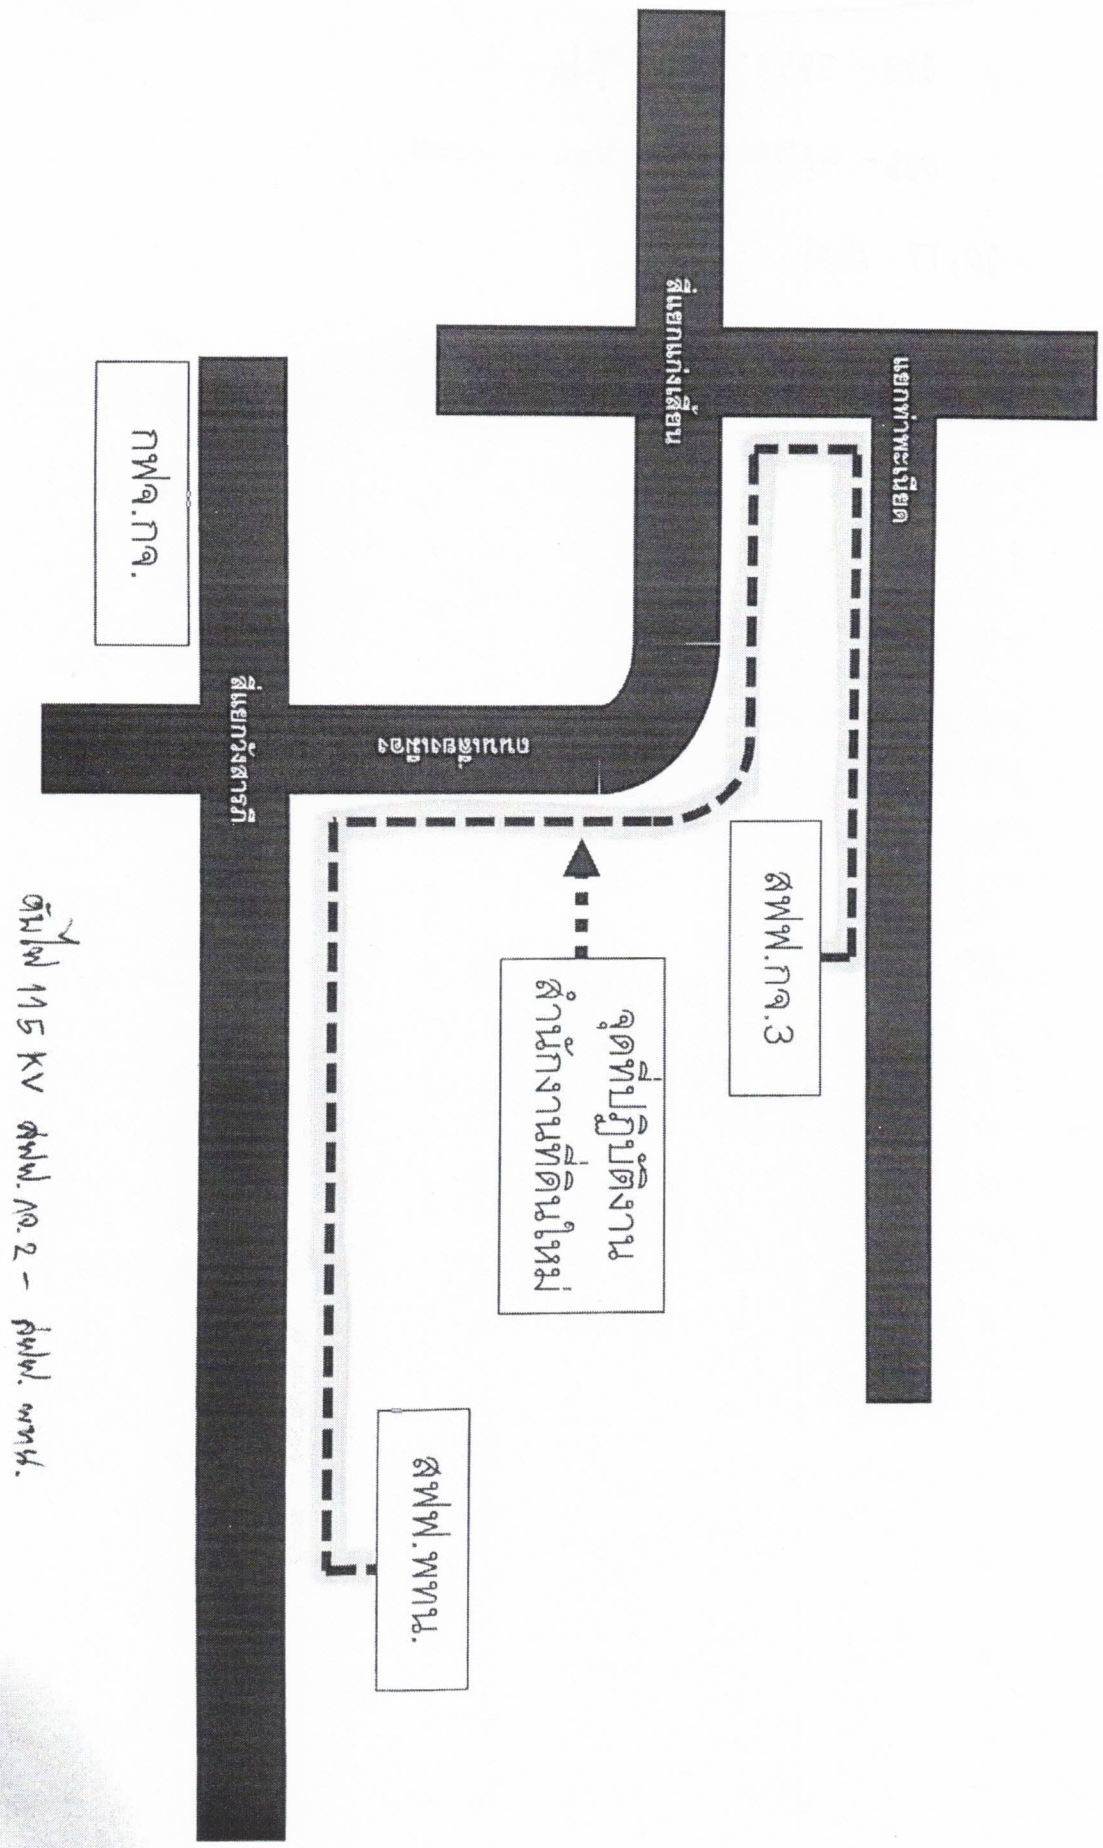

สถานี 115 KV สทพ. น. 2 - สทพ. พทพ.



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จังหวัด กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร

มี ผอ.กฟภ. กทม. กทม.

เลขที่ กส. กส. กส. กส.

วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งกระแสไฟฟ้า

ณ ผอ. กส. กส. กส. กส.

ข้าพเจ้า นาย... มีชื่อ... เข้าเป็นที่ยอมรับ... ชื่องาน... จำนวน... 115... ๑๖๖๑๐๖... ๑๗.๐๐ น. ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

ซึ่งมีได้จากการแนบแผนผังพื้นที่ในการติดตั้ง ชื่องาน... หมายเลข... กส. กส. กส. กส. นายบุญช่วย... 098-2798399

ขออนุมัติการติดตั้งกระแสไฟฟ้าเพื่อทำการขยายเขตฯ

- ๑. กิ่งเสาอากาศ ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- ๒. กิ่งเสา ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมประกอบหัวเสา
- ๓. กิ่งเสาอากาศอิมูนิเนี่ยมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทาง ๒๐ เมตร
- ๔. พาดสายอิมูนิเนี่ยมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๑ เฟส ๒ สายระยะทาง ๓๐ เมตร

ซึ่งยื่นมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นายบุญช่วย...)
พช.๖ ผอ.กฟภ.กจ.

อนุมัติ

(นายณัฐมิตร...)

รอง (ท) ปฏิบัติงานแทน ผอ.กฟภ.กจ.
๑๓ กันยายน ๒๕๖๕

๑๑๕ ม. ๑๕... ๑๙.๐๐ - ๑๙.๐๐ น.

10... 115... 12 เมตร... 115
