



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13 ต.ค. 2566

เลขที่ ก.๓.นฐ.(ปน.) ๙๒๐ /๒๕๖๖ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพิทรนันท์ พิชราสุวรรณชด ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชษฐ อรุณมาศ ตำแหน่ง ผ.จก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑ ตามแผนผัง
 สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีด เคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPT F๘	๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับปรุงระบบจำหน่าย บริเวณ หน้าศูนย์ชัยพัฒนา	SF๖ หน้า ร.ร.ทวาราวดี NPT๖๕-๐๖	จุดตัด DDE หน้าร้าน เพอร์นิจอร์	นายสฤกษ์เดช หลวงปลัด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...บ้านเอื้ออาทรบ่อพลับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายมนตรี รุ่งน้อย ตำแหน่ง พ.ชง.๖ (สข.) ผ.บ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๙๗-๑๖๔๓๗๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. / ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมชาย ศรีjaruphuk)

ตำแหน่ง ผ.จก.(ท) กฟจ.นครปฐม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเคอร์ ๘ จาก NPT๖๕-๐๖ ถึง DDE หน้า ร้านเพอร์นิจอร์
 ในวันที่ 14 ตุลาคม 66 ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1514/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ... ฟีดเคอร์... จาก... ถึง...
 ในวันที่... ตั้งแต่เวลา... น. ถึง... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่...

พนักงานศูนย์ฯ นาย อีร์วิธร์ เลียงชิง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.มนตรี รุ่งน้อย
 14 ต.ค. 66

(นาย อีร์วิธร์ เลียงชิง)
 จุด. 5 แทน ผ.ค.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟจ. นฐ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)


รก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าศูนย์พัฒนา					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	14 ต.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟง.นธ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1514/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัชร์ เสมามิ่ง			วันที่	11 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร, นายจิรวัดณ์, นายพิชชา, นายวิรัชร์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ DIS NPU06S-11 แยกตอนคุม อยู่สถานะ Open						
3	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
4	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
5	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
6	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
7	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
8	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
9	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
10	NPT08R-02	Normal	Nonreclosing		นธ.		
11	ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU08						
12	NPT08S-13	ปลด	สับ		นธ.		DIS โคว้งมาบแค
13	NPV01S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นธ.		DIS UG มาบแคฝั่งเทศบาล
14	ย้ายโหลด NPT08 บางส่วนไปรับไฟจาก NPU06						
15	NPT07S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นธ.	SF6	รพ.คริสเตียน
16	NPT08S-11	ปลด	สับ		นธ.	DIS	หมู่บ้านเรือนแก้ว
17	NPT08R-02	สับ	ปลด		นธ.	R	ก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
18	sw.load NPT08R-02	สับ	ปลด		นธ.	R	ก้วยเดี่ยวต่ำลิ่ง
19	NPT07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SF6	รพ.คริสเตียน
20	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
21	NPT08S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นธ.	SF6	โรงเรียนทวาราวดี
22	แจ้งผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลง 1 เครื่อง						
23	เมื่อผู้ควบคุมงานไลน์โหลดหม้อแปลง แล้วเสร็จ						
24	แจ้งชุด HotLine 22 kV ดำเนินการตัด DDE บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ ออกจากกั้นทั้ง 3 เฟส						
25	เมื่อชุด HotLine 22 kV ดำเนินการตัด DDE บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ ออกจากกั้นทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ						
27	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShorGround จุด G1						
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShorGround จุด G2						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShorGround จุด G3						
30	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ ShorGround จุด G4						
31	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้						
33	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
34	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
35	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
36	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
37	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
38	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
39	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
40	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
41	NPT-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPT		
42	NPU-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPU		
43	NPT07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
44	NPT08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPT		
45	NPU06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
46	NPU08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
47	NPU10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPU		
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShorGround จุด G1						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShorGround จุด G2						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShorGround จุด G3						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด ShorGround จุด G4						
52	- จ่ายไฟ						
53	แจ้งชุด HotLine 22 kV ดำเนินการเชื่อมDDE บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ เข้าทั้ง 3 เฟส						
54	เมื่อชุด HotLine 22 kV ดำเนินการเชื่อมDDE บริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์ เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
55	NPT08S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		SF6 โรงเรียนทวาราวดี
56	ย้ายโหลด NPT08 บางส่วนกลับจาก NPU06						
57	NPT07S-13	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นฐ.		รพ.คริสเตียน
58	sw.load NPT08R-02	ปลด	สับ		นฐ.		R กว๊านเดียวต่ำลิ่ง
59	NPT08R-02	ปลด	สับ/Noth, Alt		นฐ.		R กว๊านเดียวต่ำลิ่ง
60	NPT08S-11	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		หมู่บ้านเรือนแก้ว
61	NPT07S-13	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		รพ.คริสเตียน
62	ย้ายโหลด NPU06 บางส่วนกลับจาก NPU08						
63	NPV01S-15	ปลด	สับ		นฐ.		DIS มาบแคฝั่งเทศบาล
64	NPT08S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS โด่งมาบแค
65	NPT-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPT		
66	NPU-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPU		
67	NPT07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
68	NPT08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPT		
69	NPU06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
70	NPU08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
71	NPU10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPU		
72	NPT08R-02	Nonreclosing	Normal		นฐ.		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

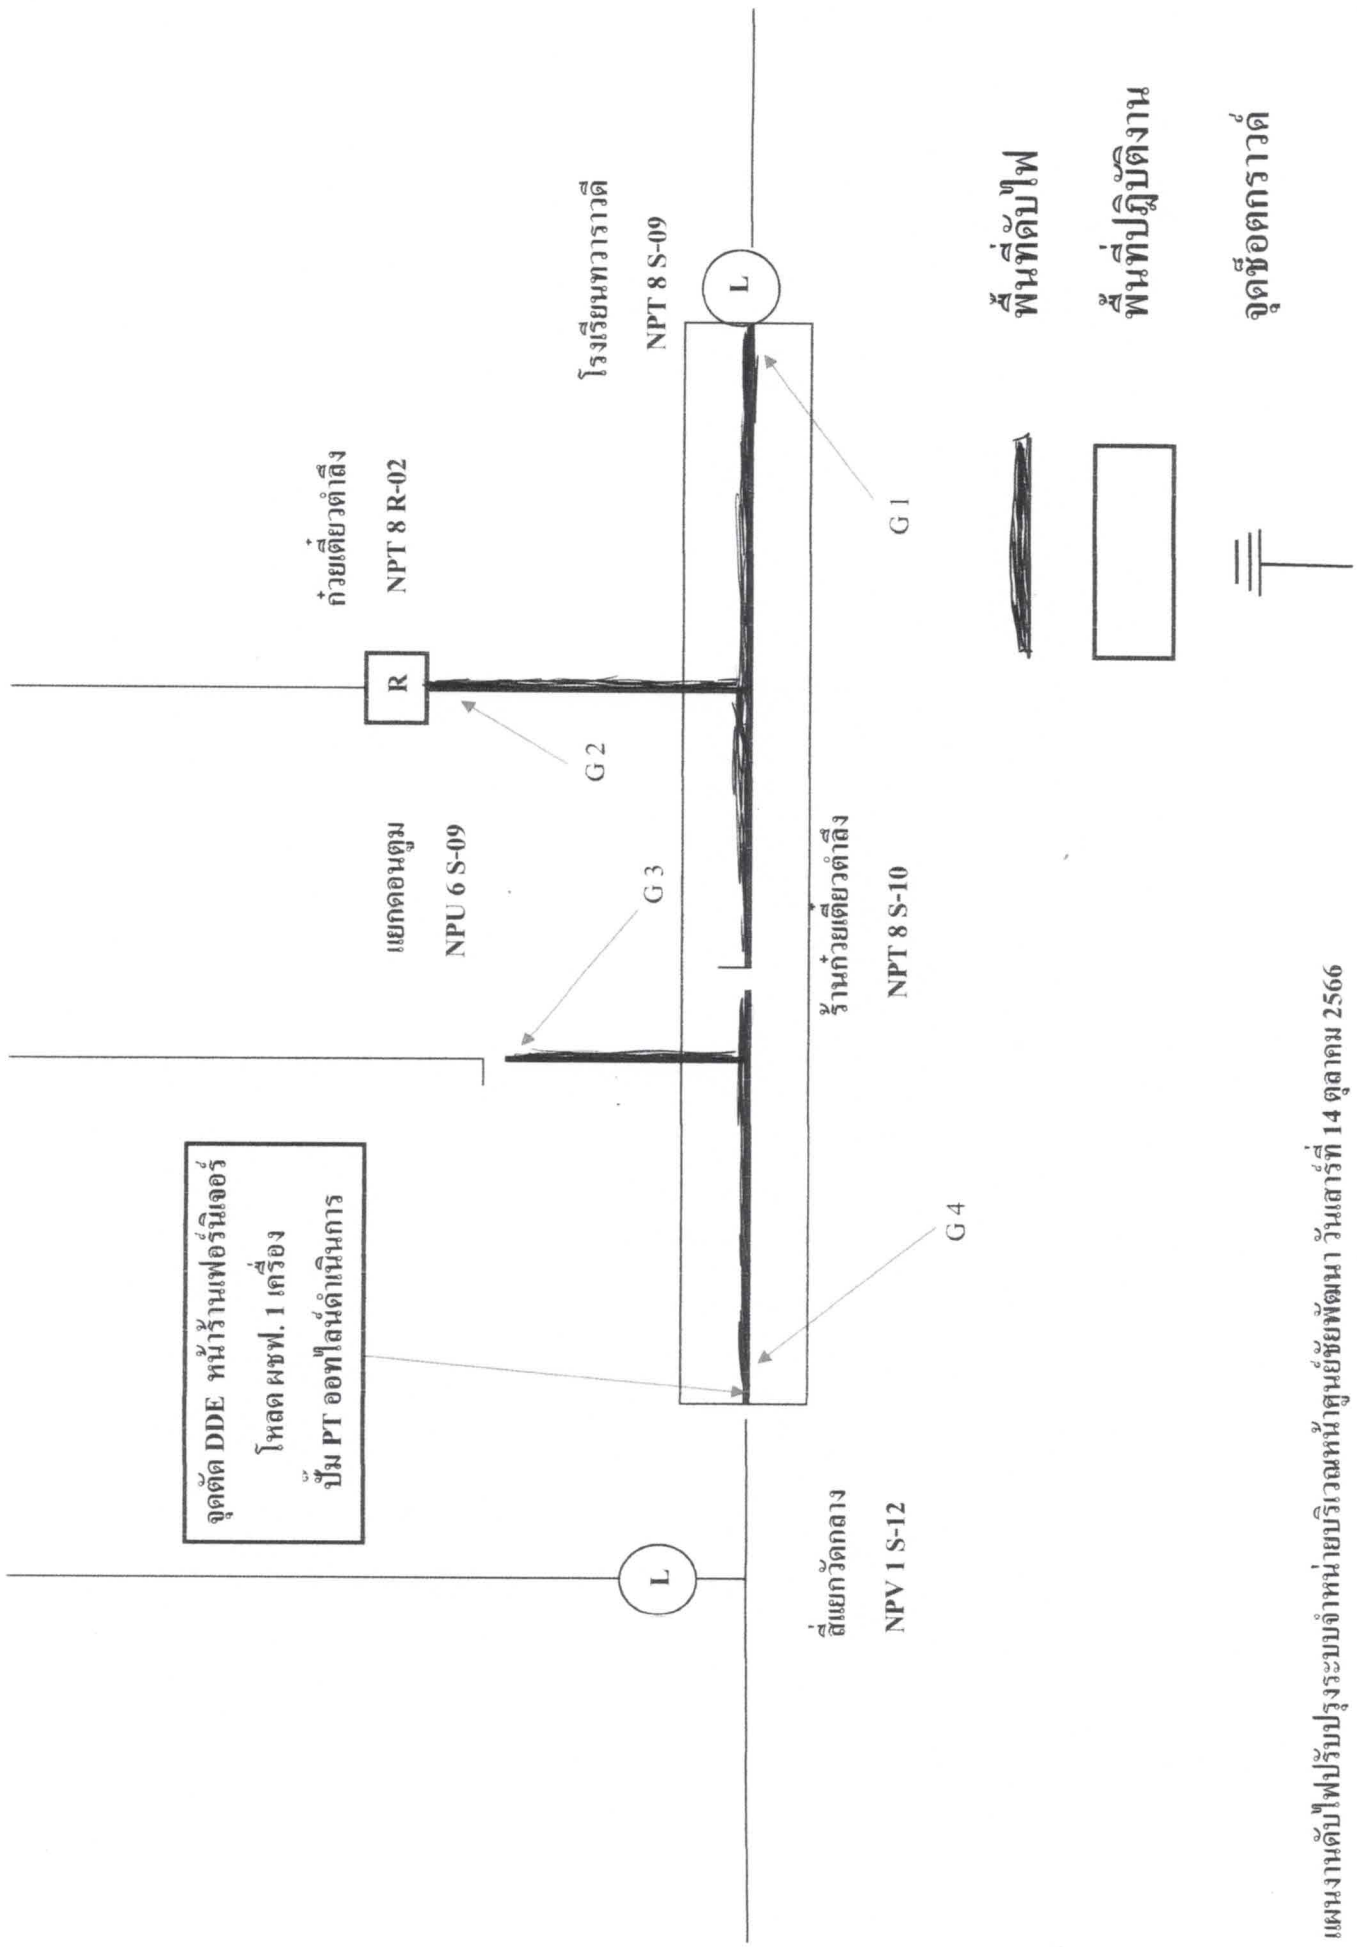

แผนงานดับไฟปรับปรุงระบบจำหน่ายบริเวณหน้าศูนย์พัฒนา วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2566
