



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัชชัย เข็ชชูสุวรรณ

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปักเสา, รื้อถอนและพาดสายแรงสูง สถานีสุพรรณบุรี๒ ตามแผนผัง

ส่งแบบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	8 สท.	2/10/65	08.00	17.00	แก้ไขเสาแรงสูงหัก แยกสารพัดช่าง	DDE จุด A บ้านเจียรนัย	DDE จุด B แยกสารพัดช่าง	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	9 สท.	2/10/65	08.00	17.00	แยกสารพัดช่าง	SPA09S-05	SPA09S-06	
					*งานแก้ไขแรงดัน	SPA07S-07		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญ สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.จ.(สท.) โทร. ๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๗
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)
๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัชชัย เข็ชชูสุวรรณ.....)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สท.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศฟ.) กฟผ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ศฟ. ทิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัด 9PA08 จาก DDE จุด A บ้านเจียรนัย ถึง 16 กรกฎาคม ๖๕
ในวันที่ 2 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1552/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิกัด 9PA09 จาก SPA95-05 ถึง SPA95-06
ในวันที่ 2 ก.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 9PA95-06

พนักงานศูนย์ฯ นาย สวรรค์ จิตรานพวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย ชัชชัย สุวรรณประทีป


นาย สวรรค์ จิตรานพวิทย์

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปบ.(ศฟ.)
เรียน ผจก. นพด.รพ., นพส.ร.๓
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผจพ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณแยก รร.สารพัดช่าง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขเสาแรงสูงหัก		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1552/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	27 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
2	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		LOAD 5.25 MW.
3	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		LOAD 3.01 MW.
4	SPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
5	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		-
6	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		
7	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		LOAD 3.62 MW.
8	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		-
9	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		LOAD 1.05 MW.
10	ย้ายโหลดดวงจรเดียวกัน SPA09						
11	SPA07S-08	ปลด	สับ		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
12	SPA07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 รร.สารพัดช่าง
13	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA09						
14	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
15	DOA09S-06	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 หน้าชุมประตูดัดบางปลาหมอ
16	DIS ชค.ไลน์SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
17	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA04						
18	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
19	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
20	SPA09S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
21	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
22	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
23	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.						
24	SPA09S-05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS คูเมือง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการไลนโหดบริเวณ DDE จุด A ถึงจุด B ได้							
26	เมื่อ กฟจ.สพ.ทำการไลนโหดบริเวณ DDE จุด A ถึงจุด B แล้วเสร็จ							
27	แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด B (แยกสารพัดช่าง) ได้							
28	เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด B (แยกสารพัดช่าง) แล้วเสร็จ							
29	แจ้ง HL ทำการตัด DDE จุด A (หน้าร้านสไมล์) ได้							
30	เมื่อ HL ทำการตัด DDE จุด A (หน้าร้านสไมล์) แล้วเสร็จ							
31	แจ้ง กฟจ.สพ.ทำการจ่ายไฟไลน์ SPA08 ให้ผู้ใช้ไฟบางส่วนได้							
32	DIS ชด.ไลน์SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS	แยกสารพัดช่าง
33	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G1							
34	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G2							
35	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G3							
36	แจ้งหน่วยงานเทสไฟช็อตกราวด์ จุด G4							
37	แจ้งชุด กฟจ.สพ.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน							
38	หลังจากชุด กฟจ.สพ.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย							
39	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
40	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			-
41	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA			-
42	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
43	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			-
44	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA			-
45	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
46	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
47	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
48	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟจ.สพ.รับทราบและปฏิบัติงานได้							
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
49	เมื่อ กฟจ.สพ.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
50	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			-
51	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			-
52	SPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA			-
53	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R	บางปลาหมอ
54	DOA-TP1	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manual</i>		DOA			-
55	DOA-TP2	"OLTC" <i>Auto</i>	"OLTC" <i>Manual</i>		DOA			-
56	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
57	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
58	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA			-
59	แจ้งหน่วยงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรกราวด์ จุด G2						
61	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรกราวด์ จุด G3						
62	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตรกราวด์ จุด G4						
63	DIS ชค.ไลน์SPA08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
64	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE จุด A (หน้าร้านสไมล์) เข้าได้						
65	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE จุด A (หน้าร้านสไมล์) เข้าแล้วเสร็จ						
66	แจ้ง HL ทำการเชื่อม DDE จุด B (แยกสารพัดช่าง) เข้าได้						
67	เมื่อ HL ทำการเชื่อม DDE จุด B (แยกสารพัดช่าง) เข้าแล้วเสร็จ						
68	SPA09S-05	ปลด	สับ		สพ.		DIS คูเมือง
69	ย้ายโหลด SPA09 บางส่วนกลับจาก DOA04						
70	DOA08S-06	ปลด	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
71	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		ขนานบัส
72	SPA09S-06	ปลด	สับ		สพ.		DIS โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี
73	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 การเคหะอยู่ยา
74	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		ขนานบัส
75	ย้ายโหลด SPA08 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DOA09						
76	DIS ชค.ไลน์SPA08	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกสารพัดช่าง
77	DOA09S-06	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 หน้าซุ่มประตูวัดบางปลาหมอ
78	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯวิชัยข้าว
79	ย้ายโหลดวงจร SPA09 กลับสภาพเดิม						
80	SPA07S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 ร.ร.สารพัดช่าง
81	SPA07S-08	สับ	<i>ปิดคาน</i>		สพ.		DIS หมู่บ้านจามจรี
82	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
83	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
84	SPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
85	SPA09R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		สพ.	SCADA	R บางปลาหมอ
86	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
87	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		-
88	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
89	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
90	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		-
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.


ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕

ด้วยในวันที่...๒..เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ...๒๕๖๕... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ...DDE หน้าร้านสไมล์ - DDEสารพัดช่าง...เพื่อ...แก้ไขเสาแรงสูงหัก แยกสารพัดช่าง...โดยมีรายละเอียดพีดีเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดีเตอร์ ..๘..๙.. สถานี ...สุพรรณบุรี... ตั้งแต่บริเวณ .. DDE หน้าร้านสไมล์ - DDEสารพัดช่าง...

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นายปรีชา ทองระย้า ตำแหน่ง ชุดก่อสร้าง กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..เป็นผู้ควบคุมงานและให้...นายวรพล สุทธิไกร ..ตำแหน่ง หน.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ ...๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

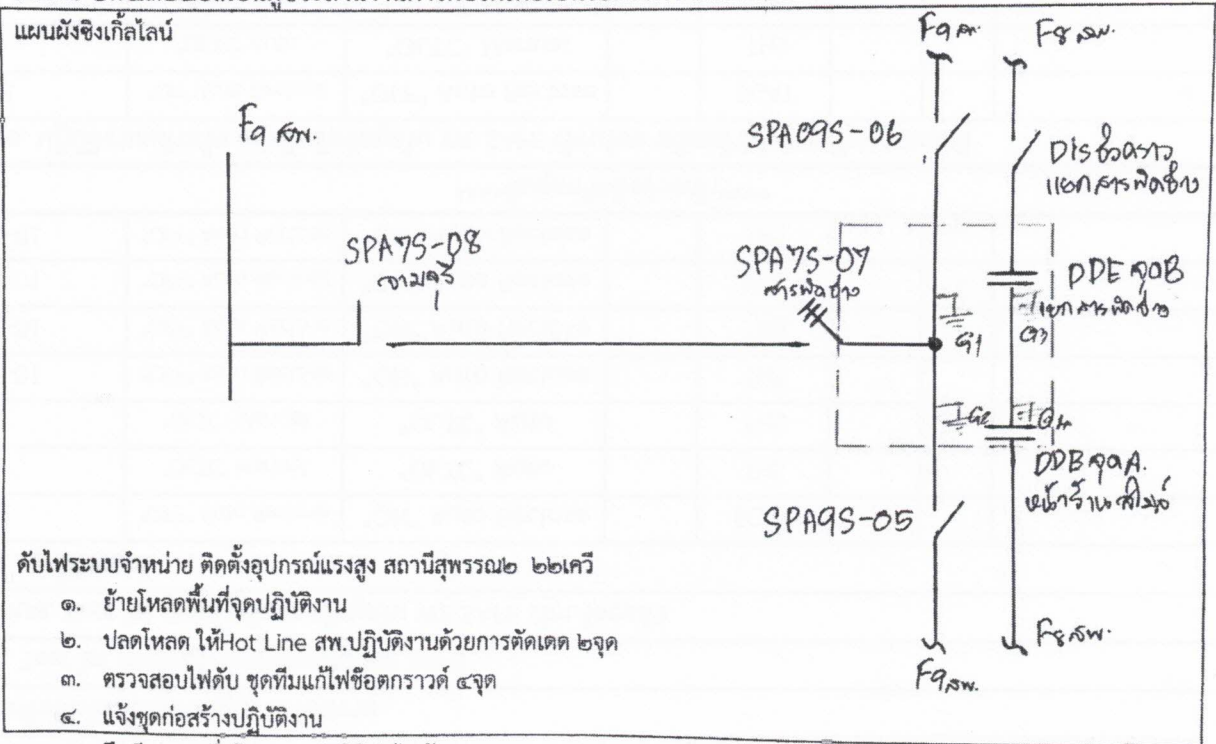

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายชัชชัย เชิดชูสุวรรณ)
รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟจ.สพ.

(นายธนกร สุวรรณประทีป)
พงง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘, ๑๔๘๕๕, ๑๔๘๖๐
