



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กฟภ.สค.๒(บพ.) ๒๕๖๕/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมศักดิ์ นุชสาย

Switching Deadline

2 ต.ค. 65

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ข) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.สค.๒(บพ)

ด้วยการไฟฟ้า กฟภ.สค.๒(บ้านแพ้ว) จะขอตัดไฟระบบสายส่ง ๑๑๕ วงจรที่ ๐๓YB - ๐๓ สฟพ.สมุทรสาคร ๕ เพื่อให้กรมทางฯ ปฏิบัติงานก่อสร้าง
ฐานรากสะพานต่างระดับปากทางบ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สายส่ง ๑๑๕ KV SME ๐๓YB-๐๓	๓ ถึง ๖ ต.ค.๒๕๖๕	๐๘.๐๐ น. (อันเนื่องมาจากงาน แต่ ๓ ชั่วโมง)	๒๒.๐๐ น.	ให้กรมทางฯ ตั้งเครื่องปฏิบัติงาน ก่อสร้างฐานรากสะพานต่างระดับ บริเวณปากทางบ้านแพ้ว	SME ๐๓YB-๐๓	SME ๐๓YS-๐๔ หน้า บ.โคกสถาพร	นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ท.บ.บ. โทรศัพท์ ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....พื้นที่ กฟภ.สค.๒(บพ.) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์ ตำแหน่ง ท.บ.บ. โทร ๐๘๑-๕๒๐๕๐๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมศักดิ์ นุชสาย)

ตำแหน่ง ร.จ.ก.(ข) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.สค.2(บพ)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115KV จาก SME03YB-03 ถึง SME03YS-09

ในวันที่ 3-6 ต.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 22.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1554/25654

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พิดเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิริภัทร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายศักดิ์ชัย จันทนภาวิบูลย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. สค. 2 (บพ.), กฟภ. สค. ๑ กฟภ. กทป.

อก.บ.บ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

กฟอ.อ.ม.น.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจก. 1 (สถานี สมุทรสาคร 5)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ ๐7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางบ้านแพ้ว							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ต.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	6 ต.ค. 65	เวลา	22.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สค.2 (บพว.)	งานที่ทำ	ให้กรมทางฯทำงาน			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1554/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธุ์					วันที่	28 กันยายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	28 กันยายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	28 กันยายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 							


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : ให้กรมทางฯทำงานเวลา 08.00-22.00 น. ไม่มีการ Short Ground						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบ SAA01YB-01,SAA03YB-01 จ่ายไฟแบบ Close loop						
4	SME03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	BAL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTA03YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTE05YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	ONB02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	ตรวจสอบ SME02YB-02,03, SME03YB-02,03, SME04YB-02,03 จ่ายไฟแบบ Close loop						
12	ย้ายโหลดสถานีฯ กระตุ้มแบน 1,สมุทรสาคร 10,อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) ไปรับไฟจาก สถานีฯ สมุทรสาคร 3 ผ่าน สถานีฯ กระตุ้มแบน 2						
13	KTA03YB-01	สับ	ปลด		KTA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
14	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติ ไม่ Low gas						
15	ONB02YS-04	ปลด	สับ ล็อกกุญแจ		กทบ.	LBS	โซคปรธานี
16	ตรวจสอบสถานะ ใบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะไขว้ Open Indicator ไขว้สีเขียวทั้ง 3 เฟส						
17	ONB02YB-01	สับ	ปลด		ONB	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	ตรวจสอบ SME02YB-02,03, SME03YB-02,03, SME04YB-02,03 จ่ายไฟแบบ Close loop						
19	ย้ายโหลดสถานีฯ กระตุ้มแบน 5 ไปรับไฟจาก สถานีฯ สามพราน 1 ผ่าน สถานีฯ กระตุ้มแบน 4						
20	SMD02YB-01	สับ	ปลด		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KTE05YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
24	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME	-	เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
27	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
28	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
29	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
30	SME03YS-09	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	หน้า บ.โชคสถาพร
31	แจ้ง พื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2 (บพว.) ทราบ						
32	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
33	หลังจาก กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
34	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
35	BAL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
36	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
37	KTE04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
38	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
39	เมื่อ กฟจ.สค.2 (บพว.) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
40	จ่ายไฟวันที่ 3 ต.ค. 65 ช่วงเย็น หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
41	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
42	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
43	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
44	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
45	SME03YB-03	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
46	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
47	SME03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	*****สิ้นสุด Switching วันที่ 3 ต.ค. 65*****						
49	Switching วันที่ 4-5 ต.ค. 65						
50	SME03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
51	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
52	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
53	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
55	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
56	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
57	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
58	แจ้ง พื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2 (บพว.) ทราบ						
59	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
60	หลังจาก กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
61	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
63	เมื่อ กฟจ.สค.2 (บพว.) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จและยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
64	จ่ายไฟวันที่ 4-5 ต.ค. 65 ช่วงเย็น หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
65	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
66	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
67	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
68	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
69	SME03YB-03	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
70	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
71	SME03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
72	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
73	Switching วันที่ 6 ต.ค. 65						
74	SME03YB-03	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
75	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
76	SME03YB-02	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
77	SME03YB-03	สับ	ปลด		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
78	SME03YS-03	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
79	SME03YS-04	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
80	SME03YS-05	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
81	SME03YS-06	สับ	ปลด		SME		- ไบมีด 115 เควี
82	แจ้ง พื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สค.2 (บพว.) ทราบ						
83	แจ้ง กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE						
84	หลังจาก กฟจ.สค.2 (บพว.) Test ไฟทุกจุดพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
85	แจ้งให้ผู้ควบคุมงานทราบ และให้ปฏิบัติงานได้						
86	*****สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า*****						
87	จ่ายไฟวันที่ 6 ต.ค. 65 ช่วงเย็น (ย้ายโหลดกลับ)						
88	BAL02YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		BAL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
89	KTB04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
90	KTE04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
91	SME03YS-09	ปลด	สับ ล็อคกุญแจ		สค.	ABS	หน้า บ.โชคสถาพร
92	SME03YS-05	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
93	SME03YS-06	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
94	SME03YS-03	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
95	SME03YS-04	ปลด	สับ		SME		- ไบมีด 115 เควี
96	SME03YB-03	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
97	SME03YB-02	ปลด	สับ		SME		- เบรกเกอร์ 115 เควี
98	ย้ายโหลดสถานีฯ กระทุ้มแบน 5 คืบจาก สถานีฯ สามพราน 1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
99	KTE05YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
100	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
101	SMD02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		SMD		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
102	ย้ายโหลดสถานีฯ กระตุ้มแบน 1,สมุทราศร 10,อ้อมน้อย 5 (ชั่วคราว) คืนจาก สถานีฯ สมุทราศร 3							
103	ONB02YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		ONB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
104	ตรวจสอบสถานะ Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะปกติ ไม่ Low gas							
105	ONB02YS-04	สับ	ปลด ล็อคกุญแจ		กทบ.		LBS	ไซคปราณี่
106	ตรวจสอบสถานะ ไบมีด Load Break Switch 115 เควี รหัส ONB02YS-04 สถานะโชว์ Close Indicator โชว์สีแดงทั้ง 3 เฟส							
107	KTA03YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
108	SME03YB-03	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SME		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
109	BAL02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		BAL		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
110	KTA03YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
111	KTB04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
112	KTE02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
113	KTE05YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
114	ONB02YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		-	เบรกเกอร์ 115 เควี
115	*****สิ้นสุด Switching ทั้งหมด*****							

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ฟีดบ. พร้อมระบุจุด Short Groud. หน้า/หลัง จุดปฏิบัติงาน

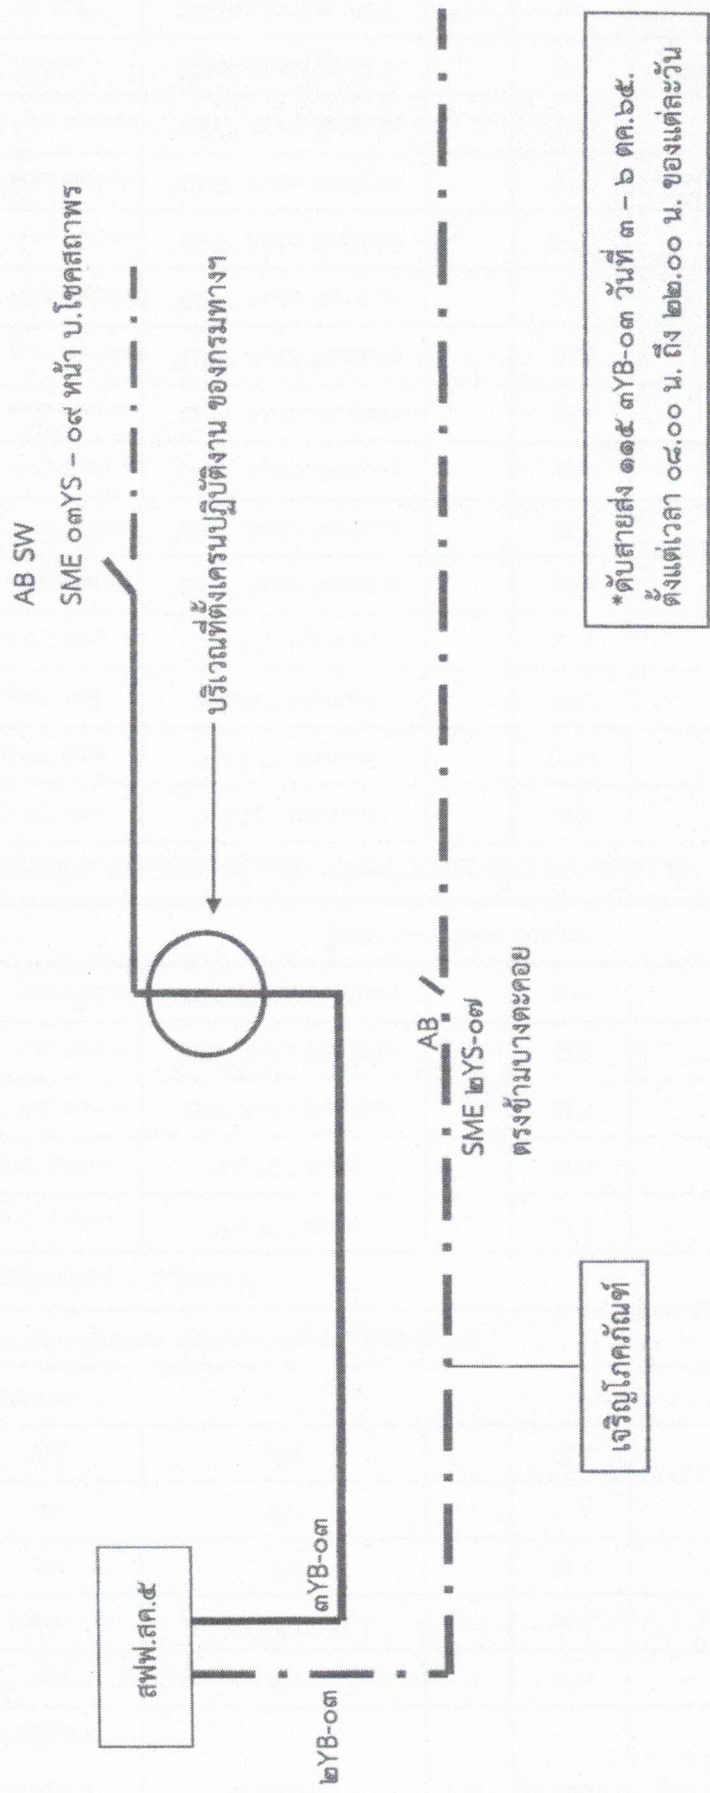

— เส้นที่บแสดงพื้นที่ดับไฟปฏิบัติงาน
⊥ ตำแหน่งจุดช็อตกราวด์
