

Switching Deadline  
วันที่ ๒ ๒๑.๖๕



สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

เลขที่ ฎ.ก.๓.สปจ.(กป.) ๕๕๐ /๒๕๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงห์โตทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายจิระยุทธ อาจศิริ

วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕  
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง หน.ก.ป.รช.แทน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนเสาไฟฟ้าใต้ดินสายส่ง ๑๑.๕ KV บริเวณ หมู่ที่ ๖ ต.วังยาง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ตามแผนผังสิ่งขบแบบ จำนวน ๑ แผน ดังนี้

ที่	พิกัดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติงาน/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC๐5 สปจ.	๗ ต.ค. ๒๕๖๕	๐๙.๐๐น.	๑๓.๐๐น.	รื้อถอนเสาไฟฟ้าต้น ODE ใต้ดินสายส่ง ๑๑.๕ KV บริเวณก่อนถึง บ.ท.จ.	จุดตัด DE กลางไลน์จุด A	DIS SPC๐5-07 บ.ท.จ.	นายจิระยุทธ อาจศิริ โทร.๐๘๗-๐๕๗-๙๘๐๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มี/ไม่ตกผู้ใช้ไฟ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจิระยุทธ อาจศิริ ตำแหน่ง หน.ก.ป.รช.แทน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์ โทร. ๐๘๗-๐๕๗-๙๘๐๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟท. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.ส.กร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจิระยุทธ อาจศิริ)

ตำแหน่ง หน.ก.ป.รช.แทน ผจก.กฟส.ศรีประจันต์

สำเนาแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผศฟ.) กฟท.๓  
 เวียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผศฟ. ที่พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิกัดเคอร์ SPC๐5 จาก DPEจุด A ถึง DIS SPC๐5-07  
 ในวันที่ ๒๐.๑๐.๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1557  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิกัดเคอร์ จาก ถึง  
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิษณุ กุศลประยูร  
 28 ก.ย. 65

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจิระยุทธ อาจศิริ  
 ๒๖ ก.ย. ๖๕  
 ๒๕ ก.ย. ๖๕

ส่วนรับผิดชอบ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(กฟ.)  
 เวียน ผจก. นพ.ส.ล.จ.  
 อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)  
 อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 หรือที่แหล่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผน  
 แผนผังแบบ 1 แผน  
 ผจก. (สถานี) -  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ส่งสารบรรณ 27 ก.ย. 65



## ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	บริเวณก่อนถึง บ.TJC				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	รีดลอนเสาแรงสูง	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1557/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	29 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	29 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	29 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง</b>						
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
3	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-
4	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		-
6	<b>ย้าย SPC 5 บางส่วนไปจ่ายจาก SPA 4</b>						
7	SPC04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SPC		-
8	SPC05S-13	ปลด	สับ		ศปจ.		DIS ก่อนประปาโพธิ์พระยาวังยาง
9	SPC05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ศปจ.		DIS บ.TJC
10	SPC04VB-01	สับ	ปลด		SPC		-
11	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
12	<b>แจ้งหน่วยงาน ทำการปลดโหลดหม้อแปลงก่อนทำการปลด DDE</b>						
13	<b>แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)</b>						
14	<b>เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE จุด A ออกทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย</b>						
15	<b>แจ้งจุดไฟดับชุดปฏิบัติงานรับทราบ</b>						
16	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1</b>						
17	<b>แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2</b>						
18	<b>เมื่อไฟฟ้าทำงาน ทำการเทสไฟ และซ็อตกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย</b>						
19	<b>แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงาน ได้</b>						
20	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC		-
21	SPC05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPC		-
22	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
23	SPA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		-
<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
24	<b>เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมทำจ่ายไฟ</b>						
25	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC		-
26	SPC05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPC		-





**แผนงานรื้อถอนเสาต้น DDE ได้ไลน์สายส่ง 115 Kv  
กฟ.อ.ศรีประจันต์**

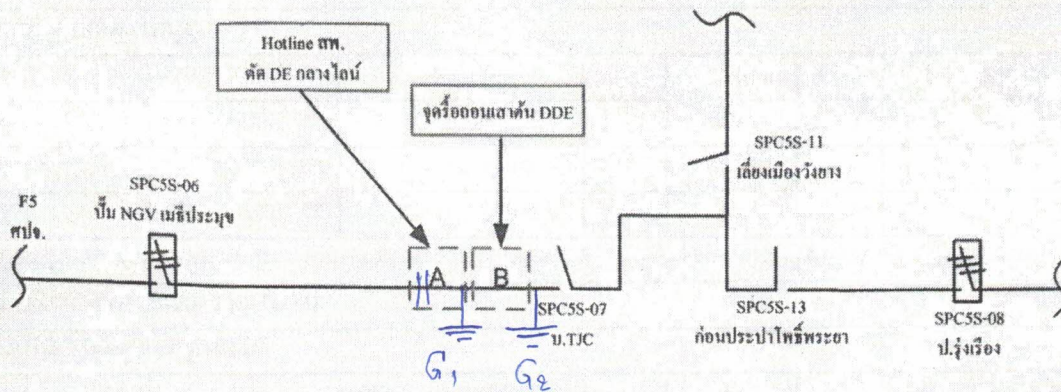

**หมายเหตุ**

1. งานรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงต้น DDE ได้ไลน์สายส่ง 115 KV
2. วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 13.00 น.
3. สับ DIS SPC5S-13 ก่อนประปาโพธิ์พระยา
4. ปลด DIS SPC5S-07 บ. TJC
5. ปลดโหลดหม้อแปลง (ด้านหลังจุด A) เพื่อให้ Hotline สท. ดำเนินการตัด DE กลางไลน์ (จุด A)
6. Hotline สท. ดำเนินการตัด DE กลางไลน์ (จุด A)
7. รื้อถอนเสาไฟฟ้าต้น DDE (จุด B)
8. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จย้ายโหลดกลับ
