

Switching Deadline

วันที่ 6 ธ.ค. 65



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กพส.ปบ.๒๓๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมนุรณ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสุเทพ หอยสังข์ทอง

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กำแพงแสน

ด้วยการไฟฟ้า อ.กำแพงแสน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่าย พีดเตอร์ ๓ สถานีไฟฟ้า กำแพงแสน
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	KSA03	11 ธ.ค. 65	08.00 น.	17.00 น.	พาดสายแรงสูง 185 SAC จำนวน 0.3 วงจร กม.	KSA03S-17 แยกปทุมทอง	KSA03R-02 ปทุมทอง	นายารดร ปสิมมีชัย พขง.๗ ผจก.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑. ทั่วหมู่บ้าน

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศักดิ์รินทร์ จิตติขานนท์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร. ๐๙๑-๙๙๒๘๘๘๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๓.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสุเทพ หอยสังข์ทอง)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน
ผจก.กฟอ.กำแพงแสน
๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕

ส่วนรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กพท.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นคว

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ KSA03 จาก KSA3S-17 ถึง KSA3R-02
ในวันที่ 11 ธ.ค. 65 ตั้งแแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1558

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ พีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิรักษ์ อภิรักษ์วิเศษ โทร. ๐๙๓-๖๖๖๖๖๖๖๖
ประสานงานการขอตัดไฟกับ

28 ธ.ค. 65

(นายสมนุรณ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ปบ. (คคฟ.)
๑๖๖.๖ ทน.๒๒.๐๗


ส่วนรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คคฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. กพร.
อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
คคฟ. (สถานี)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน	DIS KSA03S-17 (แยกปทุมทอง) - KSA03R-02 (ปทุมทอง)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กพส.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1558/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	11 กันยายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กันยายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง							
1	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
2	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
3	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
4	KSA03R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA R	ปทุมทอง
5	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA R	บ้านท่าเสา
6	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก KSA09						
7	KSA03S-19	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
8	KSA03R-02	สับ	ปลด		กพส.	SCADA R	ปทุมทอง
9	แจ้ง กฟอ.กพส.ทำการปลดใบมิตด้าน Source ด้าน Load ออกทั้ง 3 เฟสได้						
10	เมื่อ กฟอ.กพส.ทำการปลดใบมิตด้าน Source ด้าน Load ออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
11	เมื่อ กฟอ.กพส.พร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
12	KSA03S-17	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กพส.		DIS ปากทางวัดปทุมทอง
13	แจ้ง HL กระจายทำการปลด PG โหลดแยกออกทั้ง 3 เฟสได้						
14	เมื่อ HL กระจายทำการปลด PG โหลดแยกออกทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟขอตรารวด จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟขอตรารวด จุด G2						
17	แจ้งชุด กฟอ.กพส.ทำการเทสไฟก่อนปฏิบัติงาน						
18	หลังจากชุด กฟอ.กพส.ดำเนินการเทสไฟแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
19	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
20	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
21	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
22	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA R	บ้านท่าเสา
23	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ชุด กฟอ.กพส.รับทราบและปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	เมื่อ กพอ.กพส.แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
25	KS-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	KS-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
27	KSA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KSA		-
28	KSA09R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
29	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G1						
30	แจ้งหน่วยงานทำการปลดข้อตกราวด์ จุด G2						
31	แจ้ง HL กระเช้าทำการเชื่อม PG โลင်းแยกเข้าทั้ง 3 เฟสได้						
32	เมื่อ HL กระเช้าทำการเชื่อม PG โลင်းแยกเข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
33	KSA03S-17	ปลด	สับ		กพส.		DIS ปากทางวัดปทุมทอง
34	แจ้ง กพอ.กพส.ทำการสับใบมีดด้าน Source ด้าน Load เข้าทั้ง 3 เฟสได้						
35	เมื่อ กพอ.กพส.ทำการสับใบมีดด้าน Source ด้าน Load เข้าทั้ง 3 เฟสแล้วเสร็จ						
36	ย้ายโหลด KSA03 บางส่วนกลับจาก KSA09						
37	KSA03R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
38	KSA03S-19	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		กพส.		SF6 บ.ย่งฟ้า
39	KS-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	KS-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
41	KSA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KSA		-
42	KSA03R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R ปทุมทอง
43	KSA09R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		กพส.	SCADA	R บ้านท่าเสา
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

สถานการณ์จ่ายไฟคอนกรีตปฏิบัติงาน

11 ตุลาคม 2565

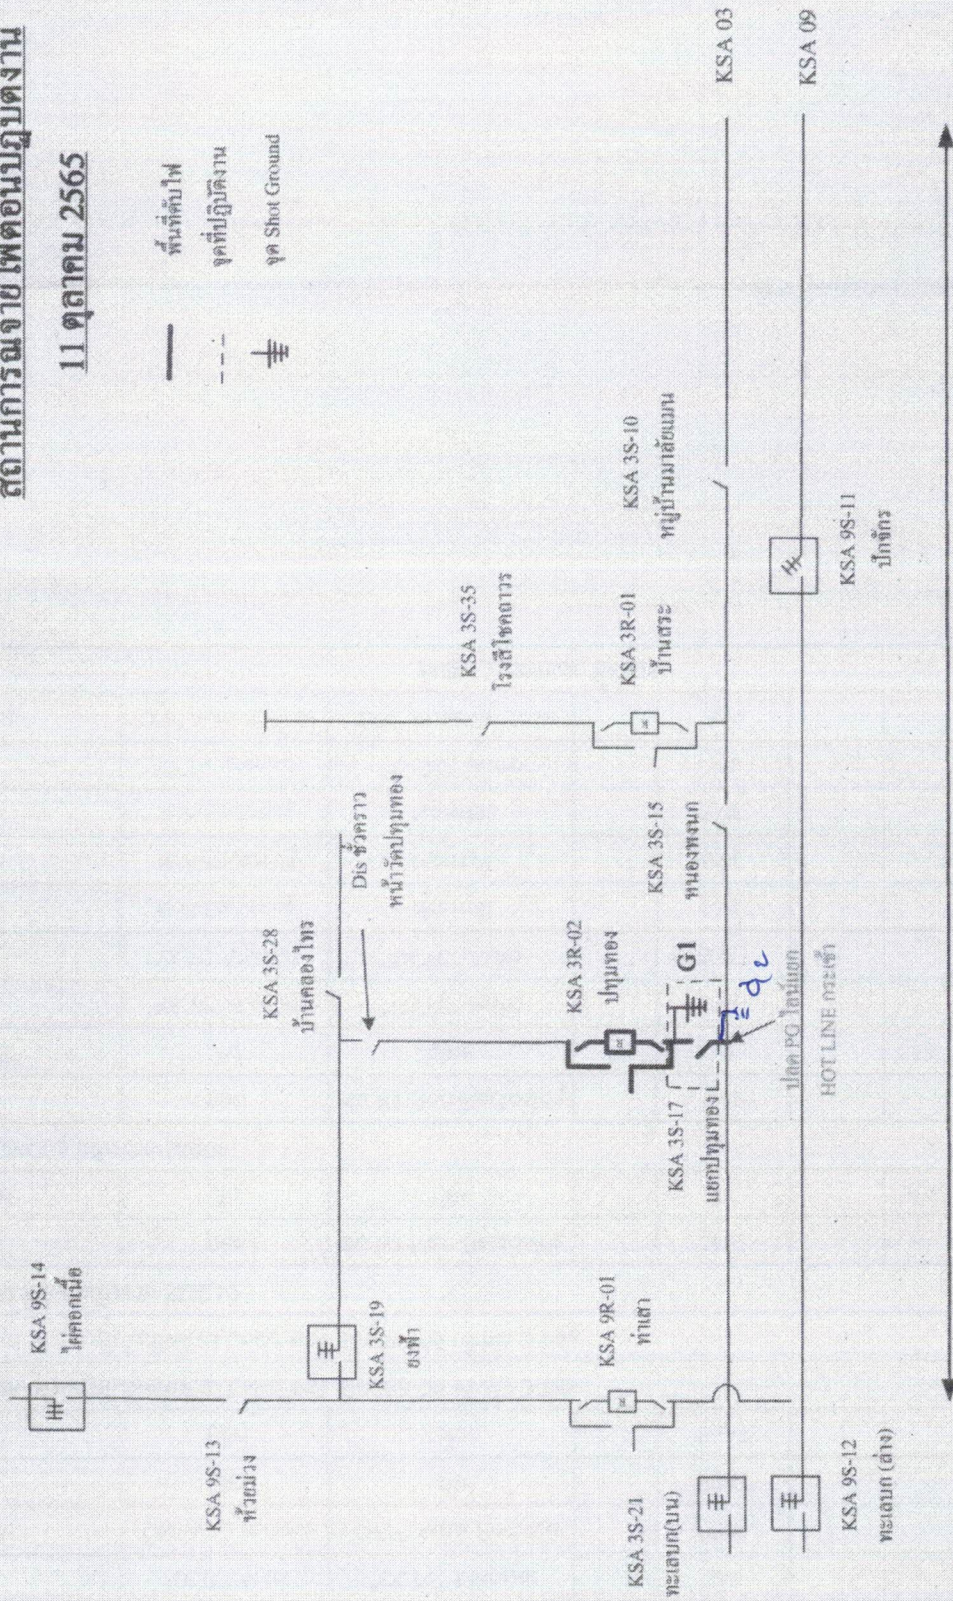

ไปสุพรรณ

ไปกำแพงแสน
