



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
RR PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

28 ต.ค. 67

เลขที่ ก.๓.พทท. ๑๒๕๖๗ / ๒๕๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชล
 ชื่อผู้ส่ง นายสุรวุฒิ นูนนาค

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
 สั่งแบบฉบับ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	UTG09	๒๙ ต.ค. ๖๗ - ๓ พ.ย. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสาขนาด ๑๒.๒๐ ม.	ดิสชั่วคราว ตรงข้ามวัด สระลงเรือ	ดิสชั่วคราว บ้านห้วยลึก	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๑ ราย

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายอนุชา ขันบุญเรือง ตำแหน่ง ผจก.ป. โทร. ๐๘๔-๓๑๖๒๐๑๙

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง
- พิกัดพื้นที่ไฟดับ ๓.๑ จุดเริ่มต้น lat: ๑๔.๓๗๕๓๖๓, long: ๙๙.๗๓๙๑๐๔
 ๓.๒ จุดสิ้นสุด lat: ๑๔.๔๐๒๘๒๗, long: ๙๙.๗๓๐๘๒๒

ลงชื่อ สุรวุฒิ นูนนาค
 (นายสุรวุฒิ นูนนาค)
 ตำแหน่ง ผจก.กฟส.พนมทวน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
 เรียงน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๕ ฟีดเดอร์ UTG09 จาก พวงลมตง ตั้งแต่วันที่ ๒๙.๑๐.๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1584/67
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
- พนักงานศูนย์ฯ หิรัญย์ สุภัทรา วงษ์บุญเรือง ประสานงานการขอตัดไฟกับ อานนท์ อัครวิทย์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียงน ผจก. กฟส. พทท., กฟส. พทท.
 อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

อานนท์
 (นายอานนท์ โพธิ์พันธ์)
 อด.๕ 114 ข.ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง ๔ แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี))
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตรงข้ามวัดสระลงเรือ - บ้านห้วยลึก (UTG09)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 ต.ค. - 3 พ.ย. 67	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปักเสาแรงสูง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1584/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัสชา วงศ์บุญมาก		วันที่ 28 ตุลาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ตุลาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 ตุลาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัฒน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
ทำงานวันที่ 29 ต.ค. 67 ถึง 3 พ.ย. 67 ดับต่อเนื่อง								
สภาพการจ่ายไฟ UTG09 ปัจจุบันไฟดับตั้งแต่ Dis ชค.บ้านผู้ใหญ่ - Dis ชค.ไทยควอลิตี้								
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		CB
3	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
4	DIS ชค.UTG09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ทกจ.		DIS
5	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พทน. รับทราบ							
6	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
7	แจ้ง กฟส.พทน. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
8	แจ้งให้ กฟส.พทน. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
9	แจ้ง กฟส.พทน. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
10	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		CB
****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก****								
11	เมื่อ กฟส.พทน. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
12	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G1							
13	แจ้ง กฟส.พทน. ทำการปลด Short ground จุด G2							
14	UTG-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		TP1
15	UTG-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			UTG		TP2
16	UTG09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			UTG		CB
17	UTG05R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT			ทกจ.		R
18	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
19	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS
20	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS
21	ย้ายโหลด UTG09 บางส่วน คีนจาก UTG05							
22	UTGBVB-01	ปลด	สับ			UTG		CB
23	DIS ชค.UTG09	ปลด	สับ			ทกจ.		DIS
24	UTG05S-13	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ลข.		DIS

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
25	UTGBVB-01	สับ	ปลด			UTG		CB	ขนานบัส
26	นำ Recloser บ้านตลุงเหนือ รหัส UTG09R-01 เข้าระบบ								
27	UTG09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,Block GND			ลข.	SCADA	R	บ้านตลุงเหนือ
28	Sw.Bypass	สับ	ปลด			ลข.		R	บ้านตลุงเหนือ
29	UTG-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		TP1	
30	UTG-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			UTG		TP2	
31	UTG09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			UTG		CB	
32	UTG05R-01	Nonreclosing, ALT	Normal			หจจ.	SCADA	R	สระลงเรือ
33	UTG09R-01	Nonreclosing,GND	Normal			ลข.	SCADA	R	บ้านตลุงเหนือ
****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****									

แผนผังโครงสร้างระบบ

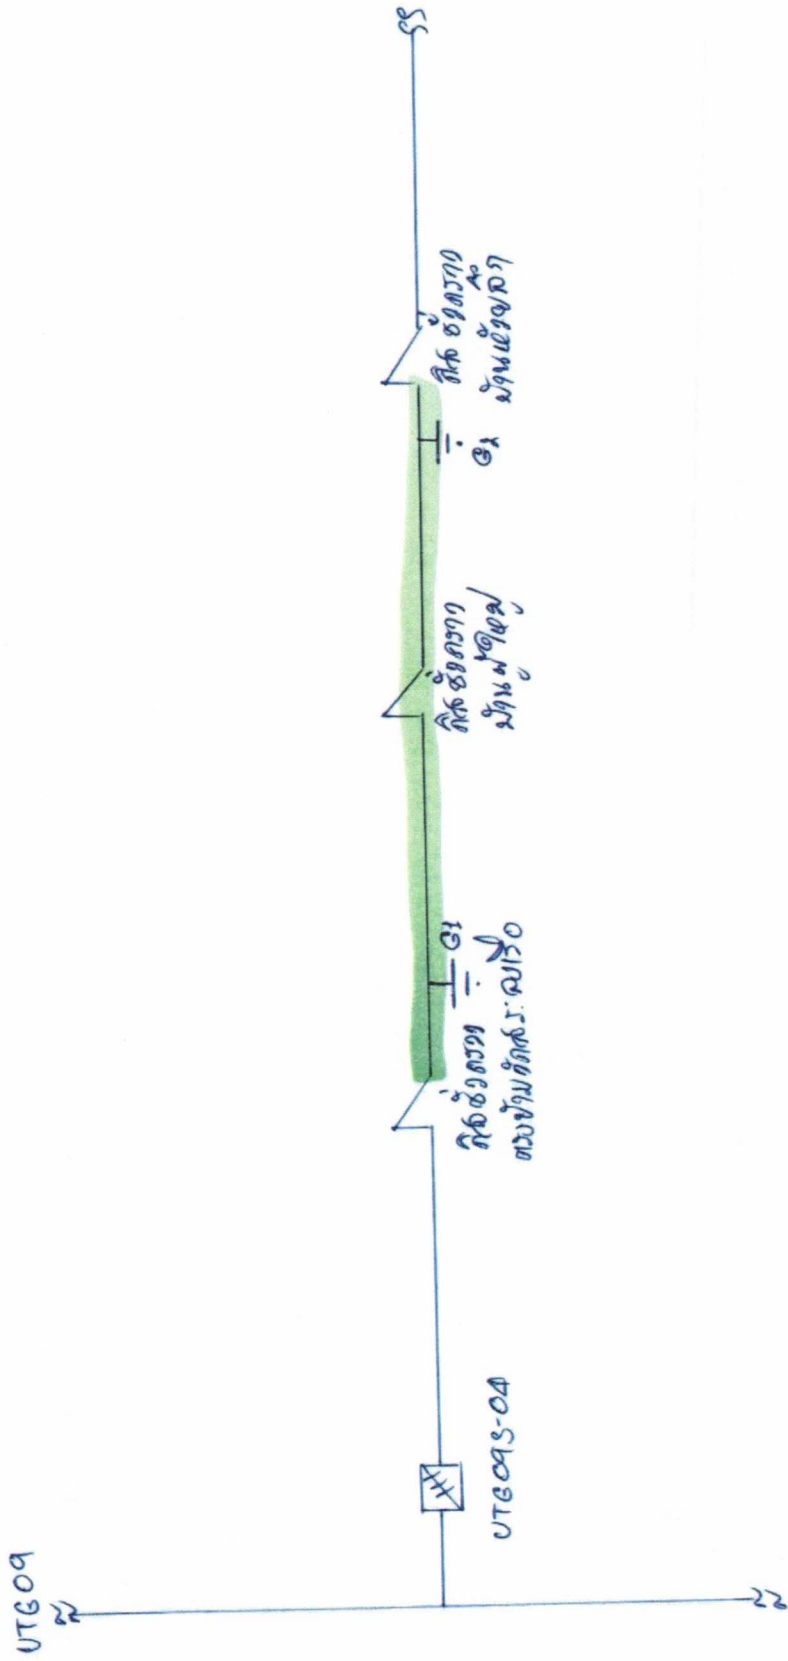

ผู้จัดทำระบบ

[Signature]

(นายอนุชา ชำนาญเรือ)
ชน.ภ.ป.กฟต.พนมทวน
