

เลขที่ ก.๓.สปร.(ขบ) 03861
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณรัชต์
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิดเส็ง

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ดับไฟ ปีกเสา๒๒เมตร แยกโรงน้ำเกลือ-ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว...ตาม
แผนผังสิ่งเขบแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๐๙	๕ พ.ย.๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	ดับไฟปีกเสา๒๒เมตร แยกโรง น้ำเกลือ-ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว	-Disชั่วคราวแยกโรง น้ำเกลือ	-Disชั่วคราวศาลเจ้าพ่อ จักรแก้ว	นายอนุยุทธ ชูโชติ ๐๘๘-๘๘๗๒๙๖๔๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ผู้ใช้ไฟแนวถนนวัดสว่าง-คลองทางหลวง ช่วงแยกโรงน้ำเกลือ-ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนิธินัย ผูกนิม ตำแหน่ง ข.ผ.ปบ. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิดเส็ง)

ร.จก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.สามพราน

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ NCA๐๙ จาก Dis อ.ก.แยกโรงน้ำเกลือ ถึง Dis จด. ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
ในวันที่ 5 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1584/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สิริภัทร โพธิ์มีหนู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายนิธินัย ผูกนิม

(นาย สิริภัทร โพธิ์มีหนู)
อ.ด.ก.4 แทน น.พ.ด.ป.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ส.พร., กฟอ. น.ง.
อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง


1. สถานที่ทำงาน	แยกโรงน้ำเกลือ - ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว (NCA09)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	5 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	5 พ.ย. 66	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1584/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	27 ตุลาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	27 ตุลาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	27 ตุลาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายส (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวุฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง							
2	NCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NCA		-
3	NCA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			NCA		-
4	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		L = 3.01 MW.
5	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			NCA		L = 6.87 MW.
6	NCA09R-01	Normal	Nonreclosing + ALP			NCA	R	คลองทางหลวง
7	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
8	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SAB		L = 6.46 MW.
9	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก NCA06							
10	NCA09S-10	ปลด	สับ			นช.		SF6 หน้าวัดป่าท่ากระชับ
11	NCA09R-01	สับ	ปลด			นช.		R คลองทางหลวง
12	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน ไปรับไฟจาก SAB05							
13	NCA09S-06	ปลด	สับ			สพร.	SCADA	SF6 แยกเข้า อบต.คลองใหม่
14	NCA09S-02	สับ	ปลด + ปิดดาบ			สพร.		SF6 ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
15	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30 น.							
16	DIS ชค. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว
17	DIS ชค. NCA09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			สพร.		DIS แยกโรงน้ำเกลือ
18	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.สพร. รับทราบ							
19	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
20	แจ้ง กพอ.สพร. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							
21	แจ้งให้ กพอ.สพร. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
22	แจ้ง กพอ.สพร. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
23	NCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			NCA		-
24	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			NCA		-
25	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-
26	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose			NCA		-
27	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		28	SAB05VB-01					
29	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
30	เมื่อ กพอ.สพร. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
31	NCA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA	-		
32	NCA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NCA	-		
33	NCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-		
34	NCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA	-		
35	SA2-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT	-		
36	SAB05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAB	-		
37	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
38	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G1							
39	แจ้ง กพอ.สพร. ทำการปลด Short ground จุด G2							
40	DIS ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.	DIS	ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว	
41	DIS ชค. NCA09	ปลด	สับ		สพร.	DIS	แยกโรงน้ำเกลือ	
42	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน คินจาก SAB05							
43	NCA09S-02	ปลด+ล๊อคคาน	สับ		สพร.	SF6	ก่อนถึงศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว	
44	NCA09S-06	สับ	ปลด		สพร.	SCADA SF6	แยกเข้า อบต.คลองใหม่	
45	ย้ายโหลด NCA09 บางส่วน คินจาก NCA06							
46	NCA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing+ ALT		นช.	R	คลองทางหลวง	
47	NCA09S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		นช.	SF6	หน้าวัดป่าท่ากระชับ	
48	NCA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA	-		
49	NCA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NCA	-		
50	NCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	L = 3.01 MW.	
51	NCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA	-	L = 6.87 MW.	
52	NCA09R-01	Nonreclosing	Normal		NCA	R	คลองทางหลวง	
53	SA2-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-		
54	SAB05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAB	-	L = 6.46 MW.	
55	****สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด****							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 ปีกเสา 22 เมตร

ช่วงแยกโรงน้ำเกลือ - ศาลเจ้าพ่อจักรแก้ว

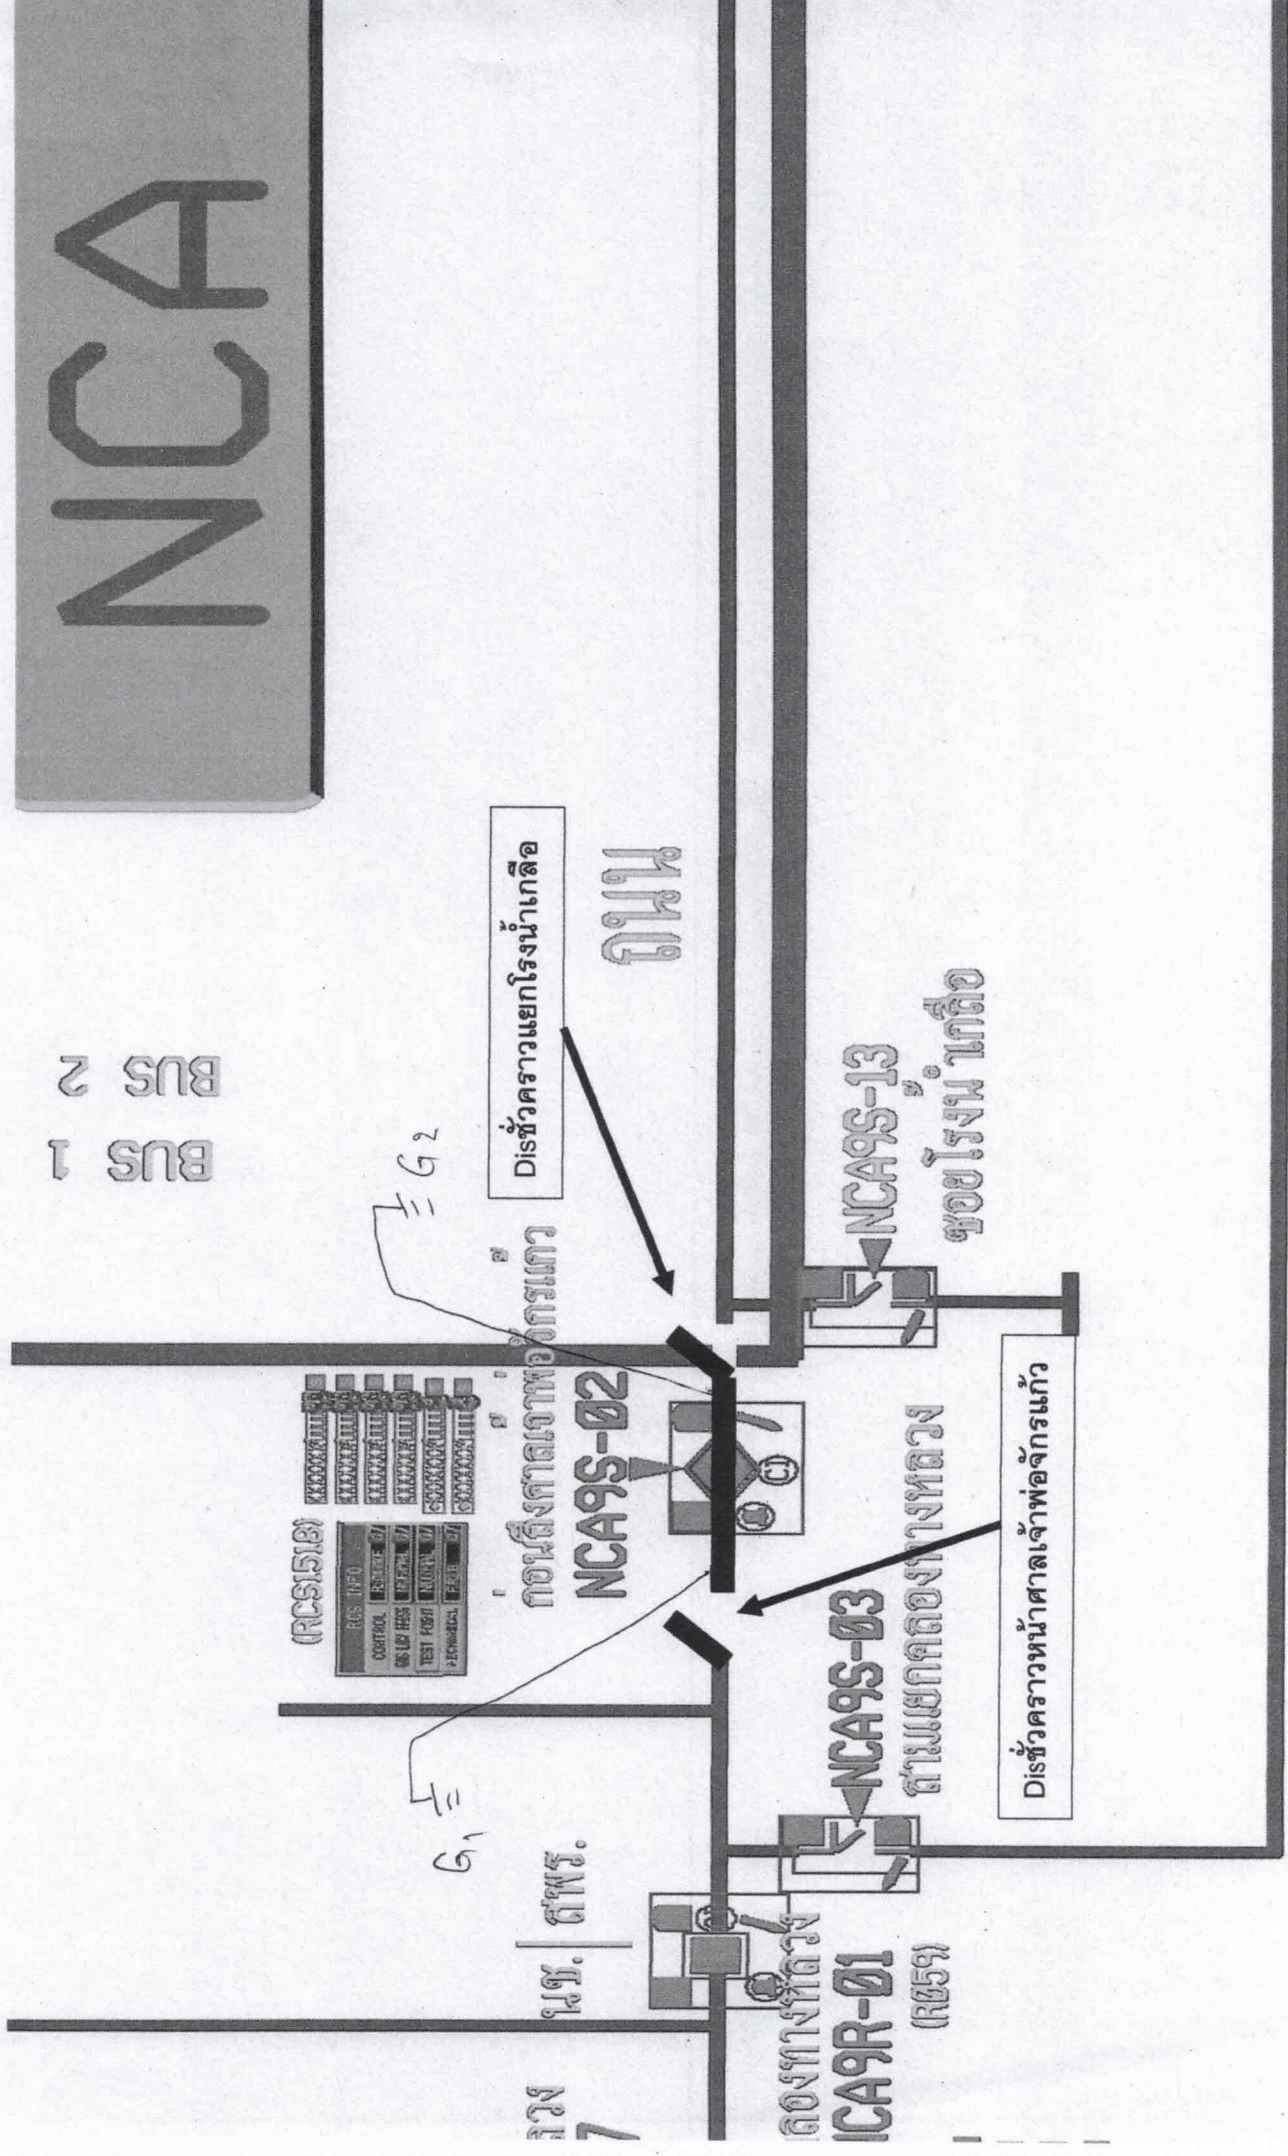

NCA
