

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ นข.(ปบ.) ๑๖๕๖ ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิวาสวรรณ์ชล
 ชื่อผู้ส่ง นายวนภูมิ บำรุงศรี

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

ด้วยการไฟฟ้า นครชัยศรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายสถานีไฟฟ้า NCA
 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๔ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	NCA๔Y	๑๒ ต.ค. ๖๕ ถึง ๑๓ ต.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ -	- ๐๙.๐๐	ยกกระดัดสายไฟ ระบบ ๑๑๕เควี ให้กรมทาง หลวงสร้างสะพาน ข้ามถนนเพชรเกษม	- NCA๔YS-๐๖	- DDE. บ้านสวนตาล	นายชลิต สีขาวซ่า ๐๘๑๗๐๕๕๒๕๐ ดับไฟ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชลิต สีขาวซ่า ตำแหน่ง ทผ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี โทร. ๐๘๑-๗๐๕๕๒๕๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวนภูมิ บำรุงศรี)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.นครชัยศรี

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA4Y จาก NCA4YS-06 ถึง DDE บ้านสวนตาล
 ในวันที่ 12-13 ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๐๙.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1587/65

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์เทพ ชาญเงิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายชลิต สีขาวซ่า

(นายชณดิษฐ์ ชาญสมฤทธิ์)
 รจก.๖ ททท.พ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.๖๕

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
 แผนผังแนบ 3 แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	NCA04YS-06(ตรงข้ามวัดเสถียร)-DDE บ้านสวนตาล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12-13 ต.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	09.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.นช.	งานที่ทำ	สร้างสะพานข้ามถนนเพชรเกษม		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1587/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	8 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายพิชชา,นายสุธี,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ Load Break Switch 115 เควี รหัส NCA04YS-06 ตรงข้ามวัดเสถียร อยู่สถานะปลดพร้อมล๊อคกุญแจ						
3	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า115kV ทำการตัด DDE บริเวณบ้านสวนตาล ออกทั้งสามเฟส						
5	หลังจากชุดฮอทไลน์กระเช้า115kV ทำการตัด DDE บริเวณบ้านสวนตาล ออกทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กพอ.นครชัยศรี รับทราบ						
7	แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ลงรายละเอียดใน WE SAFE						
8	แจ้ง กพอ.นครชัยศรี ให้กรมทางหลวงปฏิบัติงานได้						
9	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 12 ต.ค. 65							
10	หลังจาก กพอ.นครชัยศรี ให้กรมทางหลวง ปฏิบัติงานเสร็จ และย้ายโหนดกลับคืน วันที่ 13 ต.ค. 65						
11	NCA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	แจ้งชุดฮอทไลน์กระเช้า115kV ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านสวนตาล เข้าทั้งสามเฟส						
13	หลังจาก ชุดฮอทไลน์กระเช้า115kV ทำการเชื่อมDDE บริเวณบ้านสวนตาล เข้าทั้งสามเฟส แล้วเสร็จ						
14	NCA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

NCB3YS-04

NCA4YS-07


NCA4YS-06

NCA4YS-05

NCA4Y

สถานะการจ่ายไฟก่อนปฏิบัติงาน

(นายชลิต สีขาวำ)
ทผ.ปป.ภพอ.นครชัยศรี

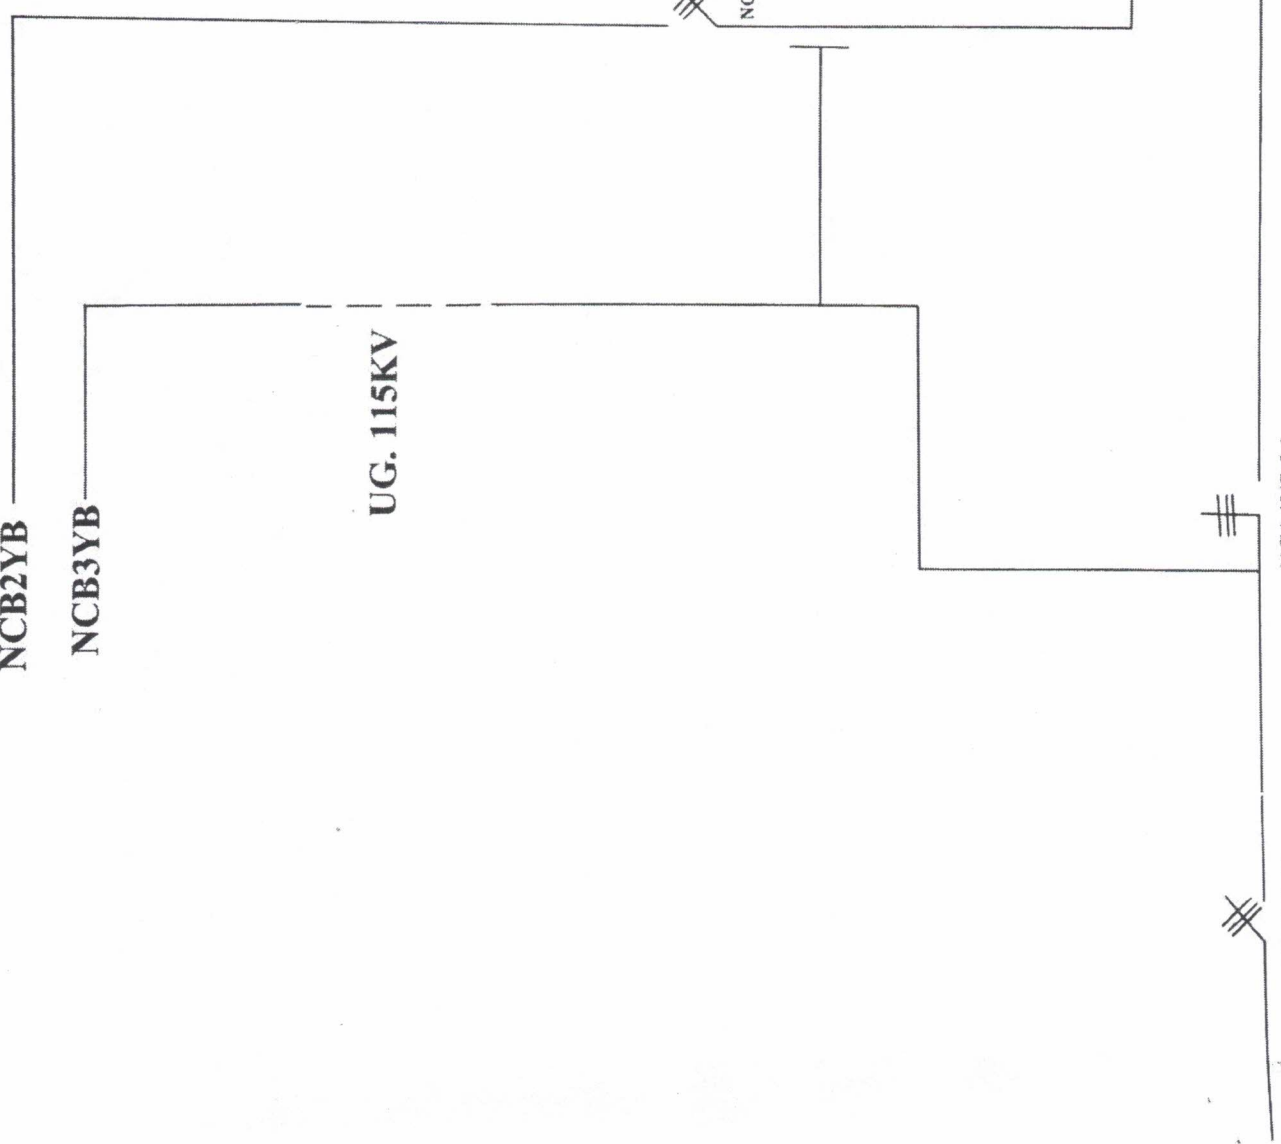

NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

สถานะการจ่ายไฟตอนปฏิบัติงาน

NCA4YS-07




(นายชลิต สีขาวซ่า)
ทพ.ปบ.กฟอ.นครชัยศรี


NCA4Y

NCA4YS-05

DDE. บ้านสวนตา ใช้ชุด Hot Line 115




จุดกรมทางหลวงปฏิบัติงาน



NCA4YS-06

NCB3YS-04

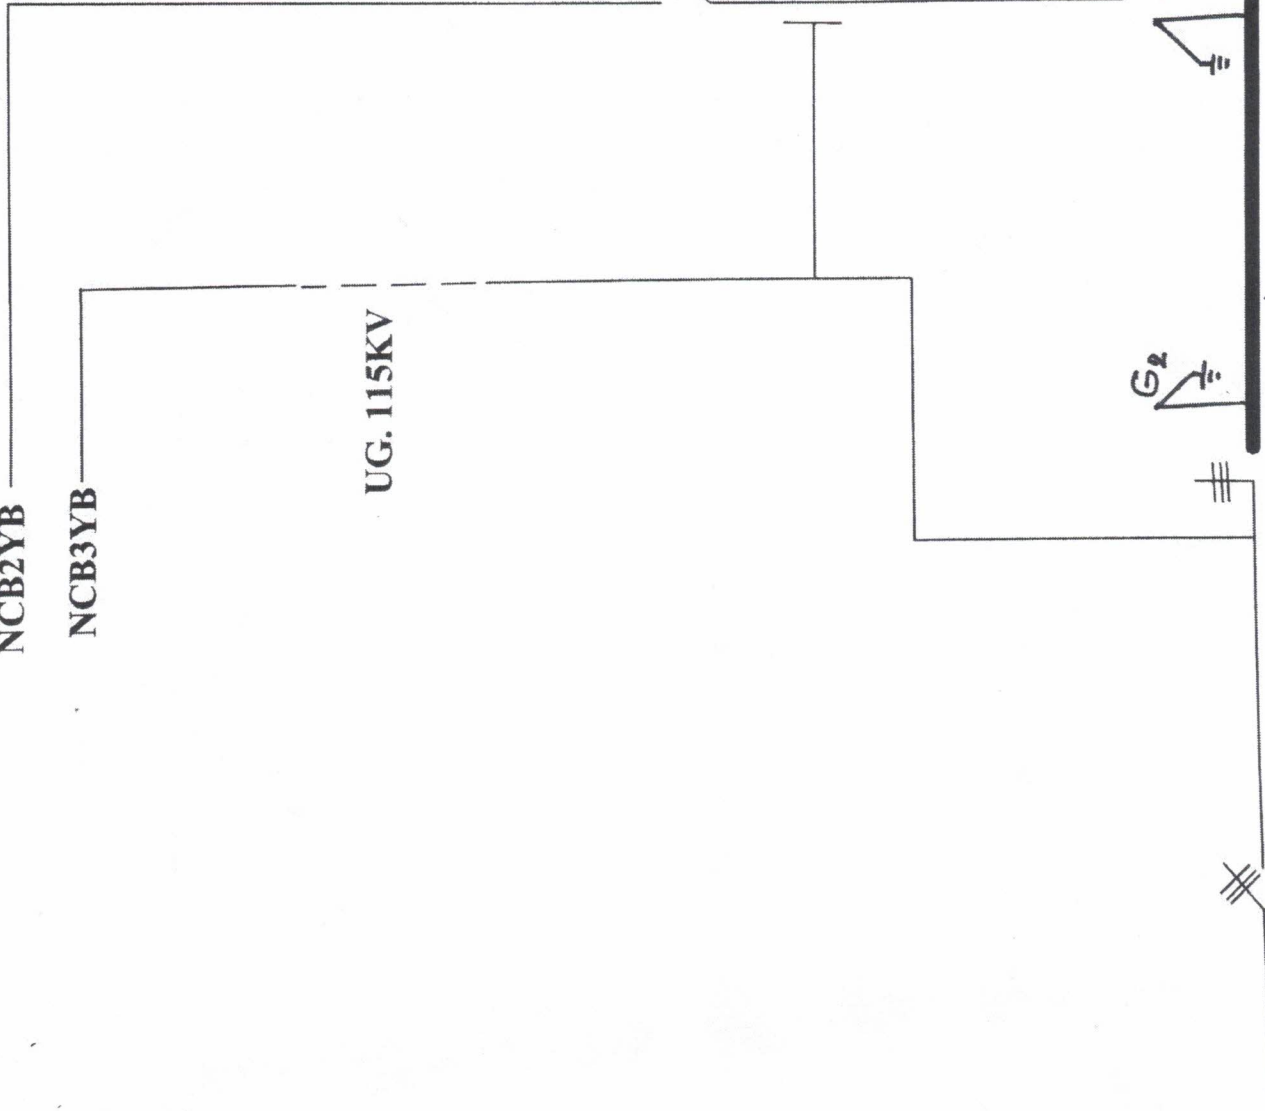


NCB2YB

NCB3YB

UG. 115KV

สถานะการจ่ายไฟหลังปฏิบัติงาน

NCA4YS-07


 (นายชลิต สีขาวขำ)
 หน.บ.บ.กพอ.นครชัยศรี

≡

NCA4YS-06

≡

NCA4YS-05

NCA4Y

≡

NCB3YS-04

จัม DDE. บ้านสวนตาตาด เข้าโดย Hot Line 115
