



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 24 พ.ย. 64

เลขที่ ก.๓.พทช.(กป) ๑๖๗๗/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมเจตน์ ณะวังกู

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พุทธรณทล.

ด้วยการไฟฟ้า สาขา อ.พุทธรณทล. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่าย ๒๒ เควี สถานีจ่ายไฟ พุทธรณทล ๒ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒	๒๕ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐	๙.๐๐	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ในสนามกอล์ฟ	PMB 2S-06	PMB 2S-08	นายชัชวาล เจริญเชื้อ
๒	๒	๒๕ พ.ย. ๖๔	๑๒.๓๐	๑๓.๐๐	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ในสนามกอล์ฟ	PMB 2S-06	PMB 2S-08	โทร๐๘-๒๓๒๒๖๖๖
๓	๒	๒๕ พ.ย. ๖๔	๐๘.๓๐	๑๓.๐๐	ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง ในสนามกอล์ฟ	PMB 2S-06	DDE วงเวียนข้างบ้าน หมอบประกิตเฝ้า	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๓๐

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพลกฤต นรรมย์วิสต์ ตำแหน่ง ผจก.กป.โทร.๐๘-๓๐๑๔๙๗๘๐

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ นายสมเจตน์ ณะวังกู
(นายสมเจตน์ ณะวังกู)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พทช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1793 ฟีดเดอร์ PM002 จาก PMB2S-06 ถึง PMB2S-08, DDE. 00B
ในวันที่ 25 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1590/2564

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ๑๓๖๖๖ ทัฬหกุล ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพลกฤต นรรมย์วิสต์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส. พทท.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

นายพลกฤต ทัฬหกุล
๒๐๓.๔ นน. ๒๓.๐๓.๖๔

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 2 แผ่น

ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ (วงจร PMB02)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

25 พ.ย. 64

ระหว่าง

08.30 น.

ถึง

13.00

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กฟส.พทท.

งานที่ทำ

ย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูง

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1590/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

วันที่

24 พฤศจิกายน 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

24 พฤศจิกายน 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

24 พฤศจิกายน 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
3	เมื่อพร้อมดับไฟ 1๐๖ ๐๘.๓๐ น.						
4	PMB02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		พมท.		DIS หลังสนามกอล์ฟ
5	ตรวจสอบ SF6 รหัส PMB02S-08 บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ อยู่สถานะ "OPEN พร้อม ล็อคคาน"						
6	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พุทธมณฑล ทราบ						
7	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
9	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ทำการปลด DDE วงจร PMB02 บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ ออกทั้ง 3 เฟส (แบบไม่มีไฟ) ๑๑ B						
10	หลังจาก กฟส.พุทธมณฑล ทำการปลด DDE วงจร PMB02 บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
11	จ่ายไฟหลังจุดปลด DDE						
12	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		Load 6.0 MW
13	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3 ออก						
14	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
15	PMB02S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พมท.		SF6 สนามกอล์ฟรอยัลเจม
16	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พุทธมณฑล ทราบ						
17	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
18	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
19	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
20	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
21	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ทำการดับไฟเพื่อเชื่อม DDE						
22	PMB02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		
23	SLY09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SLY		
24	เมื่อพร้อมดับไฟเชื่อม DDE						
25	PMB02S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พมท.		SF6 สนามกอล์ฟรอยัลเจม

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.พุทธมณฑล ทราบ						
27	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
28	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ทำการเชื่อม DDE วงจร PMB02 บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ เข้าทั้ง 3 เฟส (แบบไม่มีไฟ) ๑๐ B						
29	หลังจาก กฟส.พุทธมณฑล ทำการเชื่อม DDE วงจร PMB02 บริเวณสนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์ เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย 1						
30	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1 ออก						
31	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2 ออก						
32	แจ้ง กฟส.พุทธมณฑล ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3 ออก						
33	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
34	PMB02S-06	ปลด	สับ		พมท.		DIS หลังสนามกอล์ฟ
35	PMB02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		
36	SLY09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SLY		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

ผังการจ่ายไฟ พีดีเคอร์ ๒ สถานีจ่ายไฟพทุมณฑล ๒

SLY 9

PMB 2S-08




PMB 2S-07

สนามกอล์ฟเดอะรอยัลเจมส์

PMB 2S-06

PMB 2

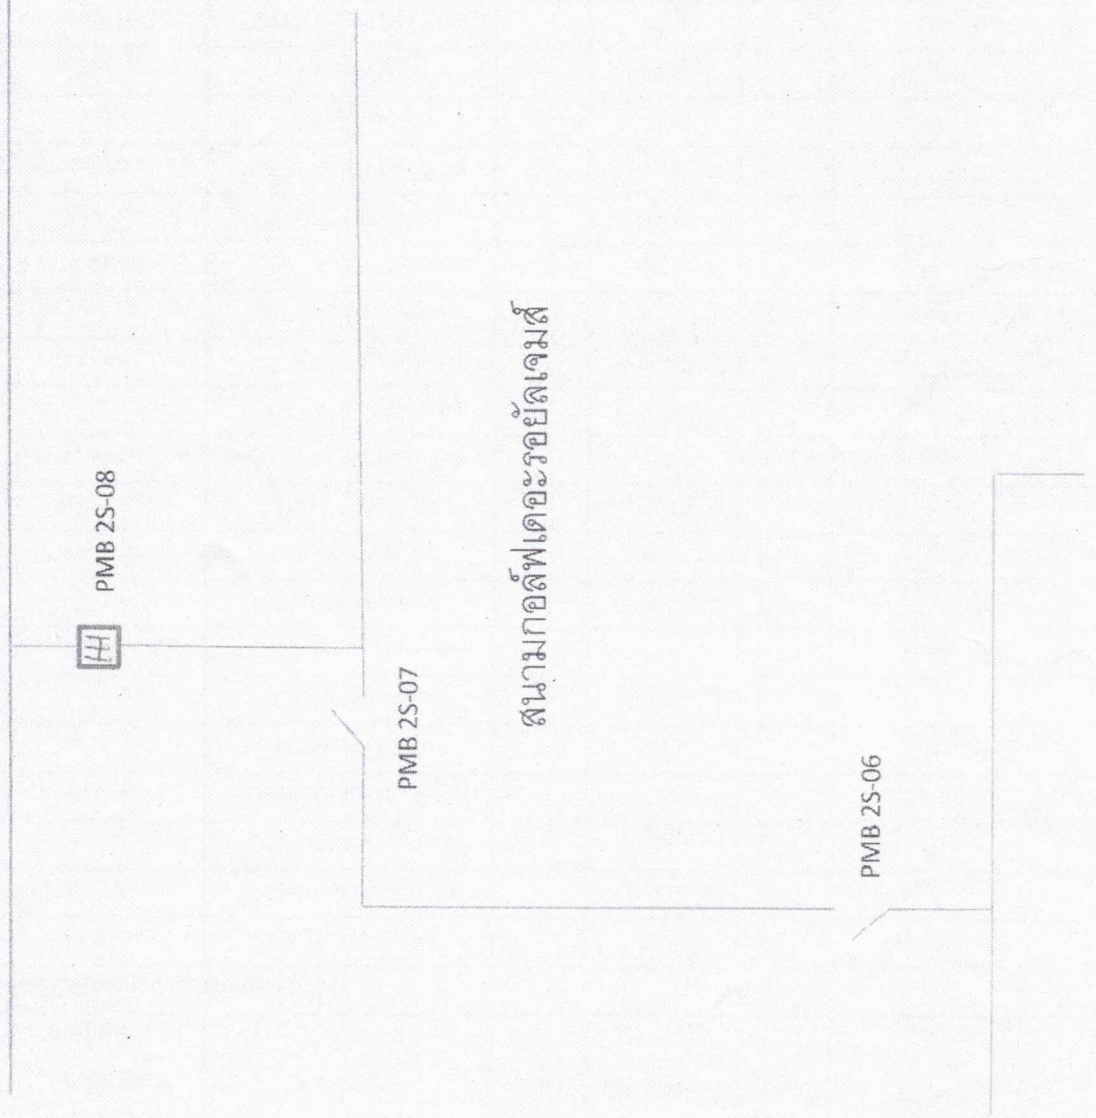

ผังการดับไฟ พีตเคอร์ ๒ สถานีจ่ายไฟฟ้าพุดมณฑล ๒

SLY 9

๑. จุด A ถึง C ดับ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐
และเวลา ๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น.

เพื่อเปิด DDE และ ต่อ DDE

๒. จุด A ถึง B ดับเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๓.๐๐ น.
เพื่อย้ายเสาไฟฟ้า

