



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

วันที่ 12 ต.ค. 65

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปบ.) 03764
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒน์นานนท์

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.จก.กฟอ.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อ ตัดDDE และตัดDis ชั่วโมงเพื่อล็อคพื้นที่ดับไฟให้กรมทางหลวงวางท่อระแนงหน้าหน้าสถานี SAC ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผน ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NCA๕YS	๑๓ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐	ตัดDDE ตัดDisชั่วคราวบริเวณล็อคจุดดับไฟให้กรมทางหลวงวางท่อระบายน้ำ	SAC	PMB NCA๕YS-๐๖	นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ๐๘๙-๙๘๑๔๓๗๒๒
๒	SAC๐๒	๑๓ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐		SAC๐๒	SAC๐S-๐๒, Dis ชั่วคราวหน้าแพชวัล	
๓	SAC๐๗	๑๓ ต.ค.๖๕	๐๘.๐๐	๑๒.๐๐		SAC๐๗	SAC๓S-๐๒, SAC๗S-๐๒, SAC๗S-๐๓, PMB๑S-๐๔	
๔	NCA๕YS	๑๓ ต.ค.๖๕	๑๒.๐๐	๑๖.๐๐		SAC	NCA๕YS-๐๕	
๕	SAC๐๓	๑๓ ต.ค.๖๕	๑๒.๐๐	๑๖.๐๐		SAC๐๓	SAC๓S-๐๒, SAC๓S-๐๓	
๖	SAC๐๙	๑๓ ต.ค.๖๕	๑๒.๐๐	๑๖.๐๐		SAC๐๙	SAC๙S-๐๒, SAC๒S-๐๒	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ตั้งแต่ ๘.๐๐-๑๒.๐๐ ช.ปฐมภักถยา - แพชวัล และ ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ ช.ปฐมภักถยา - ร้านดอยควา

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัชชัย วงศ์บุญมาก ตำแหน่ง ท.ผ.ปบ โทร ๐๘๙-๙๘๑๔๓๗๒๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายวิฑูรย์ ขาดิวัฒน์นานนท์)
ผ.จก.กฟอ.สามพราน


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ พิดเตอร์ NCA๕YS จาก SAC ถึง PMB, NCA๕YS-๐๖ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1601/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๒ พิดเตอร์ SAC๐๒ จาก SAC๐๒ ถึง SAC๐S-๐๒, Dis และ แพชวัล ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1601/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๓ พิดเตอร์ SAC๐๗ จาก SAC๐๗ ถึง SAC๓S-๐๒, SAC๗S-๐๒ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1601/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๔ พิดเตอร์ NCA๕YS จาก SAC ถึง NCA๕YS-๐๕ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1601/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๕ พิดเตอร์ SAC๐๓ จาก SAC๐๓ ถึง SAC๓S-๐๒, SAC๓S-๐๓ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1601/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๖ พิดเตอร์ SAC๐๙ จาก SAC๐๙ ถึง SAC๙S-๐๒, SAC๒S-๐๒ ในวันที่ ๑๓ ต.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....
 พนักงานศูนย์ฯ นาย สหัสสิทธิ์ ใจเย็น ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสมชาย ใจดี


 (นายสหัสสิทธิ์ ใจเย็น) วอ. 4 มท. ๑๓
 วอ. 4 มท. ๑๓


สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. สว.๑๓๗๕, สว.๑๓๗๕, สว.๑๓๗๕
 อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

ขั้นตอนการสวิตซ์ 5 แผ่น
 แผ่นฝังแนบ 2 แผ่น


อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจพ..... (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
 นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๑)


 (นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณร้านดอยคำ - แพชวัล				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ต.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กพอ.สพร.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย SAC02,03,07,09		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1601/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	12 ตุลาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	12 ตุลาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนิช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ ช่วงเช้า เวลา 08.00 - 12.00 น. ดับไฟปฏิบัติงานวงจร SAC02,07 และระบบสายส่ง 115 เควี						
	ช่วงบ่าย เวลา 12.00 - 16.00 น. ดับไฟปฏิบัติงานวงจร SAC03,09 และระบบสายส่ง 115 เควี						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		-
3	SAC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
4	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
5	SAC07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
6	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
7	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
8	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
9	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
10	SAC04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
11	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
12	- ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB10						
13	PMB10S-08	ปลด, ล็อคคาน	ล๊ับ		พทท.		SF6 ตรงข้ามคักดีศรีเจมมอน
14	SAC07S-02	ล๊ับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.	SCADA	SF6 ปากช. หอมเกร็ดหอม
15	- ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SAC06						
16	SAC02S-04	ปลด	ล๊ับ		พทท.	SCADA	SF6 รั้นแก้วฟ้าตุ๊ก (บน)
17	PMB08S-05	ปลด	ล๊ับ		นช.	SCADA	SF6 หลังแบงค์ชาติ
18	DIS ชค. SAC02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS หน้าแพชวัล
19	PMB08S-05	ล๊ับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หลังแบงค์ชาติ
20	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟ Loop 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 Close Loop ปกติ						
21	SAC04YB-01	ล๊ับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	SAC04YS-01	ล๊ับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
23	SAC04YS-03	ล๊ับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
24	PMB05YS-01	ล๊ับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี

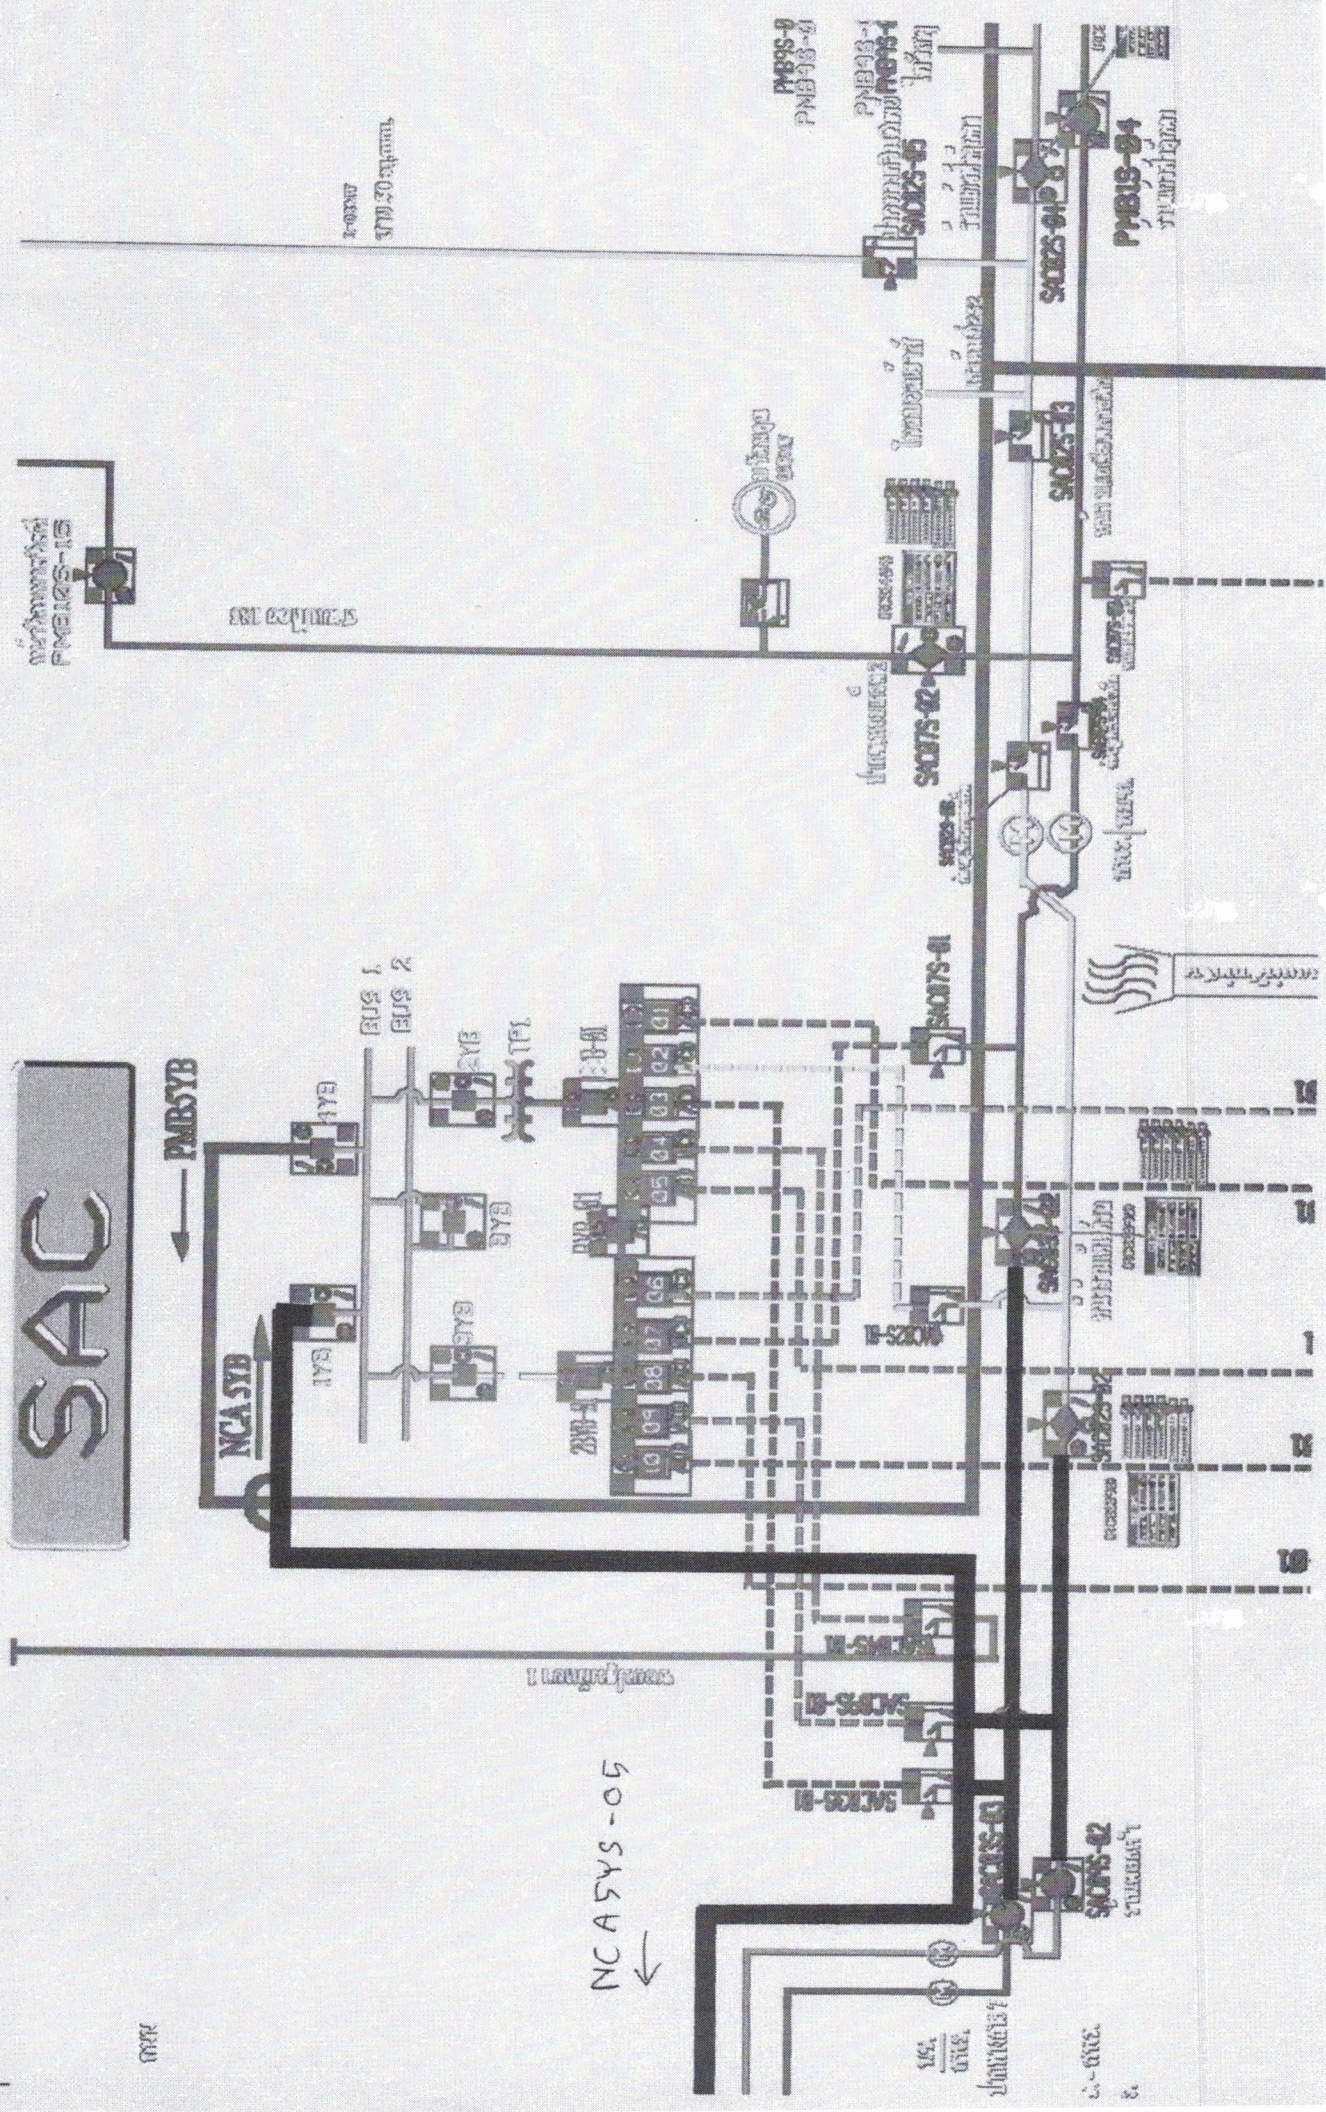
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	PMB05YS-02	สับ	ปลด		PMB		- ไบมีด 115 เควี
26	ตรวจสอบสถานะ SAC02S-02 (SF6 หน้าร้านเต็นท์รถ) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
27	ตรวจสอบสถานะ SAC03S-02 (SF6 หน้าร้านเต็นท์รถ) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
28	ตรวจสอบสถานะ PMB01S-04 (SF6 ร้านแก้วฟ้าตุ๊กตา) อยู่สถานะ <u>ปลด, ล็อคคาน</u>						
29	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
30	SAC02VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
31	SAC07VB-01	สับ	ปลด		SAC		- -
32	SAC02S-01	สับ	ปลด		SAC		DIS Pot Head F2
33	SAC07S-01	สับ	ปลด		SAC		DIS Pot Head F7
34	NCA05YS-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		ABS บางเตย ซ.4
35	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
36	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
37	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
38	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (115 เควี)						
39	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (115 เควี)						
40	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
41	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
42	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
43	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
44	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
45	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
46	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
47	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
48	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
49	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
50	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
51	และพร้อมปฏิบัติงานช่วงบ่าย เวลา 12.00 - 16.00 น. ดับไฟปฏิบัติงานวงจร SAC03,09 และระบบสายส่ง 115 เควี ต่อ						
52	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G1						
53	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G2						
54	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G3 (115 เควี)						
55	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Short Ground จุด G4 (115 เควี)						
56	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
57	SAC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
58	SAC09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		- -
59	SAC01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
60	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
61	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		-
62	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
63	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		-
64	PMB06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
65	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
66	PMB10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		-
67	OYL04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
68	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี						
69	SAC02S-01	ปลด	สับ		SAC		DIS Pot Head F2
70	SAC07S-01	ปลด	สับ		SAC		DIS Pot Head F7
71	SAC02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
72	SAC07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		-
73	SAC04YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
74	SAC04YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
75	PMB05YS-01	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
76	PMB05YS-02	ปลด	สับ		PMB		- ไบมีด 115 เควี
77	NCA05YS-06	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		สพร.		ABS บางเตย ช.4
78	Close Loop 115 เควี สถานีฯ NCA01,05YB-01 กลับปกติ						
79	SAC04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
80	- ย้ายโหลด SAC07 บางส่วน กลับจาก PMB10						
81	SAC07S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		พทท.	SCADA	SF6 ปากช. ทอมเกร็ดทอม
82	PMB10S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		พทท.		SF6 ตรงข้ามตึกดีศรีเจมมอน
83	- ย้ายโหลด SAC02 บางส่วน กลับจาก SAC06 และย้ายโหลด SAC03 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก PMB08						
84	PMB08S-05	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 หลังแบงค์ชาติ
85	DIS ชค. SAC02	ปลด	สับ		สพร.		DIS หน้าแพชวัล
86	SAC02S-04	สับ	ปลด		พทท.	SCADA	SF6 รั้วแก้วฟ้าตุ๊ก (บน)
87	SAC03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้วดอยคำ (บน)
88	- ย้ายโหลด SAC09 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก NCA09						
89	NCA01S-12	ปลด	สับ		นช.	SCADA	SF6 รัง. ดัชมิลล์
90	SAC09S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพร.		SF6 รั้วดอยคำ (ล่าง)
91	- เมื่อพร้อมดับไฟสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี ปฏิบัติงานเวลา 12.00 น.						
92	SAC03VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
93	SAC09VB-01	สับ	ปลด		SAC		-
94	SAC03S-01	สับ	ปลด		SAC		DIS Pot Head F3
95	SAC09S-01	สับ	ปลด		SAC		DIS Pot Head F9
96	ตรวจสอบสถานะ Low Gas NCA05YS-05 (LBS ปุ่มแก๊ส) ปกติทั้ง 3 เฟส						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
97	NCA05YS-05	สับ	ปลด, ล็อกคกุญแจ		นช.		LBS ป้อนแก๊ส
98	SAC01YB-01	สับ	ปลด		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
99	SAC01YS-01	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
100	SAC01YS-03	สับ	ปลด		SAC		- ไบมีด 115 เควี
101	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
102	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
103	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
104	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3 (115 เควี)						
105	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4 (115 เควี)						
106	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
107	SAC02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
108	SAC07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
109	SAC04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
110	OYL04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		- เบรกเกอร์ 115 เควี
111	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
112	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
113	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
114	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
115	PMB06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
116	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
117	PMB10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
118	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
119	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงบ่าย ***							
120	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
121	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		- -
122	NCS-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
123	NCA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- -
124	NCA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
125	PMB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		PMB		- -
126	PMB08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PMB		- -
127	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี และระบบจำหน่าย 22 เควี						
128	SAC03S-01	ปลด	สับ		SAC		DIS Pot Head F3
129	SAC09S-01	ปลด	สับ		SAC		DIS Pot Head F9
130	SAC03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
131	SAC09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- -
132	SAC01YS-01	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
133	SAC01YS-03	ปลด	สับ		SAC		- ไบมีด 115 เควี
134	SAC01YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
135	ตรวจสอบสถานะ Low Gas NCA05YS-05 (LBS ปัมแก๊ส) ปกติทั้ง 3 เฟส						
136	NCA05YS-05	ปลด, ล็อคกุญแจ	สับ		นช.		LBS ปัมแก๊ส
137	- ย้ายโหลด SAC03 บางส่วน กลับจาก PMB08						
138	SAC03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 รัานดอยคำ (บน)
139	PMB08S-05	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 หลังเบงค์ชาติ
140	- ย้ายโหลด SAC09 บางส่วน กลับจาก NCA09						
141	SAC09S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพร.		SF6 รัานดอยคำ (ล่าง)
142	NCA01S-12	สับ	ปลด		นช.	SCADA	SF6 รัง. ดัชมิลล์
143	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		- -
144	SAC03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
145	SAC09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- -
146	SAC01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
147	NCS-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
148	NCA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- -
149	NCA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NCA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
150	PMB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		PMB		- -
151	PMB08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PMB		- -
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

งานดับไฟสายส่ง ๑๕ KV และ ๒๒ KV วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ช่างบ้าย (๑๒.๐๐-๑๖.๐๐)
 ตัด DDE และตัด Dis ชั่วคราว เพื่อให้กรมทางหลวงทางท่อระบายน้ำฝั่งเข้า กทม.



๓๓/๕

๓๕/๕
๓๖/๕

๓๗/๕
๓๘/๕

ด่วนที่สุด

ที่ สส.๗/๒๕๖๓/๑๑๗๐



โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี
(ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง
๔๔/๗ หมู่ ๕ ถ.บรมราชชนนี ต.หอมเกร็ด
อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐

๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

กฟอ.สามพราน
เลขรับที่ 6690
3 ต.ค. 2565
เวลา ๐๙.๑๗ น.

เรื่อง ขออนุญาตประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างงานระบบระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสามพราน ๓ และติดตามเร่งรัดงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ

เรียน ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคกลาง) จังหวัดนครปฐม

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสามพราน

ตามสัญญาที่ สส.๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ กรมทางหลวง ได้ว่าจ้าง บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รวมระยะเวลาทำการ ๙๙๐ วัน ค่างานก่อสร้าง ๓๖๓,๗๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ค่าปรับวันละ ๙๐๙,๔๒๕.๐๐ บาท นั้น

ด้วยผู้รับจ้าง โดย บริษัท ธงชัยเจริญก่อสร้าง ๒๕๖๖ จำกัด มีแผนงานเข้าดำเนินการก่อสร้างระบบระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสามพราน ๓ (ขาเข้ากรุงเทพ) ซึ่งบริเวณดังกล่าวการก่อสร้างระบบระบายน้ำจะใกล้กับแนวท่อลอดสายไฟฟ้าแรงสูงและเสาไฟฟ้าแรงสูง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในขณะที่ทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ทางโครงการฯ จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการก่อสร้างงานระบบระบายน้ำบริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าสามพราน ๓ รวมทั้งติดตามเร่งรัดงานรื้อย้ายสาธารณูปโภคไฟฟ้าที่ติดขัดงานก่อสร้างของโครงการฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการฯ (หลังสถานีไฟฟ้าสามพราน ๓ กฟภ. ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม) ทั้งนี้โครงการฯ มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ หัสตินรัตน์ ตำแหน่งช่างควบคุมงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๒-๗๖๙๘๖๑๕ เป็นผู้ประสานงาน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย จะขอบคุณยิ่ง

- | | |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> รจก.(ท) | <input type="checkbox"/> รจก.(บ) |
| <input type="checkbox"/> พท.จต. | <input type="checkbox"/> ทน.บป. |
| <input type="checkbox"/> พท.บอ. | <input type="checkbox"/> ทน.บพ. |
| <input checked="" type="checkbox"/> พท.ภค. | <input type="checkbox"/> ทน.คท. |
| <input checked="" type="checkbox"/> ทน.บข. | <input type="checkbox"/> ขทน. |
| <input type="checkbox"/> พท.มท. | <input type="checkbox"/> ลชน. |
| <input type="checkbox"/> จป. | <input type="checkbox"/> ขบท. |
| <input type="checkbox"/> นตค. | <input type="checkbox"/> |

- รายงานด้วย
 เพื่อทราบ
 เพื่อทราบและดำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายวิฑูรย์ ชติวิฒนานนท์)
ผจก.กฟอ.สพร.ชั้น ๒

ขอแสดงความนับถือ

(นายพัฒนศักดิ์ อิบเชย)

ชด.สส. สะพานข้ามแม่น้ำนครชัยศรี (ทางคู่ขนาน)
จ.นครปฐม ๑ แห่ง
