



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.นญช. ๒๕ /๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชรสุวรรณชัย
ชื่อผู้ส่ง นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.นญช.ขอตัดกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน เปลี่ยนโครงสร้างหัวเสาและเปลี่ยนสายเคเบิลอากาศ เพื่อเสริมความมั่นคงและรองรับการจ่ายไฟ. ฟีดเดอร์ ๓ สถานีเลขาวัญ LWA03 ตามแผนผังสังเขปแนบจำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑.	LWA03	๗ ก.พ. ๒๕๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๐๑ เปิดสวิตช์ใบมีด บ้าน ทำปริง DAA๐๒S-๐๖ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้า เลขาวัญ ชุดแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๐๒ เปิดสวิตช์ใบมีด เทศบาล ซอย ๗ DAA๐๒S- ๑๐ วงจร LWA๐๓ สถานี ไฟฟ้า เลขาวัญ	สวิตช์ใบมีด บ้านท่าปริง DAA๐๒S-๐๖ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้า เลขาวัญ	สวิตช์ใบมีด เทศบาล ซอย ๗ DAA๐๒S-๑๐ วงจร LWA๐๓ สถานีไฟฟ้า เลขาวัญ	นาย ศุภลักษณ์ อังศิริ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสำเร็จ แก้วเรือง ตำแหน่ง ผจก.ป โทร. ๐๘๐๒๖๔๓๐๑๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัชชัย จันทร์เพ็ญ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.นญช.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ LWA03 จาก DAA2S-06 ถึง DAA2S-10
ในวันที่ 7 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 161/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์วิเชียร พงษ์ศิริ ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอ.สำเริง ภาวใจอง

(นายพงษ์วิเชียร พงษ์ศิริ)
ว.ก.๕ ทานจผ.คฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กทบ.(คพ)

เรียน อก.บช.(ก3), อก.วว.(ก3) ผจก. พล.อ. ดช., พล.ร. นนช., จง.ส.ตช.

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง.....3.....แผ่น

แผนผังแนบ.....1.....แผ่น

ผจพ. - (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รท.ทบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ทบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านท่าโปรง (LWA03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	7 ก.พ. 67	เวลา 08.30 น.	ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.นญช.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 161/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ		วันที่ 30 มกราคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มกราคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 30 มกราคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
3	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.	R	สามแยกหนองปรือ
4	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.	R	วัดทองเงิน
5	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
6	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
7	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
8	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
9	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
10	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
11	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 4.15 MW
12	ตรวจสอบ Recloser หนองผักนาก รหัส DBA04R-06 อยู่สถานะ "Open+Bypass"						
13	ย้ายโหลด DAA-TP1 ไปจ่ายจาก DAA-TP2						
14	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
15	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 1
16	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนไปจ่ายจาก DBA03						
17	DAA06S-11	ปลด	สับ		SF6	SCADA	ดช. ร้านสกล
18	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
19	DBA04S-08	ปลด, ล็อคคาน	สับ		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว
20	DAA02S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS ซอยเทศบาล 7
21	DAA06S-11	สับ	ปลด		SF6	SCADA	ดช. ร้านสกล
22	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
23	ย้ายโหลด DAA-TP1 กลับจาก DAA-TP2						
24	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 1
25	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนานบัส
26	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
27	DAA02S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นญช.		DIS บ้านท่าโปรง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.นญช. ทราบ						
29	แจ้ง กฟส.นญช. ทำการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
30	แจ้ง กฟส.นญช. ทำการซื้อคกราวด์ จุด G1,G2						
31	แจ้ง กฟส.นญช. ลงข้อมูล Wesafe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
32	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
33	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
34	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.		R วัดทองเงิน
35	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
36	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
37	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
38	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
39	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.		ปากทางบ้านหัวเขา
41	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
42	เมื่อ กฟส.นญช. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมจ่ายไฟคืน						
43	แจ้ง กฟส.นญช. ปลดซื้อคกราวด์จุด G1,G2						
44	LWA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LWA		-
45	LWA07R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
46	DAA06R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		นญช.		R วัดทองเงิน
47	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
48	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		-
49	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
50	DAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		-
51	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
52	DBA01R-02	Normal	Nonreclosing, ALT		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
53	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		-
54	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
55	DAA02S-06	ปลด	สับ		นญช.		DIS บ้านท่าโป่ง
56	ย้ายโหลด DAA-TP1 ไปจ่ายจาก DAA-TP2						
57	DAABVB-01	ปลด	สับ		DAA		- ขนานบัส
58	DAA01BVB-01	สับ	ปลด		DAA		- INCOMING 1
59	ย้ายโหลด LWA03 บางส่วนกลับจาก DBA03						
60	DAA06S-11	ปลด	สับ		SF6	SCADA	ดช. ร้านสกล
61	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
62	DAA02S-10	ปลด	สับ		นญช.		DIS ซอยเทศบาล 7
63	DBA04S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นญช.		SF6 บ้านดอนยาว


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	DAA06S-11	สับ	ปลด		SF6	SCADA	ดช. ร้านสกล
65	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	SCADA	SF6 ตรงข้าม คริสตจักร
66	ย้ายโหลด DAA-TP1 กลับจาก DAA-TP2						
67	DAA01BVB-01	ปลด	สับ		DAA		- INCOMING 1
68	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		- ขนानบัส
69	LWA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LWA		-
70	LWA07R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดช.		R สามแยกหนองปรือ
71	DAA06R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		นญช.		R วัดกองเงิน
72	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
73	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		-
74	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
75	DAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		-
76	DBN-KT2A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
77	DBA01R-02	Nonreclosing, ALT	Normal		ดบ.	SCADA	R ปากทางบ้านหัวเขา
78	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

แผ่นที่ ๑

แผนผัง Single line Diagram แสดงพื้นที่ตัดไฟ เพื่อปฏิบัติงาน

เปลี่ยน โครกรังสร้างหัวเสาและเบ็ดเตล็ดสายเคเบิลอากาศ เพื่อเสริมความมั่นคงและรองรับการจ่ายไฟ ฟีดเตอร์ 3 สถานีเลาขวัญ LWA03

วันพุธ ที่ 7 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30-17.00 น.

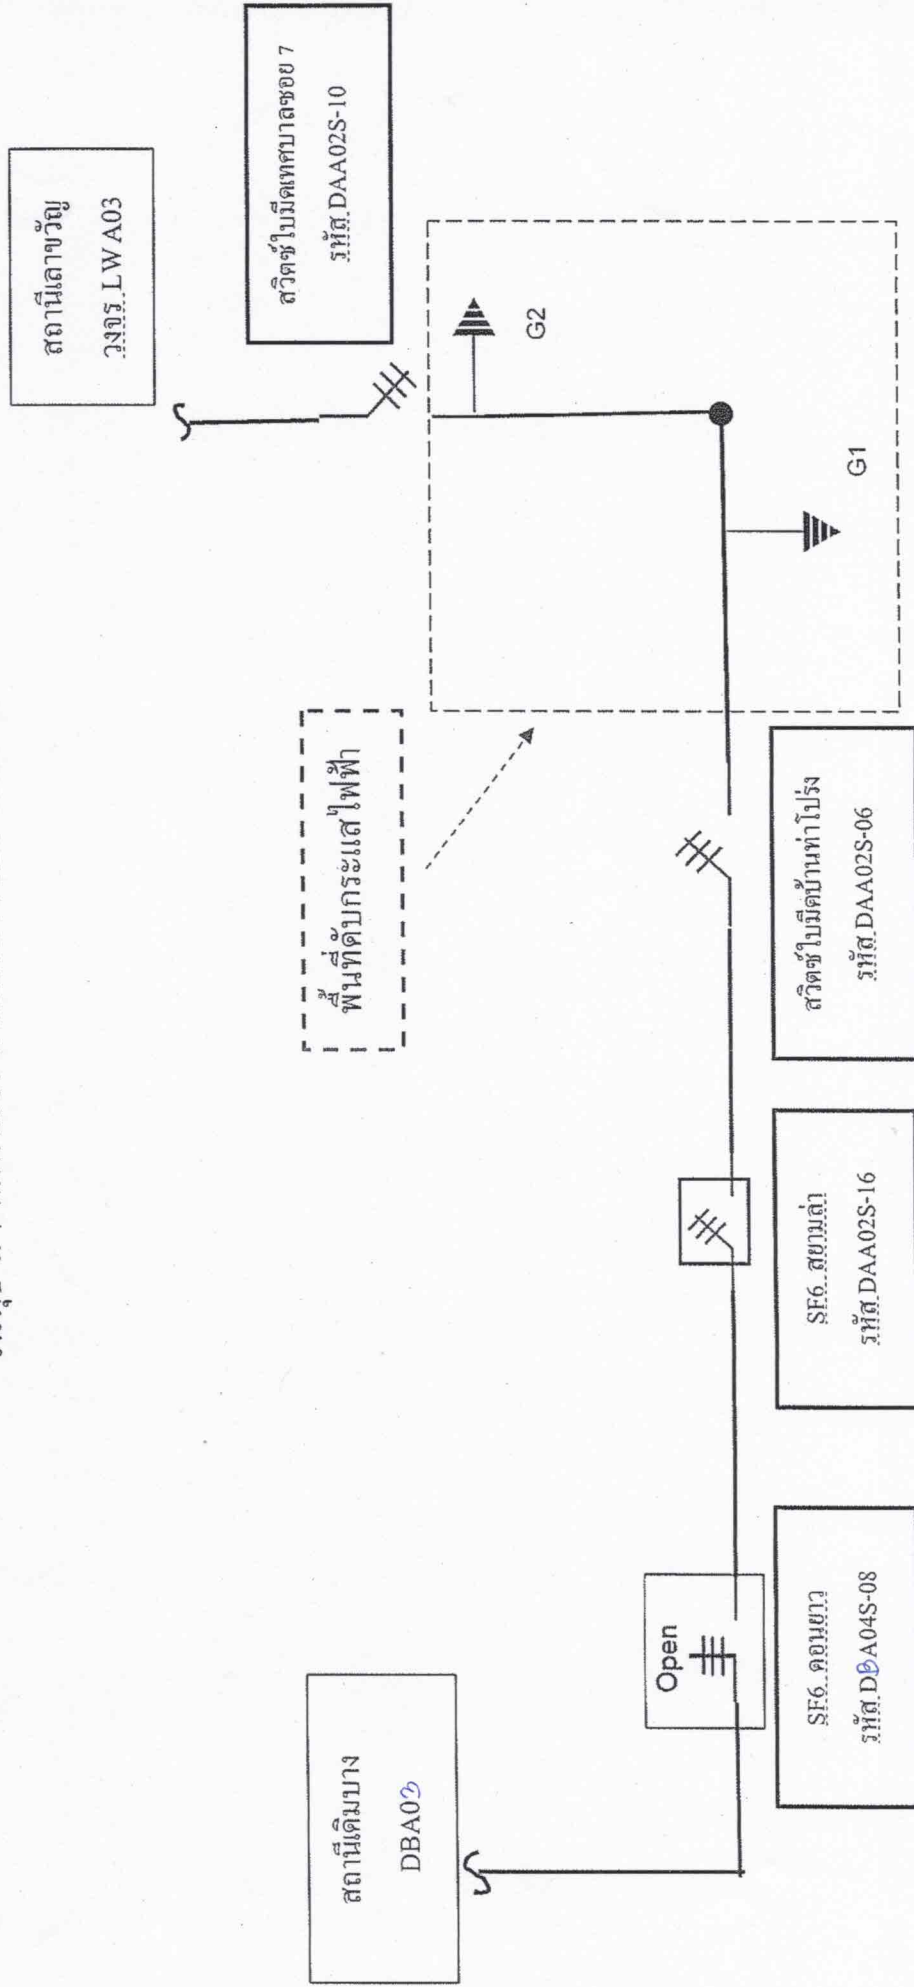

หมายเหตุ หลังการปฏิบัติงาน แล้วเสร็จเวลา ย้ายโหลกลับสภาพเดิม
บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
