



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 พ.ย. 66

เลขที่ ป.๓ /๒๕๖๖ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง บริเวณลานตากข้าวนาเขี้ยวใช้-หนองหม้อแกง ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๕ คจ.	๑๑/๑๑/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	รื้อถอนปักเสาและพาดสาย แรงสูง SAC๑๘๕ ต.มม.	DDE ลานตากข้าว เขี้ยว ✓	Disชั่วคราว หนองหม้อแกง	โทร.๐๘๑-๘๕๖๖๕๗๙ นายวรพล สุทธิไกร
๒.	๘ คจ.	๑๑/๑๑/๖๖	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐		DOA๐๘๕-๐๒	DDE หนองหม้อ แกง	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๒ (สข.) โทร ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำระ ผดส.กรร.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำระ ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำระ
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DOA5 จาก DDE ลานตากข้าวเขี้ยว ถึง Disชั่วคราว หนองหม้อแกง
ในวันที่ 11 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1623/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเดอร์ DOA๖ จาก DOA๐๘๕-๐๒ ถึง DDE หนองหม้อแกง
ในวันที่ 11 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิธวัชร์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป
4 พ.ย. 66

(นายวิธวัชร์ วัฒนวิทย์)
วศก.๕ บกาน ผคฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟจ.สพ

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย


พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ - หนองหม้อแกง (DOA05,08)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 พ.ย. 66	ระหว่าง 08.00 น.	ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย DOA05,08 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1623/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวิรัช เสมามิ่ง		วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	<i>สพ.ก</i>		วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. จีรวัฒน์,นายพิชชา,นายวิรัช,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2 -
4	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
5	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
6	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
7	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
8	DOA05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพ.		R -
9	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP1 -
10	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB -
11	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
12	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
13	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
14	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
15	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP2 ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง DOA-TP1						
16	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานบัส
17	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB INC.02
18	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก DOA08						
19	DOA05S-07	ปลด	สับ		สพ.		DIS แยกบ่อมตำรวจโพร์ท่าทราย
20	DOA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R หนองหม้อแกง
21	sw.load DOA05R-01	สับ	ปลด		สพ.		R หนองหม้อแกง
22	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPA05						
23	DOA08S-06	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
24	DOA05S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอุยยา
25	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB ขนานบัส
26	DIS ชค.DOA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS หนองหม้อแกง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB ขนานบัส
28	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
29	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน ไปจ่ายไฟจาก SPB04						
30	DOA08S-07	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 แยกอู่ยา (ข้ามถนน)
31	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รี่
32	DOA08S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS บ้อมตำรวจแยกศรีสะเกษ
33	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รี่
34	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP2 กลับจากหม้อแปลง DOA-TP1						
35	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง DOA-TP2 พร้อมควบคุมแรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
36	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB INC.02
37	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส
38	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.00 น.						
39	แจ้ง กฟจ.สพ. โหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ ออก						
40	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งโหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ ออกแล้วเสร็จ						
41	แจ้ง กฟจ.สพ. แจ้งโหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง ออก						
42	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งโหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง ออกแล้วเสร็จ						
43	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ตัด DDE วงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
44	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ตัด DDE วงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ แล้วเสร็จ						
45	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอทไลน์ตัด DDE วงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
46	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอทไลน์ตัด DDE วงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง แล้วเสร็จ						
47	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
48	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
49	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
50	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
51	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
52	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe						
53	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP1 -
54	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		TP2 -
55	DOA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB -
56	DOA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB -
57	DOA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB -
58	DOA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DOA		CB -
59	SPB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPB		TP1 -
60	SPB04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPB		CB -
61	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -
62	SP-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		TP -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
63	SPA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
64	SPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPA		CB -
65	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งลงรายละเอียด และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานใน We Safe เสร็จเรียบร้อย						
66	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
67	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2						
70	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G3						
71	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G4						
72	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP1 -
73	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		TP2 -
74	DOA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
75	DOA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
76	DOA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
77	DOA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DOA		CB -
78	SPB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPB		TP1 -
79	SPB04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPB		CB -
80	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
81	SP-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		TP -
82	SPA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
83	SPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPA		CB -
84	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
85	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
86	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร DOA05 บริเวณลานตากข้าวเฮียใช้ แล้วเสร็จ						
87	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง แบบมีไฟ (ตามผังแนบ) ได้						
88	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดฮอตไลน์เชื่อม DDE วงจร DOA08 บริเวณหนองหม้อแกง แล้วเสร็จ						
89	แจ้ง กฟจ.สพ. นำโหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA05,08 เข้ารับไฟปกติ						
90	เมื่อ กฟจ.สพ. แจ้งนำโหลดพื้นที่ปฏิบัติงานวงจร DOA05,08 เข้ารับไฟปกติแล้วเสร็จ						
91	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP2 ไปจ่ายไฟจากหม้อแปลง DOA-TP1						
92	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB ขนานบัส
93	DOA02BVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB INC.02
94	- ย้ายโหลด DOA08 บางส่วน กลับจาก SPB04						
95	DOA04S-08	ปลด	สับ		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รี่
96	DOA08S-02	ปลด	สับ		สพ.		DIS ป้อมตำรวจแยกศรีษะเกษ
97	DOA08S-07	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 แยกอุย้า (ข้ามถนน)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
98	DOA04S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 ตรงข้ามโรงสีเฟอร์รี่
99	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน กลับจาก SPA05						
100	DOA08S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
101	SPABVB-01	ปลด	สับ		SPA		CB ขนानบัส
102	DIS ชค.DOA05	ปลด	สับ		สพ.		DIS หนองหม้อแกง
103	SPABVB-01	สับ	ปลด		SPA		CB ขนานบัส
104	DOA05S-08	สับ	ปลด		สพ.	SCADA	SF6 โรงสีอู๋ยา
105	DOA08S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สพ.		SF6 สถานีฯ วิจัยข้าว
106	- ย้ายโหลด DOA05 บางส่วน กลับจาก DOA08						
107	sw.load DOA05R-01	ปลด	สับ		สพ.		R หนองหม้อแกง
108	DOA05R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		สพ.		R หนองหม้อแกง
109	DOA05S-07	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพ.		DIS แยกบ้อมตำรวจโพธิ์ท่าทราย
110	- ย้ายโหลดหม้อแปลง DOA-TP2 กลับจากหม้อแปลง DOA-TP1						
111	ตรวจสอบแรงดันหม้อแปลง DOA-TP2 พร้อมควบคุมแรงดันอยู่ที่ 22.5 เควี						
112	DOA02BVB-01	ปลด	สับ		DOA		CB INC.02
113	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		CB ขนานบัส



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟจ.สพ.

เลขที่ ก.๓ สพ.(ปบ.)-

เรื่อง ขออนุมัติแผนงานดับกระแสไฟฟ้าในระบบจำหน่าย

เรียน ผจก.กฟจ.สพ./รจก.กฟจ.สพ.

ถึง ผจก.กฟจ.สพ.

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖


ด้วยในวันที่...๑๑...เดือน...พฤศจิกายน...พ.ศ. ...๒๕๖๖... ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐-๑๗.๐๐ น. กฟจ.สุพรรณบุรี มีแผนงานดับไฟฟ้าบริเวณ ... ลานตากข้าวนาเฮียใช้-หนองหม้อแกง ... เพื่อ...เปลี่ยนสายแรงสูง สถานีคอนเจดีย์...โดยมีรายละเอียดที่ติดเตอร์ที่ขอปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

พีดเตอร์ ..๕,๘.. สถานีฯ ...คอนเจดีย์... ตั้งแต่บริเวณ ..ลานตากข้าวนาเฮียใช้-หนองหม้อแกง

กฟจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้นาย ปรีชา ทองระย้า พชง.๖ ผกส.กฟจ.สพ. เบอร์โทรศัพท์ ..๐๙๐-๑๔๓๙๑๑๔..

เป็นผู้ควบคุมงานและให้..นายวรพล สุทธิโกร ..ตำแหน่ง ผ.กส.กฟจ.สพ..เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐..

เป็นผู้ประสานงานการดับไฟเพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จในเวลาที่กำหนด

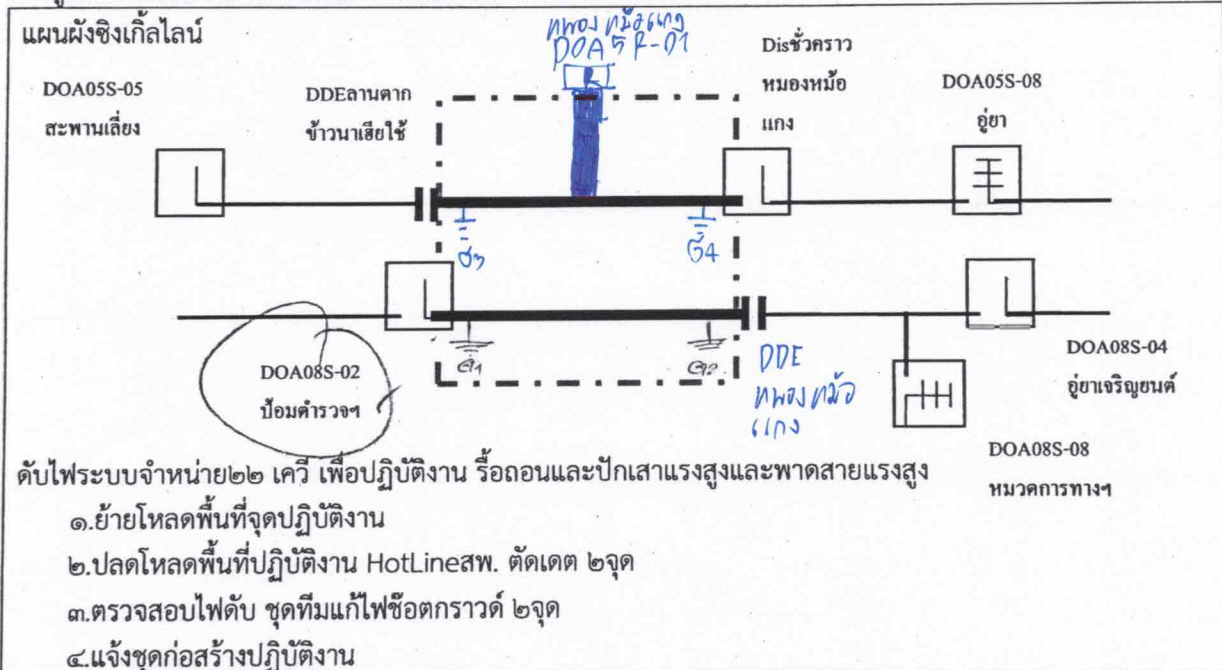

ดับไฟระบบจำหน่าย ๒๒ เควี เพื่อปฏิบัติงาน รื้อถอนและปักเสาแรงสูงและพาดสายแรงสูง

- ๑.ย้ายโหลดพื้นที่จุดปฏิบัติงาน
- ๒.ปลดโหลดพื้นที่ปฏิบัติงาน HotLineสพ. ตัดเดด ๒จุด
- ๓.ตรวจสอบไฟดับ ชุดทีมแก้ไขข้อบกพร่อง ๒จุด
- ๔.แจ้งชุดก่อสร้างปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติให้ต่อไปด้วย

อนุมัติ

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัครเดชา)
รองผู้จัดการปฏิบัติงานแทนผู้จัดการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุพรรณบุรี

(นายธนากร สุวรรณประทีป)
พชง.๖(สข.) ผบ.กฟจ.สพ.

แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
โทร. ๐๓๕-๕๓๕๑๖๗-๘ , ๑๔๘๕๕ , ๑๔๘๖๐
