

เลขที่ ก.3 ดบ.(ปบ) 1064/2566

วันที่ 1 พ.ย. 2566

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ด้วย กฟอ.เดิมบางนางบวช ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้าสถานีเดิมบางนางบวช
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	DBA 01	10 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.	เปลี่ยนโครงสร้าง หัวเสา/ปีกเสา/ ถอนเสา	DBA1S-01	ดิสชั่วคราวหน้าเกียรติชัย คอนกรีต	นายศันรินทร์ แก้วปานกัน 080-9634693
	DBA 05	10 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.		DBA5S-01	ดิสชั่วคราวข้างเกียรติชัย คอนกรีต	
	DBA 06	10 พ.ย.66	08.00 น.	17.00 น.		DBA6S-01	DBA2S-02 ร้านตัดผม ถึง DBA6S-02 โรงกลึงนางบวช	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา ตำแหน่ง ชผ.ปบ โทร 080-847-6904

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

(นายสมบัติ ยศศักดิ์ศรี)

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง รจก.(ท)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.ดบ.

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

DBA01

DBA01S-01

DIS ชั่งถาวรหน้าเกียรติชัยคอนกรีต

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ DBA 04 จาก DBA05S-01 ถึง DBA02S-02 ร้านตัดผม - DBA06S-02

ในวันที่ 10 พ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1627/66 โทรสั่งนางบวช

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภัชชา วงศ์บุญมาก ประสานงานการขอตัดไฟกับ นางวรวิทย์ ศรีศักดิ์ดา

(นายสุภัชชา วงศ์บุญมาก โพรซีเจอร์)
๑๙๙.๔ ๑๓๗๖ ชผ.ดบ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ. ดบ. , กฟส. สธ.

แผนผังแนบ 1 แผ่น

อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

ผจก. (สถานี) -

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม



พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ตั้งแต่วันที่ - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงษ์ แก้วจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้าสถานีเดิมบางนางบวช ถึง หน้าเกียรดิชัยคอนกรีต					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.ดบ.	งานที่ทำ	เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1627/2566	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นางสาวสุภัชชา วงศ์บุญมาก			วันที่	2 พฤศจิกายน 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	2 พฤศจิกายน 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ			(กษ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายพีรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต			(กษ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. นายนครินทร์,น.ส.พิชยา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ			(กษ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบ SF6 DBA02S-02 ร้านตัดผมนางบวช อยู่สถานะ Open+Lock						
3	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
4	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		
5	DBA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 3.1 MW
6	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 4.5 MW
7	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 2.3 MW
8	DBA05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 4.9 MW
9	DBA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA		Load = 1.2 MW
10	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
11	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		Load = 2 MW
12	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		น.3		
13	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		น.3		
14	DAB01R-02	Normal	Nonreclosing,GND		ดบ.		
15	ย้าย DBA04 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA03						
16	DBA04S-12	ปลด	สับ		สช.		DIS สะพานดำ
17	DBA04S-05	สับ	ปลด		สช.	Scada	SF6 สะพานขาว
18	ย้าย DBA05,06 บางส่วนไปรับไฟจาก HKA06						
19	DBA05S-07	ปลด	สับ		ดบ.	Scada	SF6 แหลมช้อย
20	DBA05S-06	สับ	ปลด		ดบ.	Scada	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
21	DBA05S-08	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
22	DBA05S-05	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสี CP
23	ย้าย DBA05,06 บางส่วนไปรับไฟจาก DBA04						
24	DBA04S-02	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
25	DBA05VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB DBA05
26	DBA05S-04	ปลด	สับ		ดบ.	Scada	SF6 ข้างขนส่ง

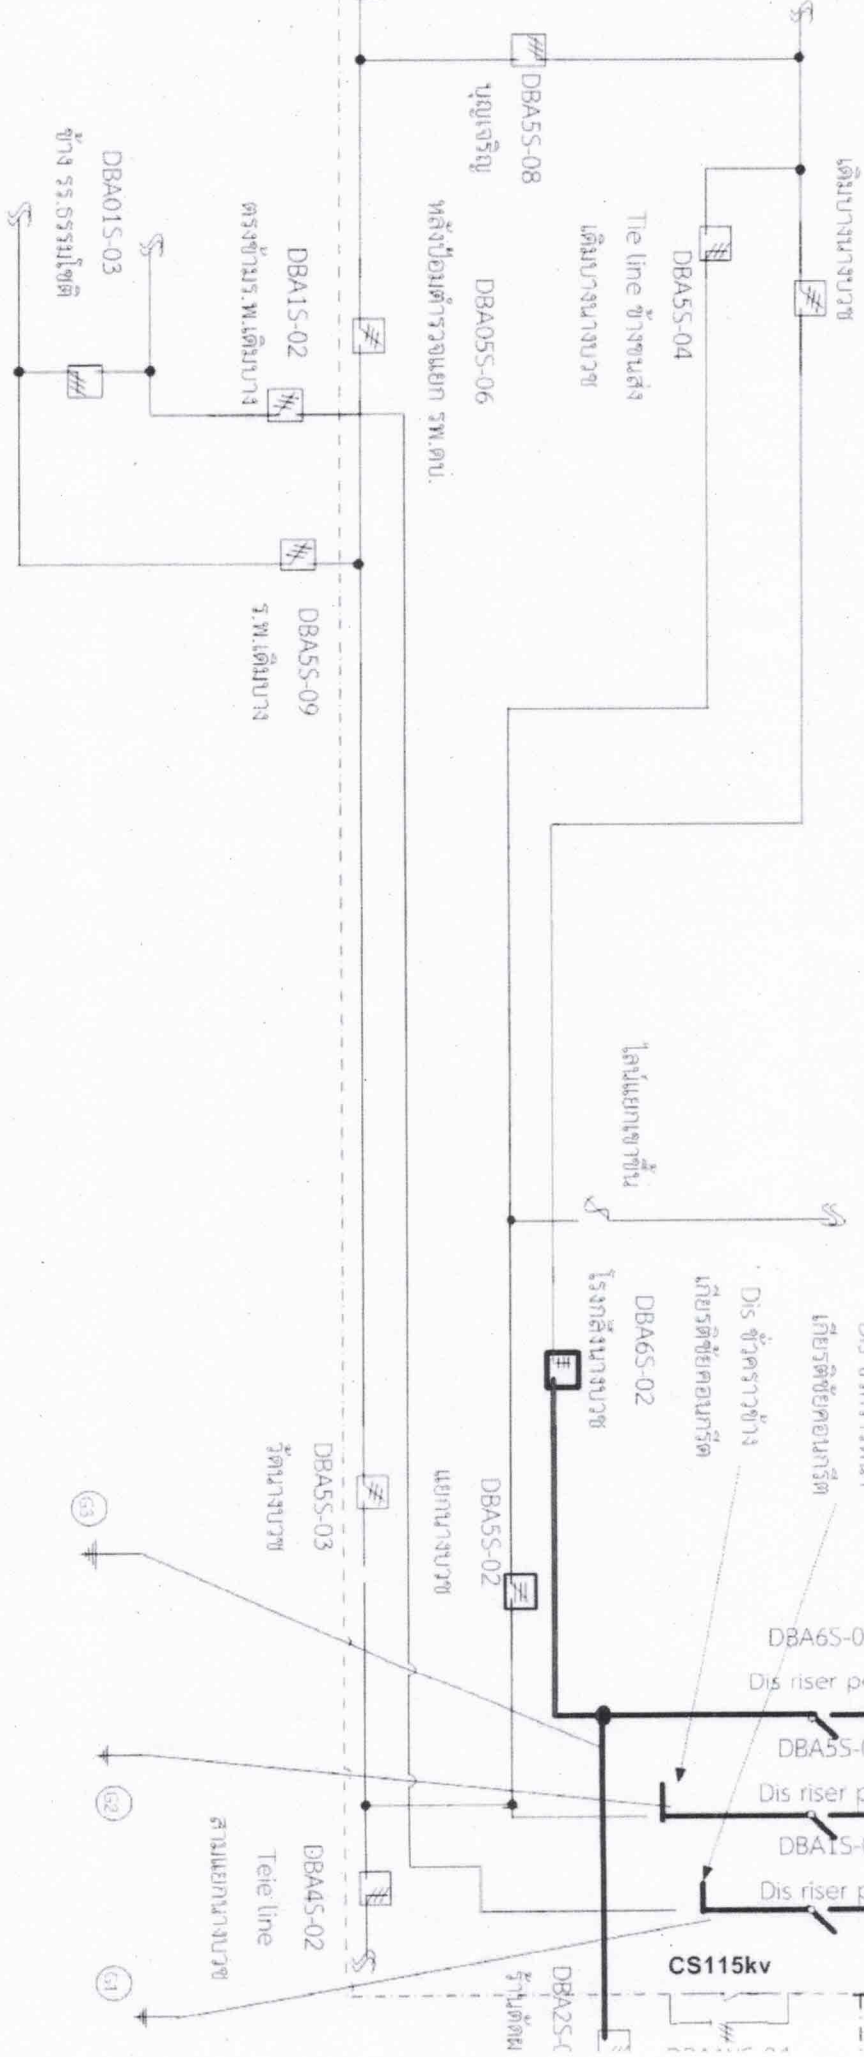
ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	DBA06VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA06
28	ย้าย DBA01 ไปรับไฟจาก DAA04							
29	sw.bypass DBA01R-02	ปลด	สับ		ดบ.		R	ปากทางบ้านหัวเขา
30	DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R	ปากทางบ้านหัวเขา
31	DBA01S-08	ปลด	สับ		ดบ.	Scada	SF6	ตรงข้ามคริสตจักร
32	DBA01VB-01	สับ	ปลด		DBA		CB	DBA01
33	- เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.00 น.							
34	DBA06S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6	โรงกลึงนางบวช
35	DIS ชค. DBA01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	หน้าร้านเกียรติชัยคอนกรีต
36	DIS ชค. DBA05	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดบ.		DIS	ข้างร้านเกียรติชัยคอนกรีต
37	DBA01S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.1
38	DBA05S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.5
39	DBA06S-01	สับ	ปลด		ดบ.		DIS	POT HEAD F.6
40	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้รับทราบ							
41	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G1							
42	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G2							
43	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G3							
44	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G4							
45	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G5							
46	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Shortground จุด G6							
47	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน							
48	แจ้งผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานได้							
49	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
50	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT			
51	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
52	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA			
53	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
54	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA			
55	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		น.3			
56	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		น.3			
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
57	เมื่อผู้ควบคุมงาน แจ้งทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ							
58	DBN-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
59	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT			
60	DBA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			
61	DBA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DBA			

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
62	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
63	DAA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DAA		
64	HKA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		น.3		
65	HKA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		น.3		
66	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G1						
67	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G2						
68	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G3						
69	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G4						
70	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G5						
71	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลด Shortground จุด G6						
72	- จ่ายไฟ						
73	DBA06S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงกลึงนางบวช
74	DIS ชค. DBA01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS หน้าร้านเกียรติชัยคอนกรีต
75	DIS ชค. DBA05	ปลด	สับ		ดบ.		DIS ช่างร้านเกียรติชัยคอนกรีต
76	DBA01S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.1
77	DBA05S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.5
78	DBA06S-01	ปลด	สับ		ดบ.		DIS POT HEAD F.6
79	ย้าย DBA01 กลับจาก DAA04						
80	DBA01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB DBA01
81	DBA01R-02	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
82	sw.bypass DBA01R-02	สับ	ปลด		ดบ.		R ปากทางบ้านหัวเขา
83	DBA01S-08	สับ	ปลด		ดบ.	Scada	SF6 ตรงข้ามคริสตจักร
84	ย้าย DBA05,06 บางส่วนกลับจาก DBA04						
85	DBA06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB DBA06
86	DBA05S-04	สับ	ปลด		ดบ.	Scada	SF6 ช่างขนส่ง
87	DBA05VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		DBA		CB DBA05
88	DBA04S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 แยกนางบวช
89	ย้าย DBA05,06 บางส่วนกลับจาก HKA06						
90	DBA05S-06	ปลด	สับ		ดบ.	Scada	SF6 หลังป้อมตำรวจเขาพระ
91	DBA05S-07	สับ	ปลด		ดบ.	Scada	SF6 แหลมข่อย
92	DBA05S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ดบ.		SF6 โรงสี CP
93	DBA05S-08	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดบ.		SF6 โรงสีบุญเจริญ
94	ย้าย DBA04 บางส่วนกลับจาก DBA03						
95	DBA04S-05	ปลด	สับ		สช.	Scada	SF6 สะพานขาว
96	DBA04S-12	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS สะพานดำ
97	DBN-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		
98	DBN-KT2A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
99	DBA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
100	DBA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
101	DBA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
102	DBA05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
103	DBA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DBA		
104	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
105	DAA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DAA		
106	HKA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		น.3		
107	HKA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		น.3		
108	DAB01R-02	Nonreclosing,GND	Normal		ตบ.		
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



DBA6S-03 หน้าสถานีขนส่ง
เดิมบางนางบวช
DBA06 ปริมาณ DBA06S-01 ถึง SF6 DBA02S-02 รั้วตัดผม ถึง SF6 DBA06S-02 โรงกลิ้งนางบวช
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08:00 - 17:00 น.



1. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายหน้า สฟฟ.ตบ.
หมายเลข บริเวณที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน

สถานะ การจ่ายไฟขณะปฏิบัติงาน
