



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 8 ธ.ค. 64

เลขที่ ก.๓ กทบ.(ปบ.)- ๒๗๕๔/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายอรุณ จรตล

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

ด้วยการไฟฟ้ากฟอ.กทบจะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน...ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี...ตามแผนผังสังเขป  
แบบ จำนวน =๒= แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วันเดือนปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๐๖ SAA	๑๒ ธ.ค. ๖๔	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	เพื่อให้ ผจก.กทบ. ปรับปรุงระบบ จำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ๒๒ เควี	DIS ชั่วคราวหน้า ศาลพระพิฆเนศ	ปลายสายแรงสูง	นายเดวิด วีโรพรสวรรค์ พชง.๗ ผจก.กทบ. โทร. ๐๘๖-๓๕๖๖๑๔๑

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบจากการตัดไฟปฏิบัติงานจำนวน ๔๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมชาย มาบัณฑิตย์ ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟอ.กทบ. โทร ๐๘๒-๐๐๕๔๕๔๓

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง  ๑.๑  มีโอกาสชำรุด  ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอรุณ จรตล)

ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.กทบ.

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ SAA๐๖ จาก DIS ชั่วคราวหน้า ศาลพระพิฆเนศ ถึง ปลายสายระบบจำหน่าย  
ในวันที่ 12 ธ.ค. 64 ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง 17:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1628/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาง กศ.ศรีเพชร ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ.สมชาย มาบัณฑิตย์

(นายเดวิด วีโรพรสวรรค์ สิงห์โททอง)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น  
แผนผังแนบ 2 แผ่น

เรียน ผจก. กฟอ.กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รจก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ชอยสามมิตรมอเตอร์ (SAA06)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ธ.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.กทบ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 kV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1628/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพชร			วันที่	8 ธันวาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 ธันวาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายพนิต, นายมโนช				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)


ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	- ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	Load 3.02 MW
3	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
4	Dis ชค. SAA06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กทบ.	DIS	Dis ชค. หน้าศาลพระพิฆเนศ
5	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
6	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
7	แจ้ง กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
8	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	
9	หลังจาก กฟอ.กทบ. Test ไฟพร้อม Short ground ทุกจุด พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
10	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
11	เมื่อ กฟอ.กทบ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
12	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปลด Short ground จุด G1						
13	แจ้ง กฟอ.กทบ. ปลด Short ground จุด G2 และยืนยันการลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA	-	
15	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ เวลา 17.00 น.						
16	Dis ชค. SAA06	ปลด	สับ		กทบ.	DIS	Dis ชค. หน้าศาลพระพิฆเนศ
17	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA	-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แผนผังสถานะเบื้องต้น บริเวณของบริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด ( ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าสามพราน ๑ )

เพื่อให้ ผศ.กทบ. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในของบริษัท สามมิตรมอเตอร์ จำกัด

( ตามอนุมัติ กทบ.(ปบ).- ๑๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน 2562 ) WBS:F-63-F-KTN64.MS.2003

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

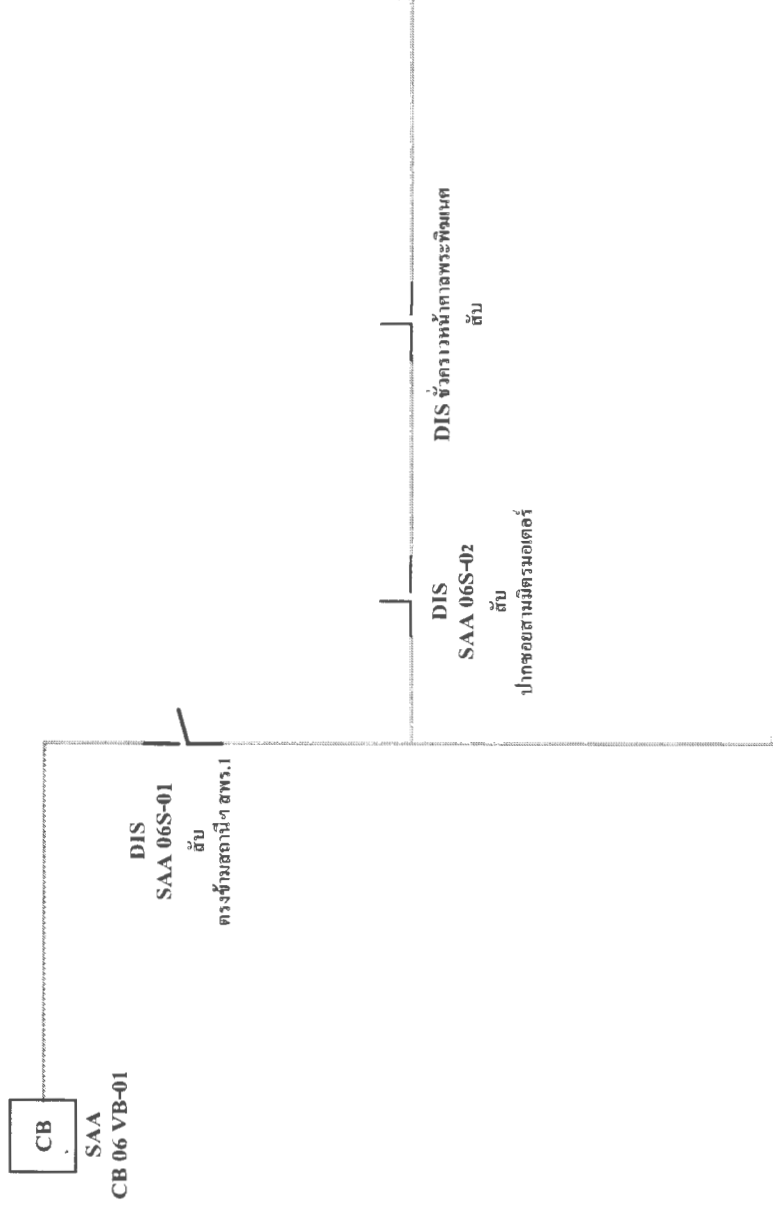

หม่อมราชวงศ์

มีผู้ไฟฟ้าได้แสดงภาพจำนวน ๔๐ ราย

๗

E.06 SAA

แผนผังสถานะปัจจุบัน มีดังนี้ ๒ บริเวณของบริษัค ตามมีตามอาคาร จำกัด ( ตรงข้ามสถานีไฟฟ้าสามพราน ๕ )

เพื่อที่ ผอช.ภทท. ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงภายในของบริษัท สามมีตรมอเตอร์ จำกัด

( ตามอนุมติ กทท.(ปบ.) - ๑๒๒ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ) WBS:I-63+KTT64.MS.2003

ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น.

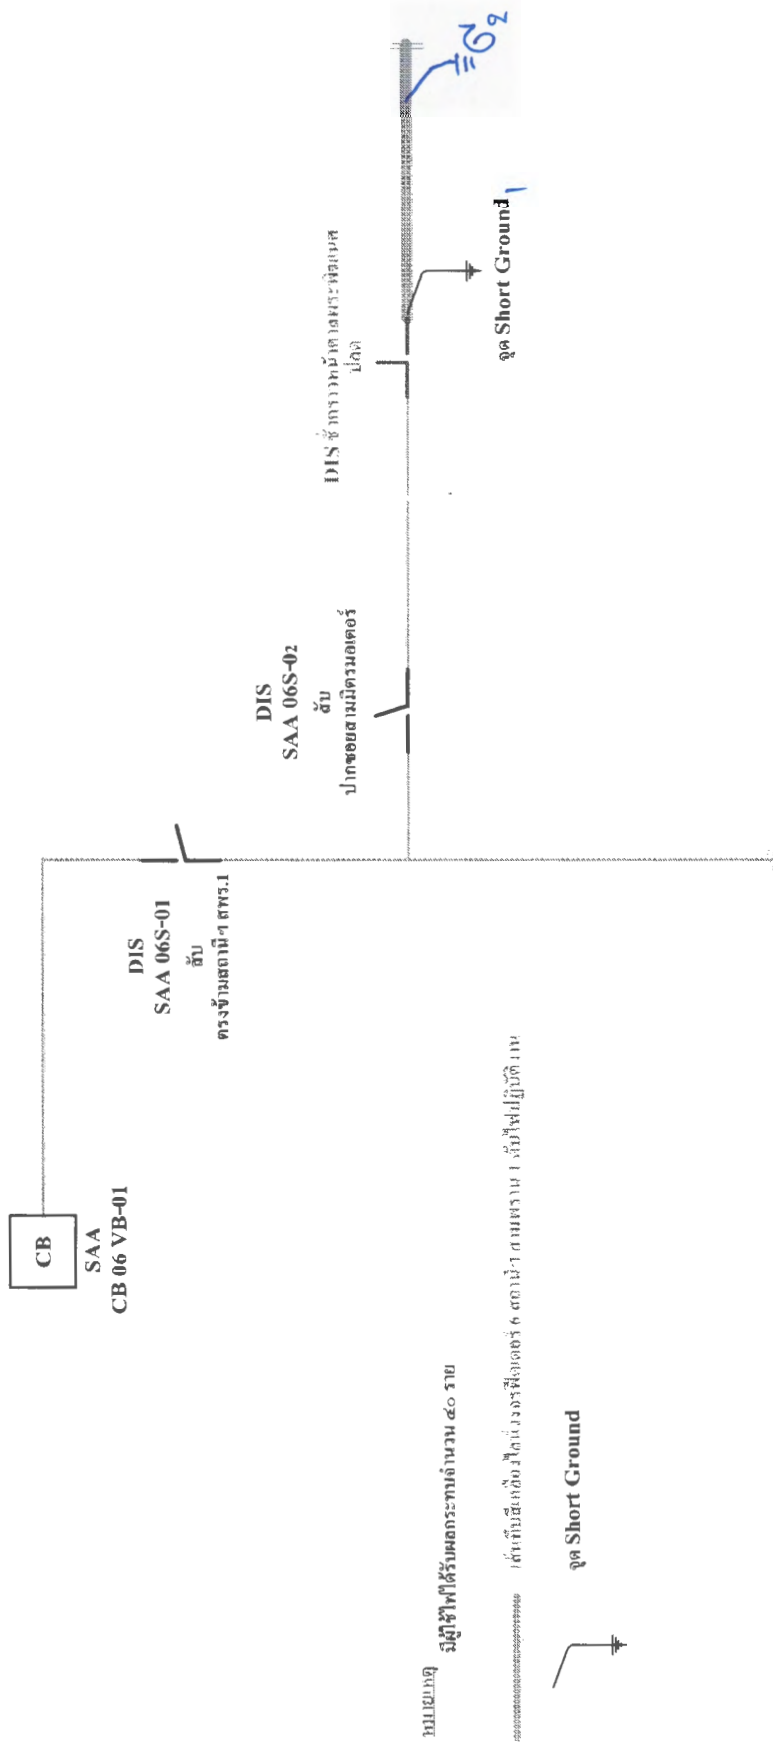


Fig. SAA
