



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PUBLIC ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ต.คป.บ.(กป.)- ๑๑๕๖ /๒๕๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชัย

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายไกรสร พวงหอม

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

ด้วย กฟส.อ.ศรีประจันต์ จะขอตัดไฟเพื่อแก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณบ้านมดแดง ตามแผนผังสิ่งเซปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SPC๐๓	๑๐ พ.ย.๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณบ้านมดแดง	จุดตัด DDE (F๓) บริเวณบ้าน มดแดง	DIS บ้านมดแดง SPC๓S-๑๕	นายจิระยุทธ ออาจศิริ โทร.๐๘๗-๑๕๗-๗๘๐๕
๒.	SPC๐๔	๑๐ พ.ย.๒๕๖๖	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุด บริเวณบ้านมดแดง	จุดตัด DDE (F๔) บ้านมดแดง	DIS บ้านมดแดง SPC๔S-๐๙	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนัช เขียวชาญ ตำแหน่ง พ.ช.๖ ผ.ก.กฟส.อ.ศรีประจันต์ โทร. ๐๖๔-๘๗๘-๘๕๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายไกรสร พวงหอม)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ศรีประจันต์

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SPC๐3 จาก DDE บ้านมดแดง ถึง SPC35-15
ในวันที่ 10 พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1641/66อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 พิดเตอร์ SPC๐4 จาก DDE บ้านมดแดง ถึง SPC 45-09
ในวันที่ 10 พ.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนัช เขียวชาญ

(นายพัทธนันท์ พธิราชสุวรรณชัย)
๐๗๓.๔ 11๓๖ นพ.ค.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟส.ศ.ป.จ.

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง _____ แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี _____)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา _____ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง



1. สถานที่ทำงาน	บ้านมดแดง (SPC03,04)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 พ.ย. 66	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	10 พ.ย. 66 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ศปจ.	งานที่ทำ	แก้ไขสายแรงสูงอาร์คซาร์ด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1641/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธุ์			วันที่	4 พฤศจิกายน 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	4 พฤศจิกายน 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโฆ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพิรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
		1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง					
2	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPC		-
3	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
4	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
5	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
6	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
7	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPA		-
8	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT			สพ.		R โรงแรมการกีฬา
9	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA05							
10	SPA04S-07	ปลด	สับ			ศปจ.		SF6 สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
11	SPA05S-06	ปลด	สับ			ศปจ.		SF6 แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
12	SPC03S-15	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
13	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPA04							
14	SPC04S-06	ปลด	สับ			ศปจ.		SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
15	SPC04S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
16	SPC04S-06	สับ	ปลด			ศปจ.		SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
17	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วน ไปรับไฟจาก SPC02							
18	SPC04S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)			ศปจ.		DIS บ่อมตำรวจบ้านมดแดง
19	D/O SPC02//SPC04	ปลด	สับ			ศปจ.		D/O ว่างปลั๊กได้
20	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.							
21	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC03) ออกทั้ง 3 เฟส							
22	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC03) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
23	แจ้งชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC04) ออกทั้ง 3 เฟส							
24	เมื่อชุด Hotline ทำการตัด DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC04) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
25	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ศปจ. รับทราบ							
26	แจ้ง กฟส.ศปจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1							
27	แจ้ง กฟส.ศปจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
		ปกติก่อน	ดำเนินการ					
28	แจ้ง กฟส.ศปจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3							
29	แจ้ง กฟส.ศปจ. Test ไฟพร้อม Short ground จุด G4							
30	แจ้งให้ กฟส.ศปจ. ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย							
31	แจ้ง กฟส.ศปจ. ปฏิบัติงานได้ทุกชุด							
32	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			SPC		-
33	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
34	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
35	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
36	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-
37	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPA		-
38	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT			สพ.		R โรงแรมการกีฬา
39	****สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า****							
40	เมื่อ กฟส.ศปจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว พร้อมจ่ายไฟ							
41	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			SPC		-
42	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
43	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
44	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-
45	SP-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual			EGAT		-
46	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPA		- L = 6.46 MW.
47	SPA05R-02	Normal	Nonreclosing, ALT			สพ.		R โรงแรมการกีฬา
48	แจ้ง กฟส.ศปจ. ทำการปลด Short ground จุด G1							
49	แจ้ง กฟส.ศปจ. ทำการปลด Short ground จุด G2							
50	แจ้ง กฟส.ศปจ. ทำการปลด Short ground จุด G3							
51	แจ้ง กฟส.ศปจ. ทำการปลด Short ground จุด G4							
52	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
53	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC03) เข้าทั้ง 3 เฟส							
54	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC03) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
55	แจ้งชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC04) เข้าทั้ง 3 เฟส							
56	เมื่อชุด Hotline ทำการเชื่อม DDE บริเวณบ้านมดแดง (SPC04) เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
57	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วน คีนจาก SPC02							
58	D/O SPC02//SPC04	สับ	ปลด			ศปจ.		D/O ว่างกลับได้
59	SPC04S-08	ปลด	สับ			ศปจ.		ป้อมตำรวจบ้านมดแดง
60	ย้ายโหลด SPC04 บางส่วน คีนจาก SPA04							
61	SPC04S-06	ปลด	สับ			ศปจ.		SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
62	SPC04S-09	ปลด	สับ			ศปจ.		DIS บ้านมดแดง
63	SPC04S-06	สับ	ปลด			ศปจ.		SF6 ตรงข้ามเมธิประมุข
64	ย้ายโหลด SPC03 บางส่วน คีนจาก SPA05							
65	SPC03S-15	ปลด	สับ			ศปจ.		DIS บ้านมดแดง

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์		ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
		ปกติก่อน	ดำเนินการ						
66	SPA05S-06	สับ	ปลด			ศปจ.		SF6	แยกไฟแดงโพธิ์พระยา
67	SPA04S-07	สับ	ปลด			ศปจ.		SF6	สวนหย่อมแยกโพธิ์พระยา
68	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			SPC		-	
69	SPC02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-	
70	SPC03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-	
71	SPC04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPC		-	
72	SP-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto			EGAT		-	
73	SPA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose			SPA		-	
74	SPA05R-02	Nonreclosing, ALT	Normal			สพ.		R	โรงแรมการกีฬา
75	***สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด***								

แผนงานดับไฟ แก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุดในไลน์ F3,F4 ศรีประจันต์ บ้านมดแดง

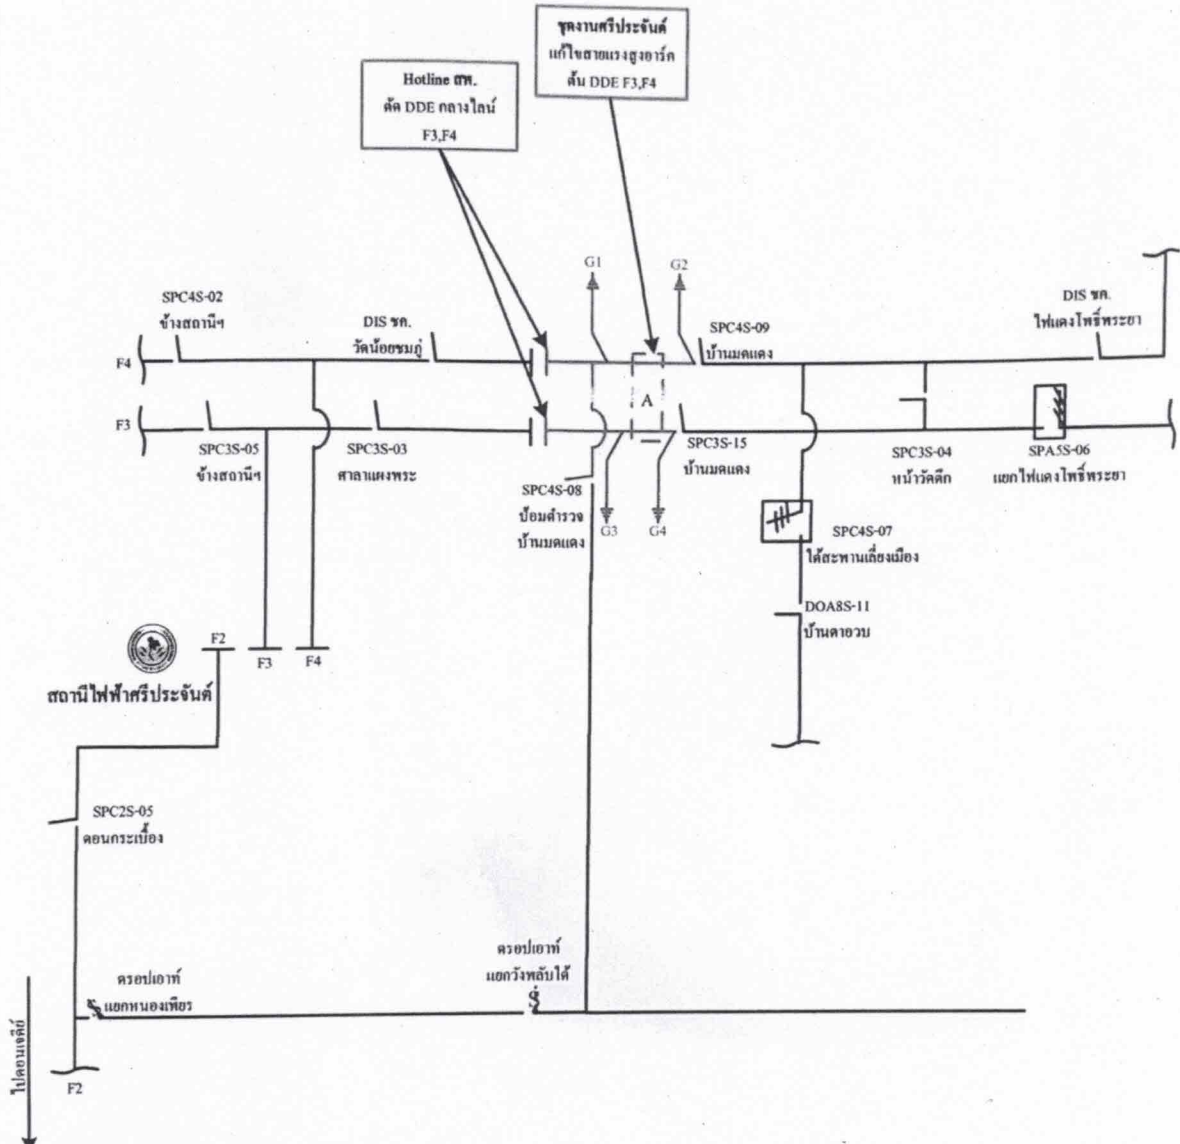

หมายเหตุ

ดับไฟแก้ไขสายแรงสูงอาร์คชำรุดในไลน์ F3,F4 ศรีประจันต์ จุด A

1. วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
2. จุดแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องดำเนินการย้ายโหลดไลน์ F3,F4 ศรีประจันต์ 08.00 น.
2. Hotline สฟ. เข้าดำเนินการตัด DDE กลางไลน์ เวลา 09.00 น.
3. ดับไฟจาก จุดตัด DDE กลางไลน์ F3 - DIS SPC 3S-15 บ้านมดแดง
4. ดับไฟจาก จุดตัด DDE กลางไลน์ F4 - DIS SPC4S-09 บ้านมดแดง - DIS SPC4S-08 บ้อมตำรวจบ้านมดแดง
- 4.1 หลังจากปลด DIS SPC4S-08 บ้อมตำรวจมดแดง จะขอส่งครอปเอาต์แยกวงพลังได้
